مشروع تطوير المرحلة الأولى الجزء الثاني بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام

Development of Phase One – Part Two, Third Industrial City in Dammam

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	مفرح الحربي وشركاه	إيجيس (EGIS)	إيهاب محمد عطية	19-May-2025	18-May-2027

النطاق: الطرق الشريانية والمحلية، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف السيول والري والإنارة والاتصالات، ومحطات ضخ الصرف الصحي وبرك تجميع مياه الأمطار للمرحلة الأولى الجزء الثاني بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام.

ملخص تقدم المشروع

تقاس نسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 77.4% مقابل 96.5% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 19.1%، ولم يتقدم هذا الأسبوع إلا بنسبة 0.07% مقابل 0.34% مخطط.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
77.4% / 96.5% مخطط	+0.07% / +0.34% مخطط	72.2% · اليوم 527 من 730	15.9% · 37.3 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.80 · −19.1%	▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.27%	▼ انتهاء P6: 12-يونيو-2027	12 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 15-يوليو-2026

المشروع متأخر بنسبة 19.1% عن الخطة، والوتيرة الحالية لا تكفي لتعويض التأخير.

يتبقى 22.6% من الأعمال مع 29 أسبوعاً كاملاً حتى تاريخ الانتهاء التعاقدي 18-مايو-2027، وهو ما يتطلب نحو 0.78% أسبوعياً، بينما تحقق هذا الأسبوع 0.07% فقط. ينهي تحديث البرنامج الزمني P6 (تاريخ البيانات 24-أكتوبر-2026) المشروع في 12-يونيو-2027، أي متأخراً 25 يوماً بفائض سالب قدره −24 يوماً، بينما لا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع 18-مايو-2027. أضعف المناطق شبكات المنطقة 3 (66.7% مقابل 98.1% مخطط)، وشبكات الصرف الصحي في المنطقتين 1 و3، وعبارات قطع الطرق.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور مرفوعة مع تقرير هذا الأسبوع، مؤرخة من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. تركزت أعمال الأسبوع على مواسير ومحابس مياه الشرب والري وصنبور إطفاء الحريق وخنادق الاتصالات ومحطات الضخ. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



حفر الخنادق

حفار يفتح خندقاً للشبكات. مؤرخة 19-أكتوبر-2026، 06:36، 25.92121° شمالاً 49.96035° شرقاً.



لحام مواسير HDPE

لحام تناكبي لخط HDPE داخل الخندق. مؤرخة 20-أكتوبر-2026، 14:17.



وصل المواسير

فريق يصل مواسير HDPE وملحقاتها داخل خندق مفتوح.



تركيب المحابس

تركيب محبس بوابي على الخط والتحقق من استوائه. مؤرخة 21-أكتوبر-2026، 08:12.



تركيب صنبور إطفاء الحريق

صنبور إطفاء حريق مركّب في حفرته. مؤرخة 21-أكتوبر-2026، 08:39.




تمديدات محطة الضخ

تركيب المواسير والمحابس في إحدى محطات الضخ. مؤرخة 20-أكتوبر-2026، 15:06.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، وفعلي أكتوبر من التقرير الأسبوعي.

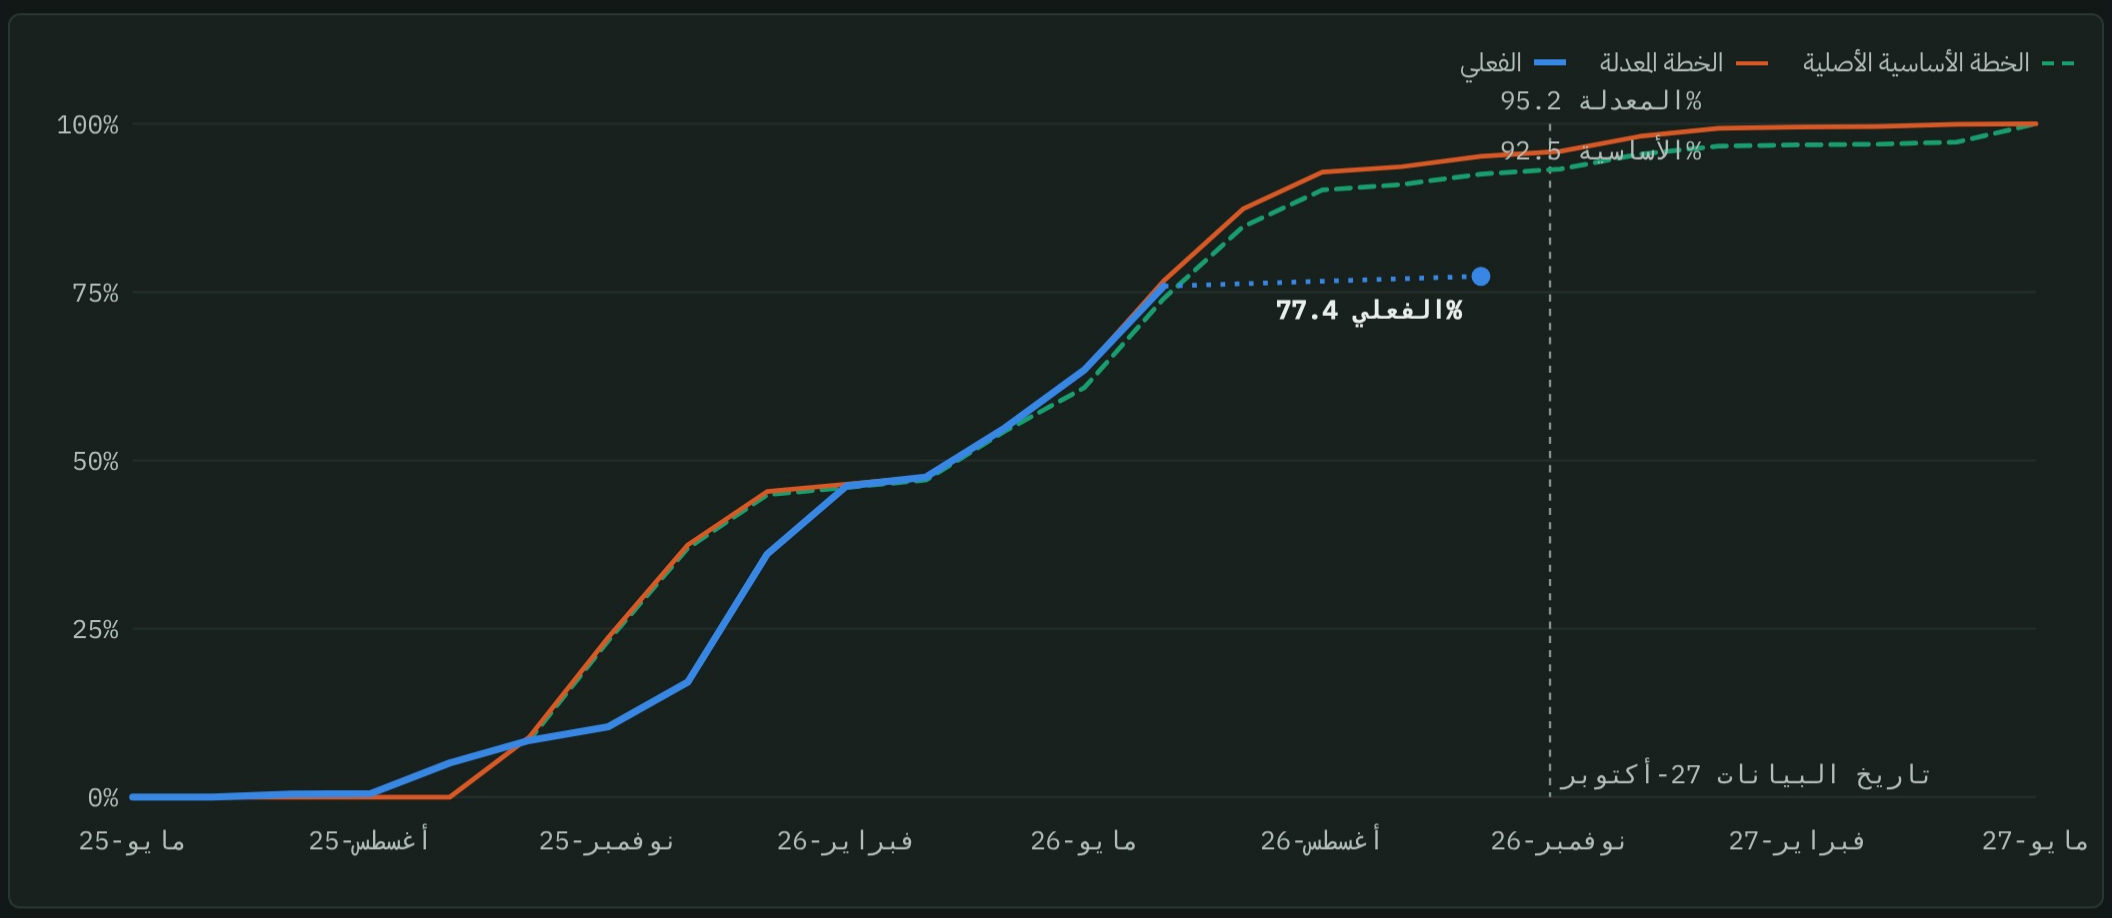

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
27-Oct-2026	**96.5**	**77.4**	**-19.1%**	**+0.07%**	**0.80**

لم يُرفع سوى تقرير هذا الأسبوع، لذا لا يمكن عرض الأسابيع السابقة. تسجل ورقة المنحنى القيم الفعلية الشهرية حتى يونيو 2026 فقط (75.9%)، ويصل الخط المنقط بينها وبين نسبة هذا الأسبوع 77.4%. النسبة المخططة في التقرير الأسبوعي 96.5% أعلى من الخطة الأساسية (92.5%) ومن الخطة المعدلة (95.2%) لشهر أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب المنطقة والشبكة، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات ساعات عمل، فلا يوجد لها قياس فعلي.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
المنطقة 1	42.1%	**95.8%**	**81.7%**	**-14.1%**	**0.85**	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	7.0%	91.5%	58.0%	-33.5%	0.63	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	4.4%	100.0%	81.4%	-18.6%	0.81	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	3.1%	100.0%	94.7%	-5.3%	0.95	▼ متأخر
شبكة الري	2.1%	100.0%	96.7%	-3.3%	0.97	▲ في المسار
برك تجميع مياه الأمطار	24.3%	96.2%	89.9%	-6.3%	0.93	▼ متأخر
عبارات قطع الطرق	1.3%	78.9%	0.0%	-78.9%	0.00	▼ لم يبدأ
المنطقة 2	20.0%	**99.8%**	**83.7%**	**-16.1%**	**0.84**	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	3.9%	100.0%	81.4%	-18.6%	0.81	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	4.4%	100.0%	77.6%	-22.4%	0.78	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	0.8%	100.0%	87.7%	-12.3%	0.88	▼ متأخر
شبكة الري	2.7%	100.0%	96.3%	-3.7%	0.96	▲ في المسار
برك تجميع مياه الأمطار	6.9%	99.4%	98.9%	-0.4%	1.00	▲ في المسار
عبارات قطع الطرق	1.3%	100.0%	0.0%	-100.0%	0.00	▼ لم يبدأ

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
المنطقة 3	31.5%	**98.1%**	**66.7%**	**-31.4%**	**0.68**	▼ متأخر
شبكة الصرف الصحي	7.6%	93.0%	49.2%	-43.8%	0.53	▼ متأخر
شبكة تصريف السيول	5.3%	100.0%	70.4%	-29.6%	0.70	▼ متأخر
شبكة مياه الشرب	6.1%	100.0%	45.0%	-55.0%	0.45	▼ متأخر
شبكة الري	0.8%	100.0%	90.1%	-9.9%	0.90	▼ متأخر
برك تجميع مياه الأمطار	11.0%	99.4%	89.3%	-10.1%	0.90	▼ متأخر
عبارات قطع الطرق	0.6%	100.0%	31.8%	-68.2%	0.32	▼ متأخر
أعمال عامة	6.4%	**61.8%**	**57.6%**	**-4.1%**	**0.93**	▼ متأخر
الطرق المحلية *	0.4%	6.9%	33.1%	+26.3%	4.83	▲ متقدم
الطرق الشريانية *	0.4%	100.0%	12.0%	-88.0%	0.12	▼ متأخر
الاتصالات *	3.8%	82.1%	92.9%	+10.8%	1.13	▲ متقدم
تنسيق المواقع	1.9%	24.5%	0.0%	-24.5%	0.00	▼ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**96.5%**	**77.4%**	**-19.1%**	**0.80**	▼ متأخر

المخطط والفعلي من ورقة Weekly Progress Report. * تستخدم المنطقة 3 والطرق المحلية والطرق الشريانية والاتصالات ساعات العمل الفعلية التراكمية من مستخرج P6 في ورقة Progress، لأن صفوف الملخص الخاصة بها غير متسقة (انظر ملاحظات على البيانات). يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 24-أكتوبر-2026) 136 نشاطاً: 11 مكتملاً و68 قيد التنفيذ و57 لم تبدأ.

نطاق العمل: الكميات

الكميات ضمن نطاق مجموعة الحربي (MG) من العرض الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026: مواسير الشبكات من شريحة كميات الشبكات، والمناهل والمحابس وصنبور إطفاء الحريق والإنارة من شريحة نطاق التقدم. لا يمكن حساب عمود "هذا الأسبوع" لعدم رفع أي أسبوع سابق.

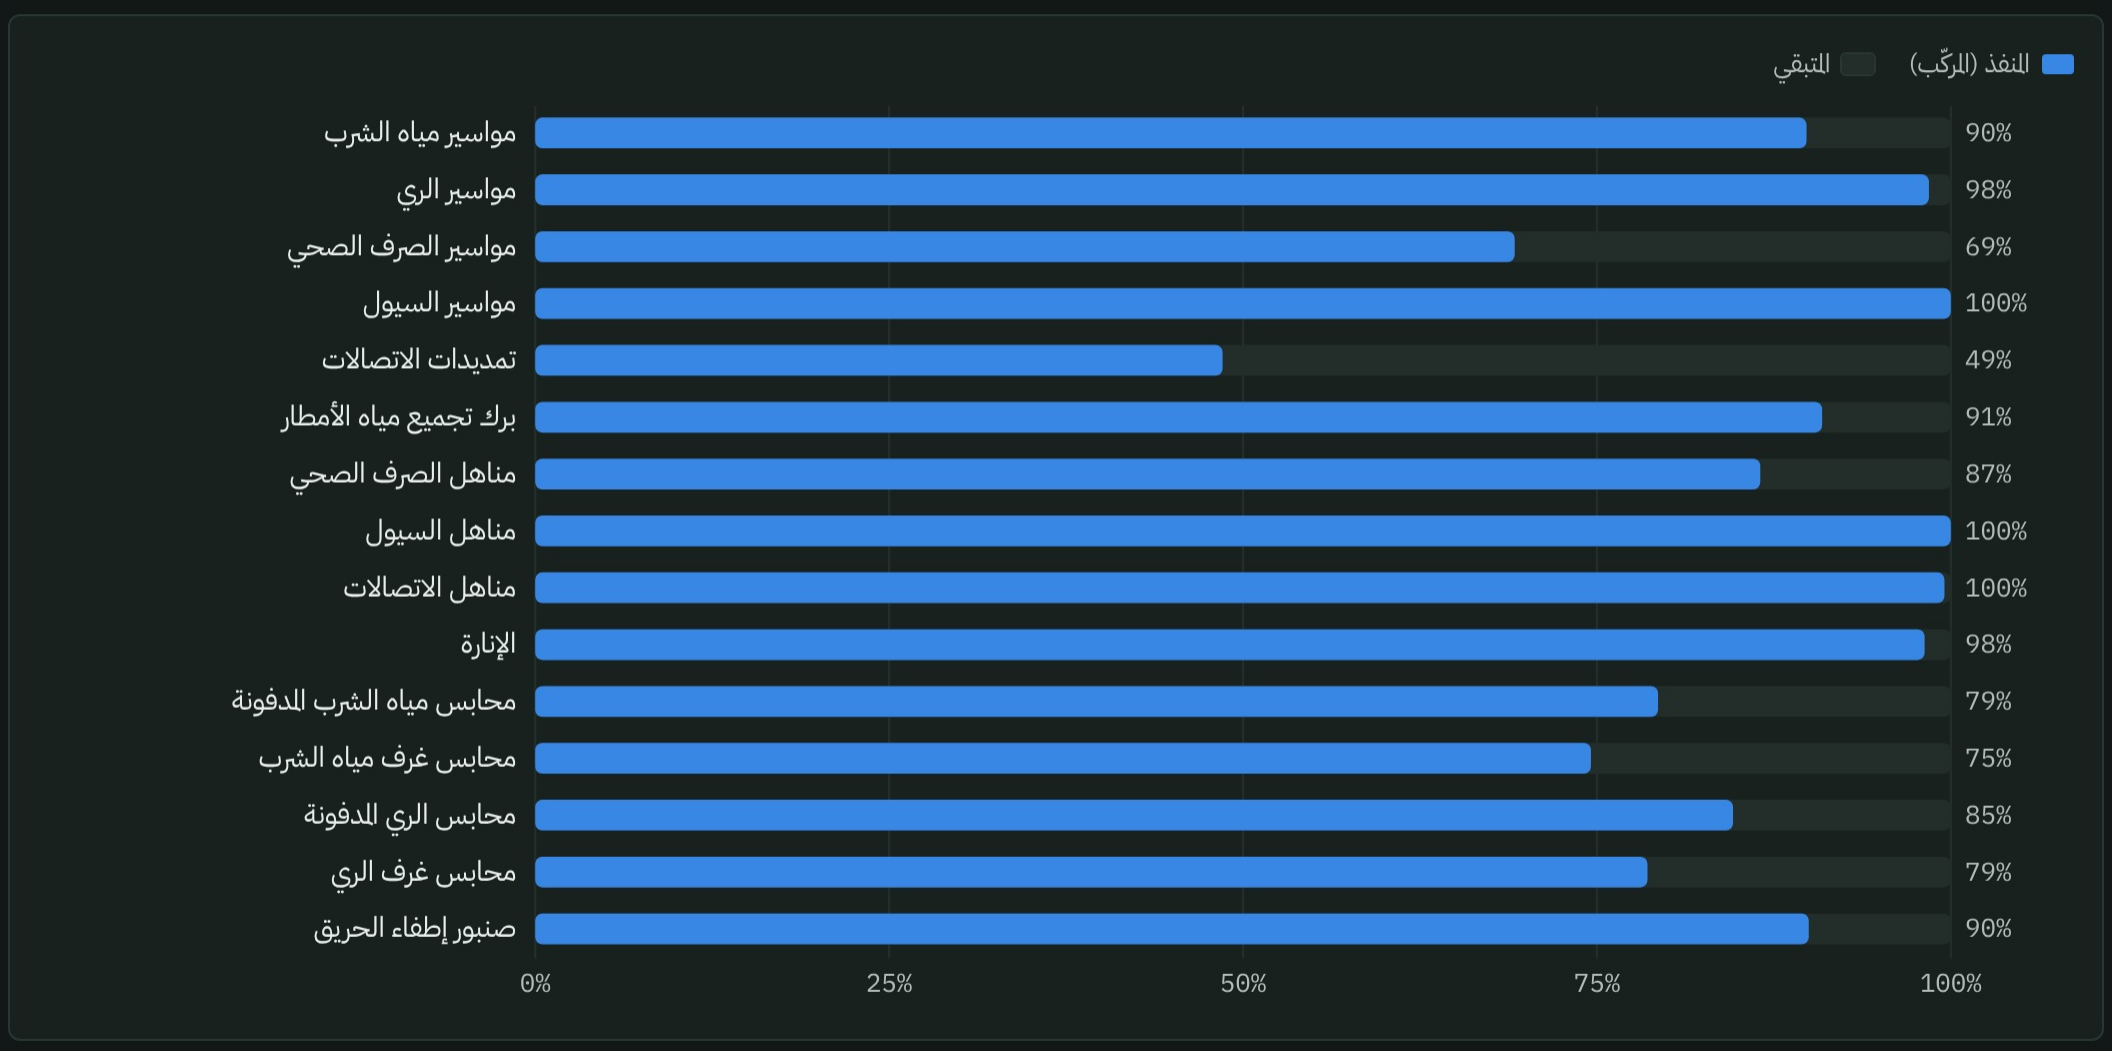

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مواسير مياه الشرب	جميع المناطق	م	2,992	2,687	–	305	89.8%	–
مواسير الري	جميع المناطق	م	4,911	4,835	–	76	98.5%	–

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مواسير الصرف الصحي	جميع المناطق	م	396	274	–	122	69.2%	–
مواسير السيول	جميع المناطق	م	42,616	42,616	–	0	100.0%	–
تمديدات الاتصالات	جميع المناطق	م	64,321	31,233	–	33,088	48.6%	–
برك تجميع مياه الأمطار	جميع المناطق	عدد	11	10	–	1	90.9%	–
مناهل الصرف الصحي	جميع المناطق	عدد	104	90	–	14	86.5%	–
مناهل السيول	جميع المناطق	عدد	13	13	–	0	100.0%	–
مناهل الاتصالات	جميع المناطق	عدد	444	442	–	2	99.5%	–
الإنارة	جميع المناطق	الوحدة غير محددة	54	53	–	1	98.1%	–
محابس مياه الشرب المدفونة	جميع المناطق	عدد	440	349	–	91	79.3%	–
محابس غرف مياه الشرب	جميع المناطق	عدد	59	44	–	15	74.6%	–
محابس الري المدفونة	جميع المناطق	عدد	884	748	–	136	84.6%	–
محابس غرف الري	جميع المناطق	عدد	70	55	–	15	78.6%	–
صنبور إطفاء الحريق	جميع المناطق	عدد	279	251	–	28	90.0%	–

الاتصالات والصرف الصحي أكبر الكميات المتبقية

نُفذ 49% من تمديدات الاتصالات (31,233 من 64,321 م) و69% من مواسير الصرف الصحي (274 من 396 م). ومن الشبكات المنفذة، اختُبر وسُلّم إلى الاستشاري 2,184 م من مياه الشرب و2,998 م من الري و6,705 م من الاتصالات، ولم تُسلَّم أي أطوال من الصرف الصحي أو السيول بعد.

شبكات المقاول السابق

أعاد الحربي اختبار 74,073 م من المياه و77,912 م من الري و38,914 م من الصرف الصحي من نطاق المقاول السابق، لكن لم يُسلَّم إلى الاستشاري سوى 8,588 م و3,442 م و9,343 م على التوالي. ولا يزال 31,676 م من شبكة السيول و5,516 م من الاتصالات بانتظار الاختبار.

المعالم الرئيسية

يُبقي التقرير الأسبوعي جميع التوقعات على تواريخ الخطة الأساسية، بينما تُظهر جداول P6 تأخر المعالم المرحلية للشبكات وتاريخ الانتهاء. نعرض الاثنين لمعالجة الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	19-May-2025	19-May-2025	19-May-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
تجهيزات الموقع	18-Jun-2025	18-Jun-2025	17-Jun-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد المخططات والمواصفات	18-Jul-2025	18-Jul-2025	11-Nov-2025	–	✓ منجز
تقديم التقرير وخطة العمل والبرنامج الزمني	18-Jul-2025	18-Jul-2025	13-Sep-2025	–	✓ منجز
إنجاز شبكات المياه والخزانات	18-Jan-2026	18-Jan-2026	23-May-2026	–	▼ متأخر
إنجاز أعمال تصريف مياه الأمطار	18-Jan-2026	18-Jan-2026	08-Apr-2026	–	▼ متأخر
انتهاء الاختبار والتشغيل	–	18-May-2027	24-Apr-2027	−41	▼ معرّض للتأخير
انتهاء النطاق المعدل	–	–	06-May-2027	−82	▼ معرّض للتأخير
إنجاز جميع خدمات المشروع	18-May-2027	18-May-2027	11-Jul-2027	–	▼ متأخر
انتهاء المشروع / التسليم النهائي	18-May-2027	18-May-2027	12-Jun-2027	−24	▼ متأخر

ثلاثة مصادر من P6 تعطي ثلاثة تواريخ انتهاء مختلفة، ولا يطابق أيٌّ منها التقرير الأسبوعي.

ينهي تحديث P6 المرفوع (تاريخ البيانات 24-أكتوبر-2026) المشروع في 12-يونيو-2027 (+25 يوماً). ويُظهر جدول معالم P6 في ملف التقرير الأسبوعي التسليم النهائي في 11-يوليو-2027 (+54 يوماً)، ويُظهر مستخرج P6 في ورقة Progress تاريخ 24-أكتوبر-2027 (+159 يوماً). أما التقرير الأسبوعي فيتوقع 18-مايو-2027 دون تأخير. وقد انقضى موعد معلمَي المياه والأمطار في 18-يناير-2026، ويضع العرض الأسبوعي شبكة مياه الشرب عند 80% وشبكة السيول عند 68%.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من إجمالي الكمية للمواد طويلة التوريد. المصدر: العرض الأسبوعي 27-أكتوبر-2026، شريحة المواد طويلة التوريد.



المضخات: توريد 3 من 15


يجري تركيب ملحقات مضخات Grundfos في المحطات، لكن لم يصل سوى 3 مضخات بسبب مشاكل الشحن العالمية. ولا يُتوقع توريد لوحة تحكم محطة المياه (IGEC، مجموعة واحدة) ولوحات محطات الصرف (وامكو، 4 مجموعات) كاملةً قبل يناير 2027.

المولدات وخزانات المطرقة المائية

وصل المولدان (كوهلر – أبونيان) إلى المملكة وينتظران اختبار القبول في المصنع قبل توريدهما إلى الموقع. وكان من المقرر أن يبدأ توريد خزانات المطرقة المائية (7) نحو 15-أكتوبر-2026، ولم يوزَّد أي منها. وأمر صيانة مضخات المياه (SPP) بانتظار قطع الغيار.

القوى العاملة

عدد القوى العاملة الشهري في الموقع (الموظفون والعمالة)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

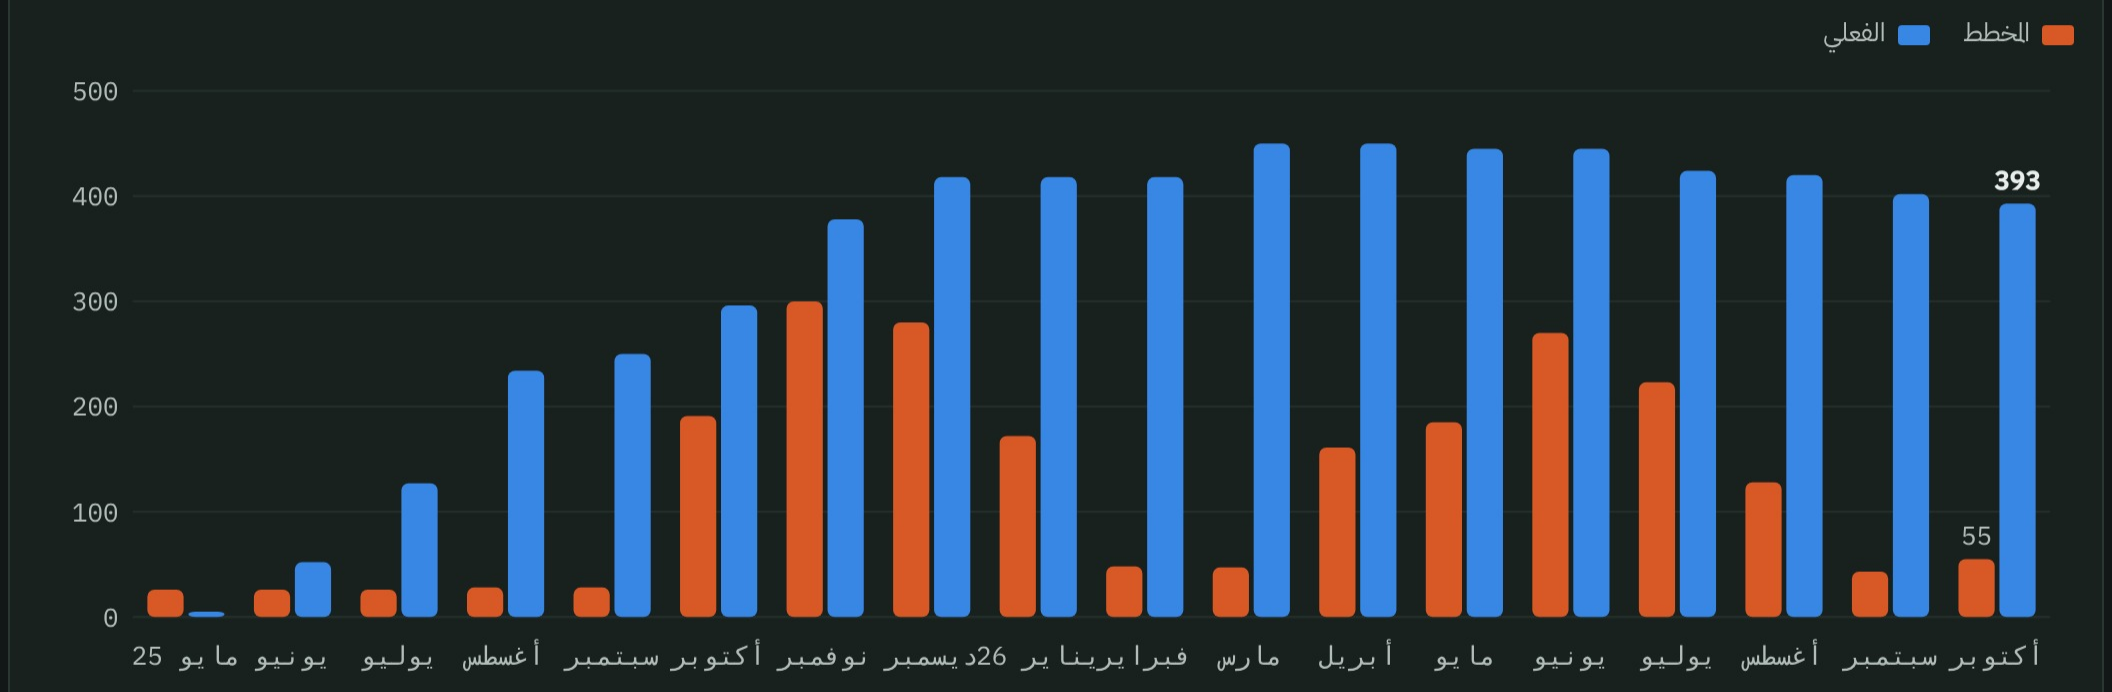

بلغ عدد القوى العاملة في أكتوبر 393 (59 موظفاً و334 عاملاً) مقابل 55 مخططاً. الخطة مأخوذة من تحميل الموارد في برنامج P6 وهي أقل بكثير من الأعداد الفعلية في الموقع، فلا تصلح مرجعاً للمقارنة. انخفضت العمالة الفعلية من 397 في مارس وأبريل إلى 334 في أكتوبر، ويذكر سجل المشكلات ضعف القوى العاملة والإنتاجية سبباً للتأخير.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (التقرير الأسبوعي)	233,776,077
قيمة العقد (العرض الأسبوعي، بدون الضريبة)	233,575,734
قيمة المشروع الحالية بعد وفر النطاق	164,170,171
قيمة الوفر الحالي	69,405,562
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال السعودي. تختلف قيمتا العقد بمقدار 200,343 ريال. يسجل العرض الأسبوعي تخفيض النطاق إلى 164.2 مليون ريال، ولا يوجد أمر تغيير مسجل لذلك.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة / المعتمدة	12 / 12
القيمة الإجمالية المقدمة	37,272,238
الدفعة المقدمة (10%)	23,377,608
المحتجزات (10%)	6,064,985
المستخلصات المدفوعة	4 · 15,540,346
إجمالي المصروف حتى المستخلص 14 (العرض الأسبوعي)	65,141,130
أعمال منفذة لم تُصرف (العرض الأسبوعي)	13,244,299

يحتسب التقرير الأسبوعي المستخلصات حتى الفترة المنتهية في 15-يوليو-2026، بينما يحتسب العرض الأسبوعي المصروف حتى المستخلص 14 (سبتمبر 2026)، أي 27.9% من قيمة العقد. ولا تزال الفوترة أقل بكثير من نسبة الإنجاز الفعلي 77.4%.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.83

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	1,547,996
ساعات العمل هذا الأسبوع	25,560
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	13
حوادث وشيكة	1
أضرار المتلكات	8
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	1,329 / 107

أسبوع فحص السلامة: 21–27 أكتوبر 2026. يصنف سجل المشكلات ضعف إجراءات الصحة والسلامة والبيئة بأنه حرج.

الجودة التقييم 0.91

طلبات استلام الأعمال: صادرة / مغلقة / مفتوحة	6,340 / 6,279 / 61
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة	53 / 53
تعليمات الموقع: صادرة / مفتوحة	89 / 2
طلبات فحص المواد: صادرة / مفتوحة	113 / 1
المخططات التنفيذية المقدمة (من 1,698)	1,687
المخططات التنفيذية المعتمدة A / B	306 / 1,368
اعتمادات المواد A / B	7 / 100

يوم فحص الجودة: 27-أكتوبر-2026.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
البحيرة 4	المقاول	اعتمدت مدن المقترح لكن التنفيذ ضعيف. يبدأ العمل بعد الانتهاء من شبكة الصرف الصحي عند تقاطع شارع 25 مع شارع 9. وقد انقضى الموعد المستهدف 30-سبتمبر-2026.
قطع شارع 25	المقاول	قطع الأسفلت في شارع 25 لتركيب الشبكات المدفونة: انتهى تقاطع شارع 2 ويجري العمل في تقاطع شارع 9 (المستهدف 31-أكتوبر-2026). وقد أوقف إصدار التصاريح في شارع 25.
معدات محطات الضخ	المقاول	نظام التحكم في محطة المياه (المستهدف 31-أغسطس-2026، وقد انقضى) والمولدات وخزانات المطرقة المائية والمضخات: صُرفت الدفعات وجاري التصنيع. صدر أمر شراء صيانة مضخات المياه، وتستغرق الصيانة أسبوعين بعد وصول القطع.
اختبارات الشبكات	المقاول	الاختبارات لازمة لتسليم شبكات متكاملة. قُدمت خطة الاختبارات، والأمر عاجل.
التداخل مع جهات أخرى	غير محدد	هبوط البلاطة بسبب أعمال شركة وتكو والعيسى، وتعارض بوابة مكاتب العيسى مع قاعدة عمود إنارة، وإيقاف الأعمال في البلوك F لحين الانتهاء من تمديد كهرباء المصنع الصيني.
القوى العاملة والإنتاجية	المقاول	انخفاض القوى العاملة والمعدات وضعف إنتاجية طواقم المقاول (سجل مشكلات مدن، أولوية عالية).
الحفر اليدوي	المقاول	يتم الحفر يدوياً لعدم وجود مخططات للأعمال القائمة، ويجري عمل جسات قبل الحفر.
المخططات والشبكة القائمة	المقاول	مخططات IFC لا تطابق الطبيعة في الموقع، وجدول كميات إصلاح الشبكة القائمة غير واضح، ورفض الاستشاري والمالك استبدال جميع المواسير التالفة من منهل إلى منهل.

المخاطر القائمة في سجل مدن: تغيّر أولويات المدينة الصناعية بما يخفض النطاق (عالية)، وتأخر المشتريات بسبب مشاكل الشحن في المنطقة (عالية)، وتكرار إيقاف الأعمال بما يضعف الإنتاج اليومي (متوسطة)، والفروقات بين قيمة العقد الموقع والأعمال الفعلية (متوسطة).

ملاحظات على البيانات

- هذا أول أسبوع يُرفع للمشروع (المجلدات W01–W03 فارغة)، لذا لا توجد قيم للأسبوع السابق: لا يوجد رقم "هذا الأسبوع" لكميات النطاق، ويحوي جدول المنحنى صفاً واحداً. التقدم الأسبوعي (+0.07%) هو الرقم الوارد في التقرير الأسبوعي.

- أسبوع التقرير هو الأسبوع التعاقدي الوارد في ورقة Milestones ("Current Contract Weeks: 75 of 104")، ويطابق (27-أكتوبر-2026 – 19-مايو-2025) ÷ 7. يحمل الملف الرقم التسلسلي 63 وتذكر أسماء الملفات WPR 56، وليس أي منهما رقم الأسبوع.
- تختلف تواريخ البيانات بين الملفات: التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026، وتحديث P6 بتاريخ 24-أكتوبر-2026، ومستخرج P6 في ورقة Progress بتاريخ 20-أكتوبر-2026، وسجل التوريدات بتاريخ 20-أكتوبر-2026.
- عدة صفوف للتقدم الفعلي في ورقة Weekly Progress Report خاطئة: صف التنفيذ يُظهر 189.8% مخطط و206.6% منجز؛ والمنطقة 3 تُظهر 354,449 ساعة عمل منجزة (إجمالي المشروع كله) مقابل ميزانية 147,160؛ والطرق المحلية 997%؛ والاتصالات 0% والطرق الشريانية 0% رغم أن مستخرج P6 يسجل 16,489 و199 ساعة عمل فعلية. استُخدمت قيم مستخرج P6 لهذه الصفوف. إجماليات المشروع (96.5% مخطط، 77.4% فعلي) متسقة مع ساعات P6 الفعلية.

- ميزانية ساعات العمل 458,486 في صف الإجمالي، لكنها 467,288 كمجموع للمناطق (467,280 في ورقة المنحنى).
- النسبة المخططة 96.5% حتى تاريخه لا تطابق أياً من منحنيي ورقة Physical-Chart Data (الأساسية 92.5% والمعدلة 95.2% لشهر أكتوبر). وتتوقف القيم الفعلية الشهرية في ورقة المنحنى عند يونيو 2026، والقيم الفعلية لمارس إلى مايو 2026 مطابقة تماماً لقيم الخطة المعدلة.
- تختلف توقعات الانتهاء: التقرير الأسبوعي 18-مايو-2027، وتحديث P6 بتاريخ 12-يونيو-2027، وجدول معالم P6 بتاريخ 11-يوليو-2027، ومستخرج P6 بتاريخ 24-أكتوبر-2027. ولا تزال المعالم المرحلية 3 إلى 6 معلّمة "F" (متوقع) في التقرير الأسبوعي بتواريخ في 2025–2026.
- تعرض ورقة Target schedule وشرائح العرض 3 و4 و10 نسب تقدم مرجّحة بالقيمة (على أساس التكلفة) موصوفة بأنها فعلية أو منجزة، ولم تُستخدم هذه الأرقام في هذا التقرير.
- قيمة العقد 233,776,077 ريال في التقرير الأسبوعي و233,575,734 ريال في العرض الأسبوعي. المستخلصات: يُظهر التقرير الأسبوعي 37.3 مليون ريال (12 مستخلصاً)، ومجموع سجل المستخلصات 60.6 مليون ريال شاملاً الدفعة المقدمة، ويُظهر العرض 65.1 مليون ريال مصروفة حتى المستخلص 14. ويسجل سجل المستخلصات تواريخ دفع للمستخلصات 6–8 تسبق فتراتها.
- القوى العاملة: تُظهر لوحة الملخص 388 عاملاً و57 موظفاً (445)، بينما يُظهر الجدول الشهري والعرض الأسبوعي 334 عاملاً و59 موظفاً (393) لشهر أكتوبر.
- كميات النطاق: شريحة نطاق التقدم معنونة "تحديث 15 سبتمبر" وتذكر الاتصالات 11,800 من 21,318 ومياه الشرب 2,687 من 2,839، مقابل 31,233 من 64,321 م و2,687 من 2,992 م في شريحة كميات الشبكات. وكمية الإنارة (53 من 54) بلا وحدة.
- التوريدات: يُظهر سجل التوريدات بتاريخ 20-أكتوبر توريد مضختين مقابل 3 في عرض 27-أكتوبر، ويصف طلب كوهلر – أبونيان بأنه نظام الوقود (المولدات في العرض)، ويصف طلب VEGA بأنه المولدات (بلا اسم في العرض). ولا تحوي ورقة Procurement في ملف التقرير أي كميات.
- حقل "Modon PM" في التقرير الأسبوعي فارغ، وأُخذ اسم مدير المشروع من سجل المخاطر والمشكلات لدى مدن. وتُظهر ورقة Major Quantities عبارة "Final BOQ submitted and under review" لكل الشبكات.
