تطوير شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بسدير المرحلة الثالثة

Infrastructure Network Development, Sudair City for Industry and Business

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة تطوير التقنية للمقاولات (TDC)	إيجيس (EGIS)	م. زياد الشبات	06-Jan-2026	05-Jul-2027

النطاق: أعمال الطرق والرصف، وشبكات مياه الشرب والمياه المعالجة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والري وتنسيق المواقع، والشبكة الكهربائية (الجهد المتوسط والاتصالات وإنارة الطرق) وكاميرات المراقبة في المنطقتين A وG، خلال 18 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في 09-نوفمبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 47.9% مقابل 45.9% مخططاً، أي أن المشروع متقدم بنسبة 2.0% (مؤشر الأداء الزمني 1.04). وأُنجز هذا الأسبوع 1.13% مقابل 2.25% مخططاً، أي نصف الخطة، فتقلص التقدم من 3.1% إلى 2.0%، وهو التراجع الأسبوعي الرابع على التوالي. وجاءت معظم ساعات العمل هذا الأسبوع من شبكة مياه الشرب والأعمال الكهربائية وأعمال الطرق. أعمال الطرق وشبكات السيول والصرف الصحي ومياه الشرب متقدمة، بينما التوريدات والتصميم الهندسي والأعمال الكهربائية وكاميرات المراقبة متأخرة.

نسبة الإنجاز الفعلي
47.9% / 45.9% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.04 +2.0%

التقدم هذا الأسبوع
+1.13% / +2.25%
مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.12%

المدة المنقضية من العقد
56.3% · اليوم 307 من 545
● انتهاء P6: 05-يوليو-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
20.6% · 34.7 مليون ريال
5 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 28-أكتوبر-2026

متقدم إجمالاً، لكن التقدم على الخطة يواصل التقلص والتوريدات لا تزال متأخرة.

جاء تقدم هذا الأسبوع (1.13%) نصف الخطة الأسبوعية (2.25%). فقد حققت أعمال السيول 815 ساعة عمل من 7,965 مخططة، والصرف الصحي 35 من 2,549، ولم تحقق كاميرات المراقبة أي ساعة من 1,147. التوريدات عند 60.4% مقابل 99.9% مخططاً (مؤشر الأداء 0.61): لم تُورَّد بعد تمديدات الجهد المتوسط (0 من 51,500 م) ولا المحطات الفرعية ولا أعمدة الإنارة ولا لوحات الإنارة، ولا يزال الموقع النهائي للمحطة الفرعية بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء. ولا يزال تحديث P6 يُنهي المشروع في 05-يوليو-2027 بفائض زمني صفر، لكنه أخّر أعمال الطرق وأعمال الجهد المتوسط وجميع أعمال الشبكات من 7 إلى 8 أيام، ولم يبقَ لأعمال التشطيبات سوى 0.7 يوم من الفائض.

صور الموقع هذا الأسبوع

الصور الست من ورقة "Weekly Progress Photos" في التقرير الأسبوعي بتاريخ 09-نوفمبر-2026، مع تعليقاتها في الورقة. تحمل اثنتان منها ختم تاريخ (05 و07-نوفمبر-2026)، ولا تُظهر أي منها إحداثيات GPS. تُظهر خمس منها أعمال الطرق في المنطقة A (الطبقة التمهيدية وطبقة الأساس والطبقة الإسفلتية الأولى)، وتُظهر واحدة صب خرسانة البردورات في المنطقة G. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



رش الطبقة التمهيدية (MC1) على طبقة الأساس، MCF0 المنطقة A

رش الطبقة التمهيدية MC1 على طبقة الأساس.



دمك طبقة الأساس، Art MC10 المنطقة A

دمك طبقة الأساس.



اختبار دمك طبقة الأساس، دوار MC20 – Art MC10، المنطقة A

اختبار دمك طبقة الأساس.



الطبقة الإسفلتية الأولى لطبقة الأساس، MCG0 المنطقة A

فرش الأسفلت؛ الختم 07-نوفمبر-2026 11:32.



دمك الأسفلت، MCG0 المنطقة A

دمك الطبقة الإسفلتية الأولى لطبقة الأساس.




صب خرسانة البردورات، MCF0 المنطقة G

صب الخرسانة للبردورات؛ الختم 05-نوفمبر-2026 12:11.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، بنقاط شهرية مؤرخة في اليوم السادس من كل شهر، ويظهر آخر فعلي (09-نوفمبر) على نقطة نوفمبر. المصدر: ورقة Physical-Chart Data. لا توجد خطة معدلة.

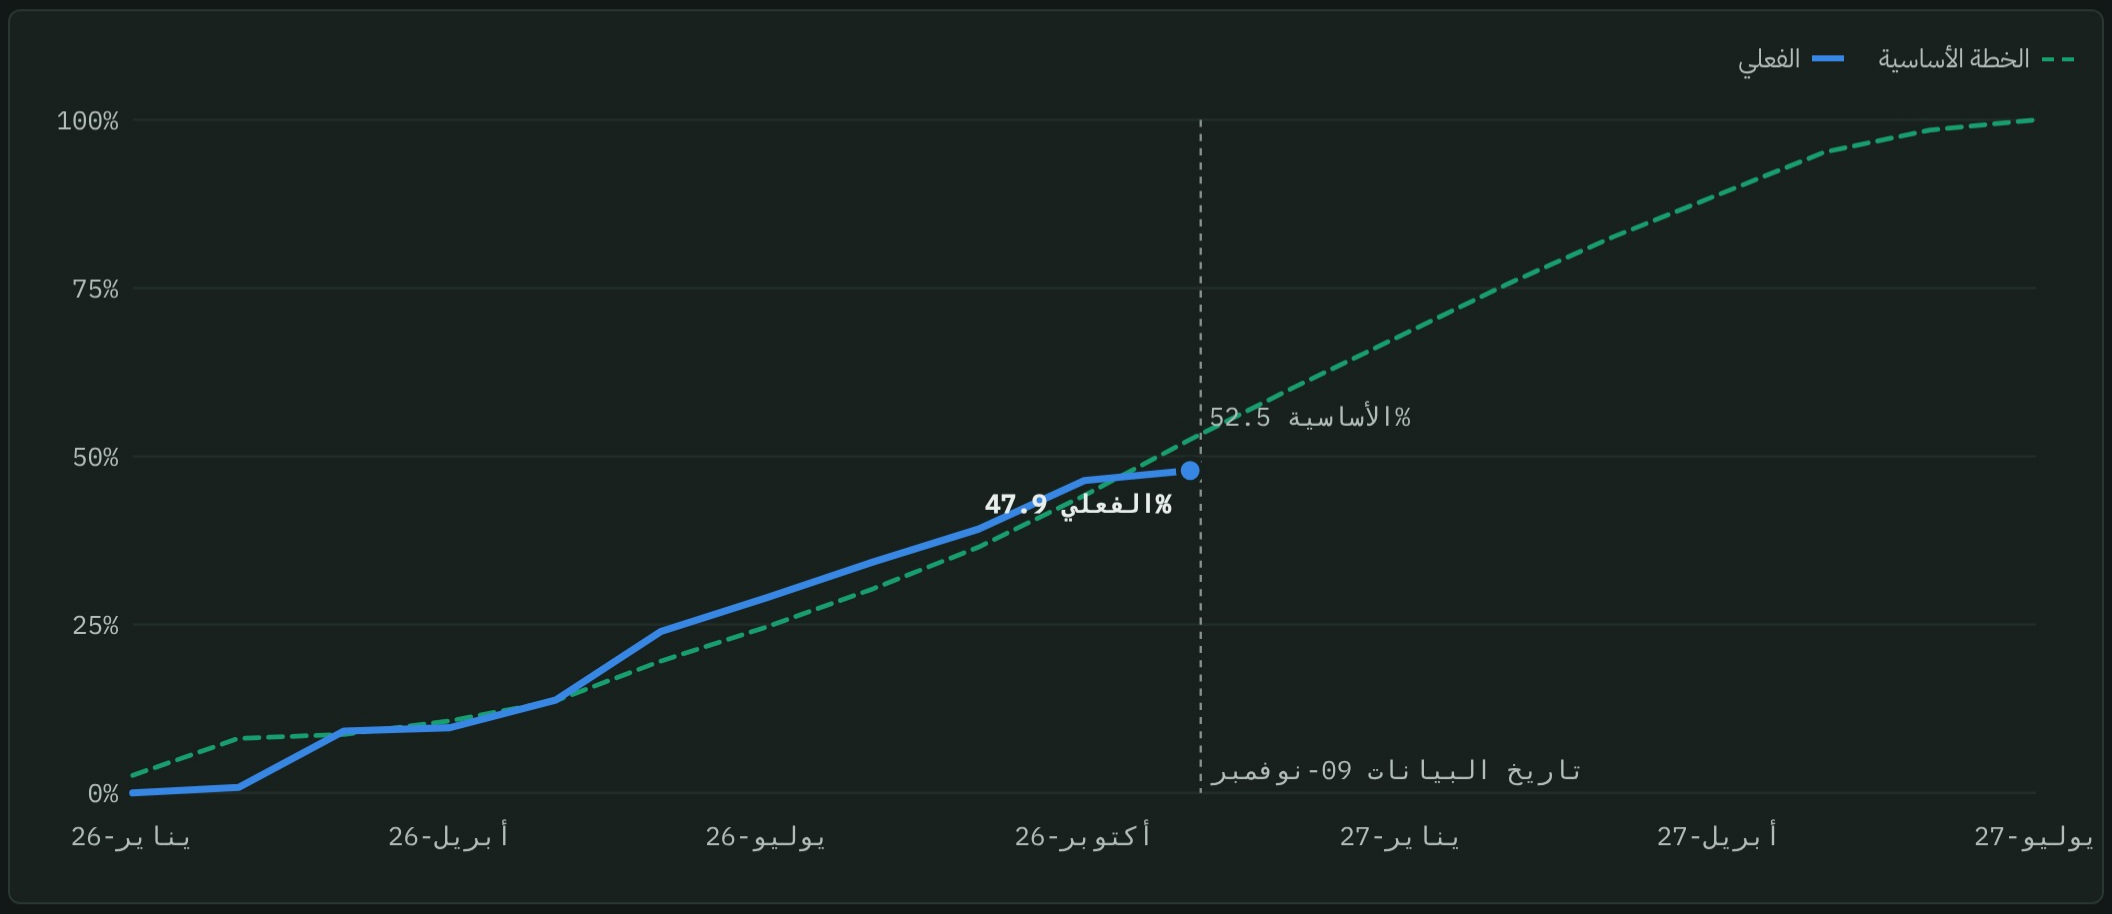

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
12-Oct-2026	39.10	44.79	+5.69	–	1.15
19-Oct-2026	40.66	45.43	+4.77	+0.64	1.12
26-Oct-2026	42.15	46.41	+4.26	+0.99	1.10
02-Nov-2026	43.63	46.74	+3.10	+0.32	1.07
09-Nov-2026	**45.89**	**47.87**	**+1.98**	**+1.13**	**1.04**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقارير الأسبوعية بتاريخ 19 و26 أكتوبر و02 و09 نوفمبر 2026. صف 12-أكتوبر-2026 هو قيمة الأسبوع السابق الواردة في تقرير 19 أكتوبر، ولا يُذكر المنجز الأسبوعي له. تخطط الخطة الأساسية في المنحنى 52.5% في 06-نوفمبر، بينما يخطط التقرير الأسبوعي 45.9% حتى 09-نوفمبر؛ انظر ملاحظات على البيانات.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. صفوف الشبكات جزء من التنفيذ، وأوزانها حصص من المشروع كاملاً. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5%	100.0%	93.4%	−6.6%	0.93	▼ متأخر
التوريدات	13%	99.9%	60.4%	−39.5%	0.61	▼ متأخر
التنفيذ	75%	33.2%	43.1%	+9.9%	1.30	▲ متقدم
· أعمال الطرق	16.4%	80.3%	85.0%	+4.7%	1.06	▲ متقدم
· تصريف مياه الأمطار	16.5%	28.8%	46.8%	+18.0%	1.62	▲ متقدم
· الصرف الصحي	5.5%	16.3%	72.7%	+56.4%	4.45	▲ متقدم
· المياه المعالجة	7.7%	0.0%	7.7%	+7.7%	–	▲ بدأ مبكراً
· مياه الشرب	12.3%	0.0%	18.0%	+18.0%	–	▲ بدأ مبكراً
· الأعمال الكهربائية	8.7%	63.7%	40.2%	−23.4%	0.63	▼ متأخر
· تنسيق المواقع والري	6.8%	0.0%	4.7%	+4.7%	–	▲ بدأ مبكراً
· كاميرات المراقبة	1.2%	48.1%	12.2%	−35.9%	0.25	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإغلاق	2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**45.9%**	**47.9%**	**+2.0%**	**1.04**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 09-نوفمبر-2026) عدد 2,115 نشاطاً: 823 مكتمل و351 قيد التنفيذ و941 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 05-يوليو-2027، وهو تاريخ انتهاء العقد.

نطاق العمل: الكميات

الكمية المنفذة في الموقع للبنود الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 09-نوفمبر-2026. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" التغير منذ تقرير 02-نوفمبر-2026. لا يقسّم التقرير الكميات حسب المنطقة. جدول النطاق في صفحة الملخص لا يُظهر أي كمية منفذة لأي شبكة ولم يُستخدم.

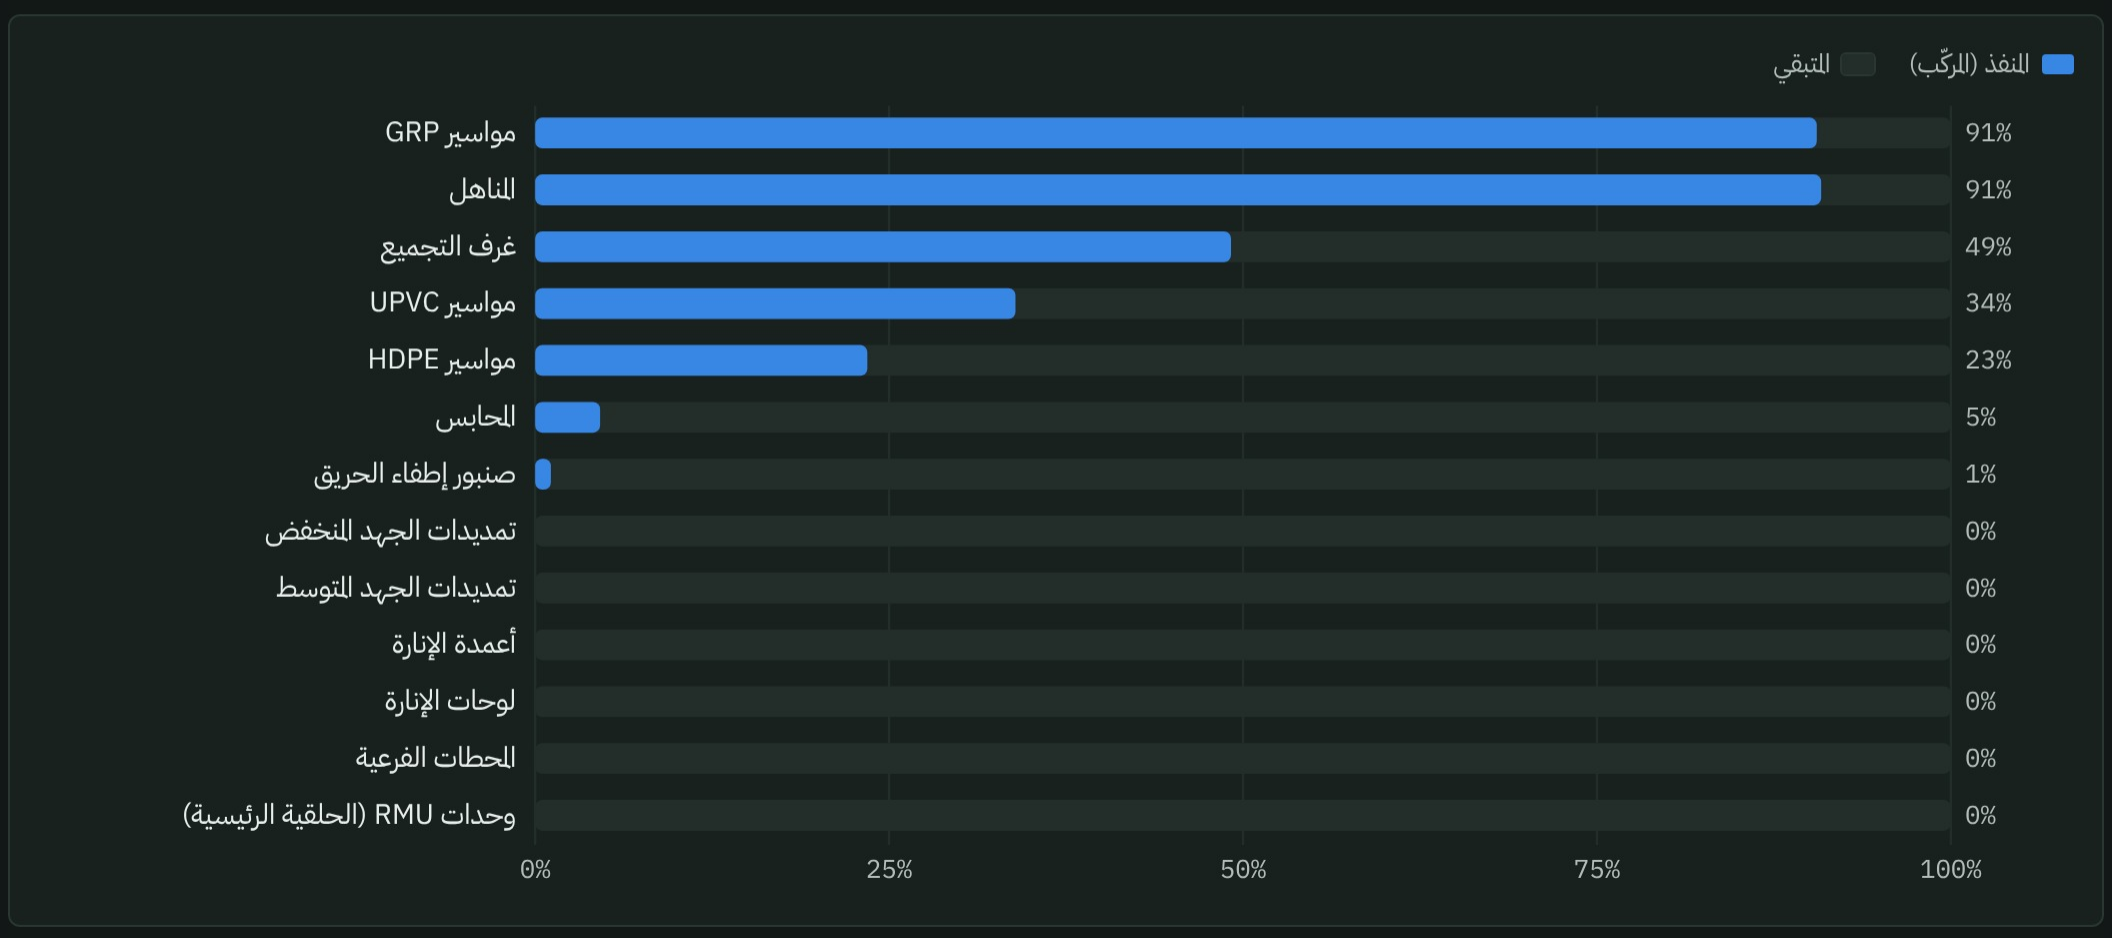

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مواسير GRP	جميع المناطق	م	18,337	16,600	100+	1,737	90.5%	–
المناهل	جميع المناطق	عدد	251	228	0	23	90.8%	–
غرف التجميع	جميع المناطق	عدد	295	145	5+	150	49.2%	–
مواسير UPVC	جميع المناطق	م	4,716	1,600	100+	3,116	33.9%	–
مواسير HDPE	جميع المناطق	م	28,557	6,700	200+	21,857	23.5%	–
المحابس	جميع المناطق	عدد	218	10	0	208	4.6%	–
صنبور إطفاء الحريق	جميع المناطق	عدد	90	1	0	89	1.1%	–
تمديدات الجهد المنخفض	جميع المناطق	م	68,400	0	0	68,400	0.0%	–
تمديدات الجهد المتوسط	جميع المناطق	م	51,500	0	0	51,500	0.0%	–
أعمدة الإنارة	جميع المناطق	عدد	592	0	0	592	0.0%	–
لوحات الإنارة	جميع المناطق	عدد	52	0	0	52	0.0%	–
المحطات الفرعية	جميع المناطق	عدد	5	0	0	5	0.0%	–
وحدات RMU (الحلقية الرئيسية)	جميع المناطق	عدد	11	0	0	11	0.0%	–

إضافات محدودة لشبكات المياه هذا الأسبوع

مواسير GRP مركّبة بنسبة 91% (16,600 من 18,337 م) والمناهل 91% (228 من 251). غرف التجميع عند 49%، ومواسير UPVC عند 34%، ومواسير HDPE عند 23%. وأُضيف هذا الأسبوع 100 م من مواسير GRP و100 م من مواسير UPVC و200 م من مواسير HDPE و5 غرف تجميع، ولم يتغير أي بند آخر.

لم تبدأ أو بالكاد بدأت

صنبور إطفاء الحريق (1 من 90) والمحابس (10 من 218) بالكاد بدأت. لم يُركّب بعد أي من تمديدات الجهد المنخفض أو المتوسط أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإنارة أو المحطات الفرعية أو وحدات RMU.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 تواريخ مختلفة لعدة معالم. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول.
تواريخ الخطة الأساسية لآخر أربعة معالم تعاقدية مأخوذة من الجدول الأساسي المعتمد المرفوع مع تقرير 19 أكتوبر.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	06-Jan-2026	06-Jan-2026	06-Jan-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	05-Feb-2026	05-Feb-2026	06-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم الخطة الأساسية	05-Feb-2026	06-Apr-2026 (+60 يوماً)	06-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
مختبر الجودة	05-Feb-2026	16-Feb-2026 (+11 يوماً)	–	–	✓ منجز
RBF	05-Feb-2026	16-Feb-2026 (+11 يوماً)	–	–	✓ منجز
التقديمات الفنية (المخططات والمواد)	05-Mar-2026	16-Aug-2026 (+164 يوماً)	25-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
انتهاء مرحلة التصميم الهندسي	05-Mar-2026	28-Sep-2026 (+207 يوماً)	09-Nov-2026	80	▼ متأخر
انتهاء مرحلة التوريدات	23-Jan-2027	17-Jan-2027	12-Jan-2027	18	● في المسار
اكتمال أعمال الجهد المتوسط	21-Jan-2027	–	04-Mar-2027	21	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع أعمال الشبكات	04-May-2027	–	05-May-2027	47	▼ معرّض للتأخير
اكتمال أعمال الطرق	14-Apr-2027	–	05-May-2027	7	▼ معرّض للتأخير
اكتمال أعمال التشطيبات	05-Jul-2027	–	05-Jul-2027	0.7	▼ معرّض للتأخير
انتهاء المشروع (جميع الأعمال)	05-Jul-2027	05-Jul-2027	05-Jul-2027	0	● في الموعد

يختلف التقرير الأسبوعي وتحديث P6 في تواريخ أربعة معالم، وأخّر P6 مجدداً معالم الشبكات والطرق والجهد المتوسط.

انتهى التجهيز في 05-فبراير-2026 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 06-أبريل-2026 حسب P6. وانتهت التقديمات الفنية في 16-أغسطس-2026 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 25-يوليو-2026 حسب P6. ويتوقع التقرير الأسبوعي انتهاء مرحلة التصميم الهندسي في 28-سبتمبر-2026، بينما يُبقيها P6 مفتوحة وينقلها إلى كل تاريخ بيانات (الآن 09-نوفمبر-2026). وتنتهي التوريدات في 17-يناير-2027 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 12-يناير-2027 حسب P6. وفي تحديث P6 لهذا الأسبوع تأخر اكتمال أعمال الطرق 8 أيام ليصبح بعد خطته الأساسية بـ21 يوماً (الفائض 7 أيام بعد أن كان 12)؛ وتأخر اكتمال جميع أعمال الشبكات 8 أيام ليصبح بعد خطته الأساسية بيوم واحد (الفائض 47 يوماً بعد أن كان 54)؛ وتأخرت أعمال الجهد المتوسط 7 أيام لتصبح بعد خطتها الأساسية بـ42 يوماً (الفائض 21 يوماً بعد أن كان 25)؛ وانتقلت أعمال التشطيبات إلى 05-يوليو-2027 (الفائض 0.7 يوم بعد أن كان 2.7). ولم يبقَ أي فائض زمني لانتهاء المشروع.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ورقة Major Quantities؛ والأسفلت والإنترلوك والبردورات من نسبة الإنجاز في ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 09-نوفمبر-2026. لم يتغير أي رقم توريد هذا الأسبوع.



تمديدات الجهد المتوسط: لم يُورَّد شيء


0 من 51,500 م. تُظهر ورقة Procurement أن اعتماد المادة لم يُقدَّم، وأن الموعد المطلوب لوصولها إلى الموقع 31-مايو-2026. ويذكر سجل المخاطر أن التمديدات تم شراؤها، وأن الموقع النهائي للمحطة الفرعية لا يزال بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء.

الإنارة والمحطات الفرعية ومواد الرصف

أعمدة الإنارة الموّردة 1 من 592، ولوحات الإنارة 0 من 52، والمحطات الفرعية 0 من 5 (لم يُقدَّم الاعتماد). والبردورات والإنترلوك موّردة بنسبة 15% والخلطة الإسفلتية 40%، دون تغيير عن الأسبوع الماضي.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمالة الميدانية وغير الميدانية)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

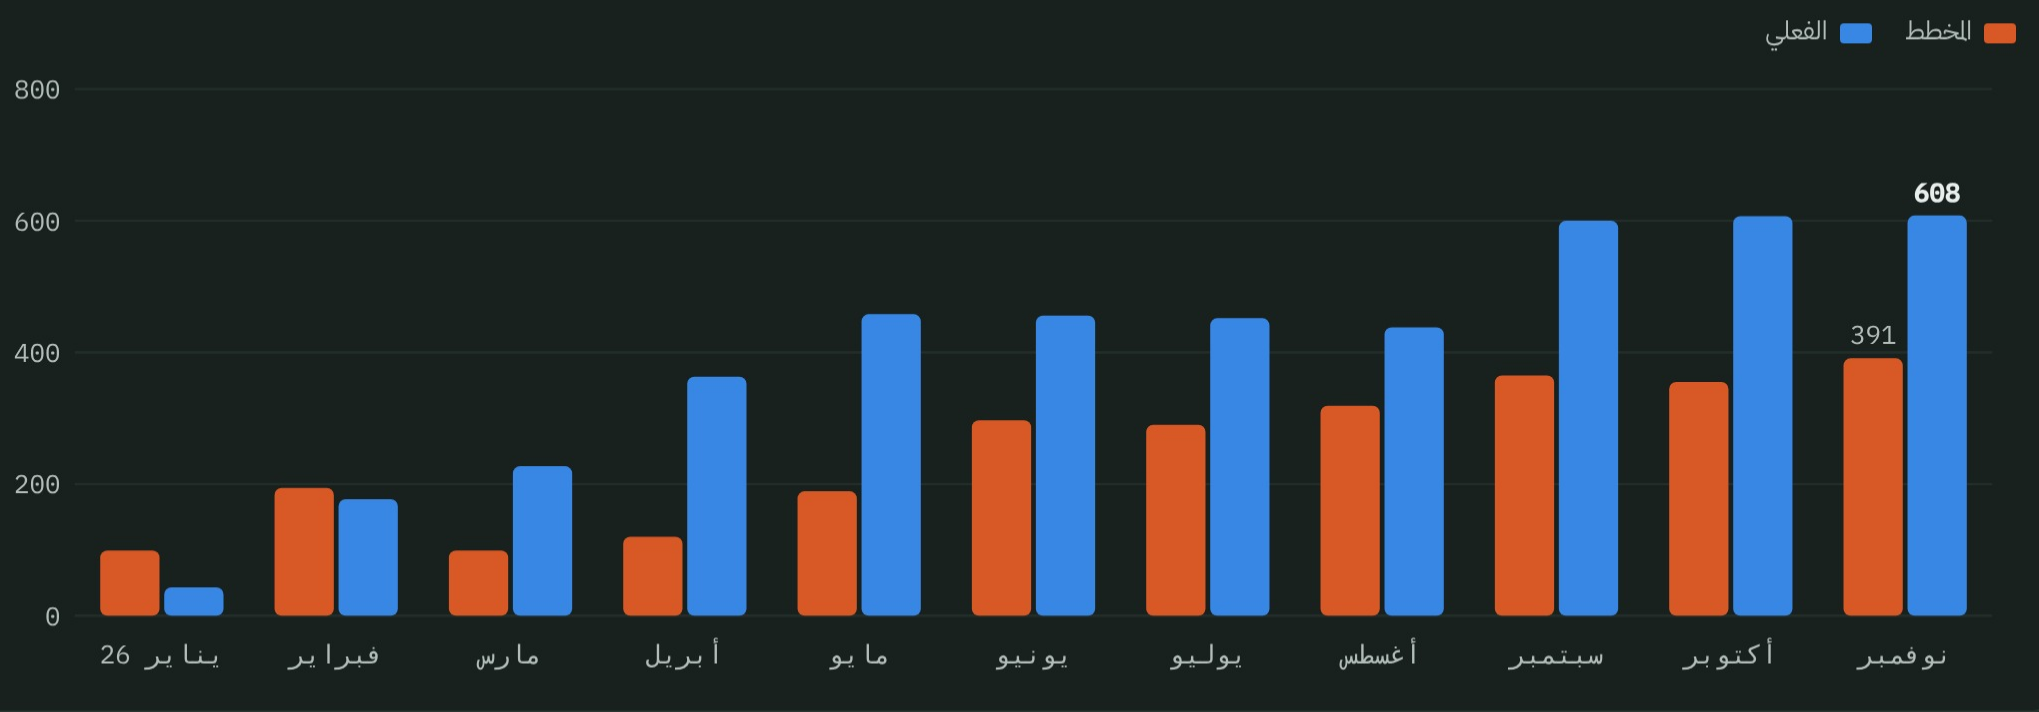

عدد العمالة في نوفمبر 608 (540 ميدانية و68 غير ميدانية) مقابل 391 مخططاً (+55%)، بزيادة واحد عن أكتوبر. العدد الفعلي أعلى من المخطط كل شهر منذ فبراير، ومع ذلك جاء تقدم هذا الأسبوع نصف الخطة. ويوجد في الموقع 332 معدة مقابل 250 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الطرق	88,002,863
شبكة تصريف مياه الأمطار	25,405,198
الأعمال الكهربائية	20,082,302
أعمال كاميرات المراقبة	9,305,708
شبكة مياه الشرب	7,779,405
شبكة الصرف الصحي	7,071,027
تنسيق المواقع والري	6,835,461
شبكة المياه المعالجة	4,147,557
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**168,629,520**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	193,923,948
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	5
القيمة الإجمالية	34,697,865
استرداد الدفعة المقدمة (10%)	-3,469,787
المحتجزات	0
الخصومات والغرامات	-35,000
ضريبة القيمة المضافة	4,684,212
الصافي شاملاً الضريبة	35,877,290
معتمد من مدير المشروع / مدفوع	0 / 0
الدفعة المقدمة (10%)	16,862,952

المفوتر 20.6% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 47.9%. لم يُضف أي مستخلص هذا الأسبوع؛ وآخرها المستخلص الخامس (10,122,463 ريال إجمالي) ويغطي الفترة من 01 إلى 28 أكتوبر 2026. يُظهر سجل المستخلصات أن أياً من المستخلصات الخمسة لم يُعتمد من مدير المشروع ولم يُدفع بعد؛ ويغطي أولها الأعمال حتى 28-يونيو-2026.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة

التقييم 83.0%

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	1,009,826
ساعات العمل هذا الأسبوع	36,450
ساعات العمل هذا الشهر (نوفمبر)	48,590
التدريبات الداخلية (تراكمي)	58
اجتماعات التوعية (تراكمي)	58
تقييم تفتيش السلامة من الاستشاري	80.7%
ملاحظات السلامة المسجلة / المغلقة	19 / 19

جميع ساعات العمل مسجلة كساعات آمنة. لا يذكر التقرير أعداد الحوادث بوضوح.

الجودة

التقييم 91.0%

تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة / المفتوحة	25 / 21 / 4
تعليمات الموقع الصادرة / المفتوحة	7 / 1
طلبات فحص المواد الصادرة / المفتوحة	249 / 4
طلبات الفحص الميداني الصادرة / المفتوحة	4,455 / 75
المخططات التنفيذية المقدمة / المعالجة	424 / 340
مخططات تنفيذية معلقة لدى الاستشاري	21
اعتمادات المواد المعالجة	63 من 66

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
موقع المحطة الفرعية (الجهد المتوسط)	المالك / الشركة السعودية للكهرباء	لا يزال الموقع النهائي للمحطة الفرعية بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء. حُسم مقاس تمديدات الجهد المتوسط بطلب استيضاح (أُجيب في 09-فبراير-2026)، وينفذ المقاول مجاري عبور الطرق لتمديدات الجهد المتوسط على مسؤوليته. قد يؤثر استمرار التأخير على الاختبار والتشغيل والتسليم. التصنيف: مرتفع (5 × 5).
اعتماد مقترح تنسيق المواقع	المالك	مقترح تنسيق المواقع (RFI-0036، 23-أغسطس-2026) بانتظار اعتماد المالك، وهو مطلوب لإنهاء المخططات التنفيذية لتنسيق المواقع وتوريد المواد. التصنيف: متوسط.
التوريدات متأخرة عن الخطة	المقاول	التوريدات عند 60.4% مقابل 99.9% مخططاً، ولم تُحقق أي ساعات عمل منذ أسبوعين. ولا يزال اعتماد تمديدات الجهد المتوسط والمحطات الفرعية وعدادات الكهرباء وسياج الأعمال الكهربائية وتخطيط الطرق غير مقدَّم.
الإنجاز الأسبوعي نصف الخطة	المقاول	حقق المشروع هذا الأسبوع 12,926 ساعة عمل مقابل 25,655 مخططة. وحققت أعمال السيول 815 من 7,965 مخططة (وأصبحت أعمال السيول في المنطقة A عند 24.5% مقابل 31.4% مخططاً)، والصرف الصحي 35 من 2,549، وكاميرات المراقبة 0 من 1,147. والأعمال الكهربائية عند 40.2% مقابل 63.7% مخططاً، وكاميرات المراقبة عند 12.2% مقابل 48.1%. وأخّر P6 اكتمال أعمال الطرق إلى 05-مايو-2027 (الفائض 7 أيام).
التصميم الهندسي لم يُغلق	المقاول	التصميم الهندسي عند 93.4% مقابل 100% مخططاً دون تغيير منذ أربعة أسابيع، ولا تزال مرحلة التصميم مفتوحة في P6. ولا تزال 4 تقارير عدم مطابقة مفتوحة، و21 مخططاً تنفيذياً معلقة لدى الاستشاري (13 للشبكات الرطبة و8 لكاميرات المراقبة).

جميع ملاحظات السلامة الـ19 في سجل المشكلات (من 08-سبتمبر إلى 05-نوفمبر-2026) و22 من أصل 24 خطراً في السجل مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- تسمي الملفات المرفوعة المشروع "المرحلة الثانية – الجزء الثاني" (SUD1-02-011)، بينما يسميه مجلد المستودع وسجل المشاريع المرحلة الثالثة.
- تسمّي ورقة الملخص التقدم المحسوب على أساس التكلفة "المخطط" و"الفعلي". يستخدم هذا التقرير التقدم الفعلي فقط (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة): 45.89% مخططاً و47.87% فعلياً.
- تخطط الخطة الأساسية في ورقة Physical-Chart Data نسبة 52.5% في 06-نوفمبر، وهي أعلى كثيراً من 45.89% المخططة حتى 09-نوفمبر في الورقة الرئيسية، كما تضع الفعلي في 09-نوفمبر (47.87%) على نقطة 06-نوفمبر. ووفق خط الأساس في هذا المنحنى يكون المشروع متأخراً عن الخطة.
- تترك الورقة الرئيسية التقدم الفعلي للأعمال الكهربائية وتنسيق المواقع وكاميرات المراقبة فارغاً، فاستُخدمت ساعات العمل في ورقة Progress. كما تُظهر قيم جدول الكميات لكاميرات المراقبة في المنطقتين A وG مبلغ 46,056 و2 ريال بدلاً من 6,513,996 و2,791,854.
- تاريخ بيانات تحديث P6 هو نفس تاريخ التقرير الأسبوعي (09-نوفمبر-2026)، وتطابق أعداد أنشطته ورقة Schedule (823 مكتمل و351 قيد التنفيذ و941 لم يبدأ)، لكن الورقة الرئيسية لا تزال تُظهر 144 قيد التنفيذ.
- يضع التقرير الأسبوعي تاريخ الخطة الأساسية لانتهاء التوريدات في 23-يناير-2027، بينما يحدده الجدول الأساسي المعتمد (المرفوع مع تقرير 19 أكتوبر) في 21-نوفمبر-2026.
- يُظهر جدول النطاق في صفحة الملخص 0 منفذاً لكل الشبكات، وتختلف إجمالياته عن ورقة Conclusion المخفية (مثلاً الطرق 15,234 م مقابل 18,252 م). والمناهل موسومة بالمتر في ورقة Major Quantities لكنها معدودة بالوحدة.
- تختلف أرقام التوريدات: أعمدة الإنارة 590 وحدة بنسبة 10% في ورقة Procurement، لكنها 592 وحدة وُرِّد منها 1 في Major Quantities؛ وتمديدات الجهد المنخفض 29,700 م مقابل 68,400 م. وتمديدات الجهد المتوسط "لم تُقدَّم" في التوريدات، بينما يذكر سجل المخاطر أنه تم شراؤها.
- عدد العمالة المخطط لنوفمبر 391 في الجدول الشهري (365 ميدانية و26 غير ميدانية)، لكنه 390 في لوحة العمالة (350 ميدانية و40 غير ميدانية). وارتفع العدد التراكمي لاجتماعات السلامة القصيرة من 43 إلى 58 رغم عقد اجتماع واحد فقط هذا الأسبوع.
- تُظهر عدة خلايا أخطاء #REF! (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز، وتقييمات المخاطر، وتقييم السلامة في تقييم الحالة). ويحمل خطر المحطة الفرعية قيمة 6,835,460.61 ريال، وهي قيمة تنسيق المواقع في جدول الكميات.
- لا تزال عدة أوراق (ترويسة الورقة الرئيسية وMajor Quantities وPhysical-Chart Data) تحمل تاريخ 19-أكتوبر-2026، وأصبحت ورقة Milestones تحمل 09-أكتوبر-2026، رغم أن تاريخ بيانات التقرير 09-نوفمبر-2026. ولم تتغير ورقة Procurement منذ 26 أكتوبر. رقم أسبوع التقرير هو أسبوع العقد الذي يذكره التقرير (44 من 78)؛ وعدد الأسابيع الكاملة منذ تسليم الموقع 43.
