استكمال شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة

Completion of Infrastructure Works, Second Industrial City in Makkah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	15-Feb-2026	14-Aug-2027

النطاق: أعمال الطرق، والعبارات الصندوقية، وقنوات الصرف المكشوفة والسدود، وإنارة الشوارع وتمديدات الجهد المنخفض، والمجاري الخرسانية عند تقاطعات الطرق. قيمة العقد 52,025,516 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 18 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ الإنجاز 81.3% مقابل 51.1% مخططاً، فالمشروع متقدم على الخطة بنسبة 30.2%. وحقق هذا الأسبوع 1.23% مقابل 1.13% مخططاً، أي أعلى قليلاً من الخطة الأسبوعية.

نسبة الإنجاز الفعلي
81.3% / 51.1% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.59 +30.2%

التقدم هذا الأسبوع
+1.23% / +1.13%
مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.10%

المدة المنقضية من العقد
46.6% · اليوم 254 من 545
▼ الانتهاء المتوقع 05-سبتمبر-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
57.3% · 29.8 مليون ريال
7 مستخلصات مدفوعة بالكامل، آخر فترة تنتهي في 26-سبتمبر-2026

المشروع متقدم كثيراً على الخطة، لكن الانتهاء المتوقع تأخر إلى 22 يوماً بعد تاريخ العقد.

يتوقع التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (UP 34، تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) كلاهما الانتهاء في 05-سبتمبر-2027، أي بعد 22 يوماً من تاريخ انتهاء العقد 14-أغسطس-2027، وبعد ستة أيام من توقع الأسبوع السابق. وانخفض الفائض الزمني الكلي من −14 إلى −19 يوماً. ويمر الفائض السالب الآن بقنوات الصرف المكشوفة، والأعمال الكهربائية لمنحدر الدخول 2، وأعمال الأسفلت والتشطيبات في وصلة الطريق الدائري الخامس، ثم الاختبار والتشغيل والإغلاق. ولا تزال الأعمال الإضافية في الطريق التجميعي 9 والطريق 52 مفتوحة.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026، مختومة بتواريخ من 22 إلى 25 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. لا تحمل الصور ختم GPS، وهي صغيرة في الملف المصدر (عرضها نحو 600 بكسل). اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال القطع، الطريق التجميعي 9

حفار يحمّل الصخور المقطوعة في الشاحنات. بدون ختم زمني.



طبقة الأساس الحصوية، طريق غير المسلمين

مدحلة وفرادة تعملان على امتداد الطريق. مختومة 24-أكتوبر-2026، 08:57.



تركيب البردورات، الطريق الشرياني 4

خط بردورات منفذ، مع خلاطات خرسانة في الموقع. مختومة 22-أكتوبر-2026، 10:44.




أعمال تكسية الحجر، جدار السد 1

تكسية حجرية منفذة على امتداد جدار السد. مختومة 25-أكتوبر-2026.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

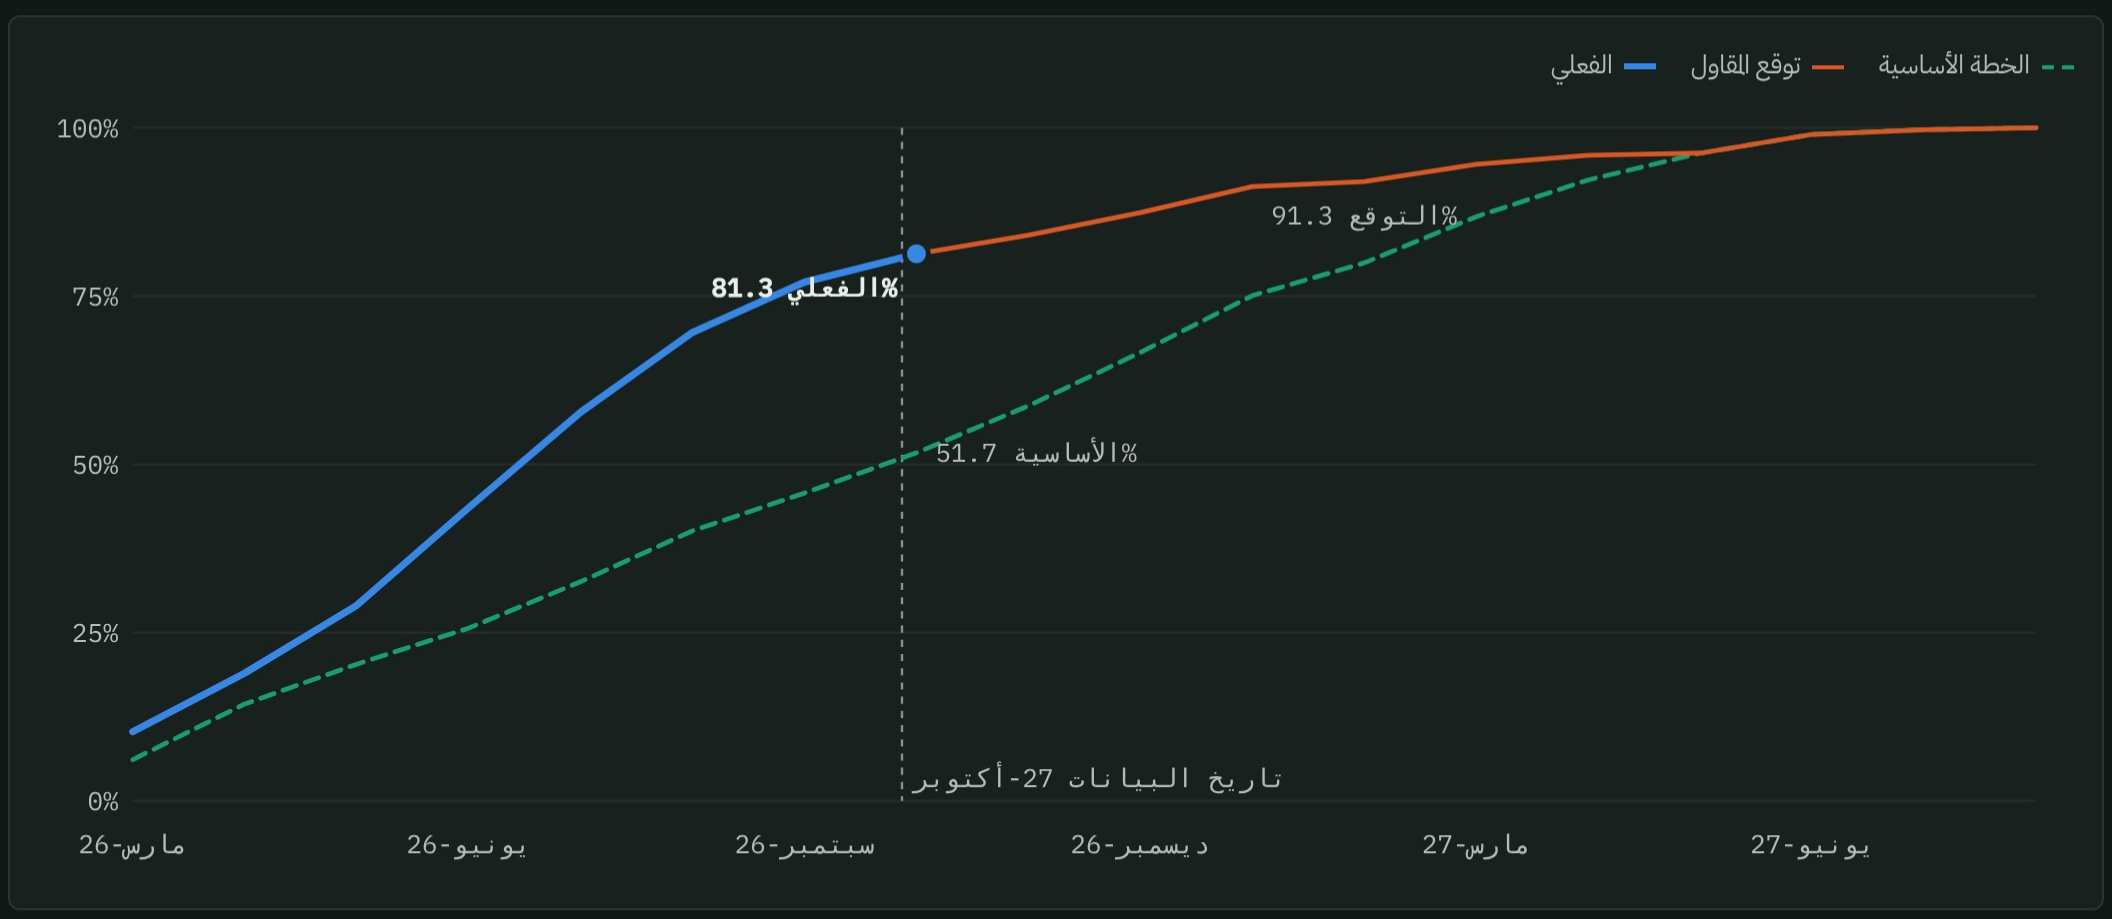

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026	48.66	79.31	+30.65	—	1.63
20-Oct-2026	49.99	80.05	+30.06	+0.74	1.60
27-Oct-2026	**51.12**	**81.28**	**+30.16**	**+1.23**	**1.59**

نسبة الإنجاز الفعلي محسوبة من مجاميع ساعات العمل في تقريري 20-أكتوبر-2026 و27-أكتوبر-2026، ويعطي تقرير 20 أكتوبر أيضاً القيم التراكمية حتى 13 أكتوبر. الخطة المعدلة في المصدر مطابقة للخطة الأساسية، لذا يعرض الخط البرتقالي توقع المقاول: الفعلي حتى سبتمبر، ثم التوقع ابتداءً من أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	12.0%	100.0%	92.8%	−7.2%	0.93	▼ متأخر
أعمال الطرق	24.0%	50.2%	64.6%	+14.4%	1.29	▲ متقدم
الأعمال الكهربائية	8.3%	28.6%	71.8%	+43.1%	2.51	▲ متقدم
أعمال الإزالة	1.3%	100.0%	67.6%	−32.4%	0.68	▼ متأخر
العبّارات الصندوقية	3.5%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
قنوات الصرف المكشوفة	37.6%	31.7%	96.2%	+64.5%	3.03	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	3.0%	0.0%	5.6%	+5.6%	–	▲ بدأ مبكراً
الإغلاق وتسريح الموارد	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**51.1%**	**81.3%**	**+30.2%**	**1.59**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 رقم 34 UP (تاريخ البيانات 27-أكتوبر-2026) 399 نشاطاً: 315 مكتملاً و30 قيد التنفيذ و54 لم تبدأ. وتاريخ الانتهاء المجدول 05-سبتمبر-2027، أي بعد 22 يوماً من تاريخ العقد. وعدد أنشطة المسار الحرج 42 (43 في الأسبوع السابق). وبدأ اختبار الشبكات الكهربائية في 20-أكتوبر-2026.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الكلية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة وبند رئيسي. إجماليات الشبكات من ورقة Progress Summary، وكميات البنود من ورقة Major Quantities في تقرير 27-أكتوبر-2026. «المنفذ هذا الأسبوع» هو الكمية المنفذة هذا الأسبوع مطروحاً منها كمية تقرير 20-أكتوبر-2026.

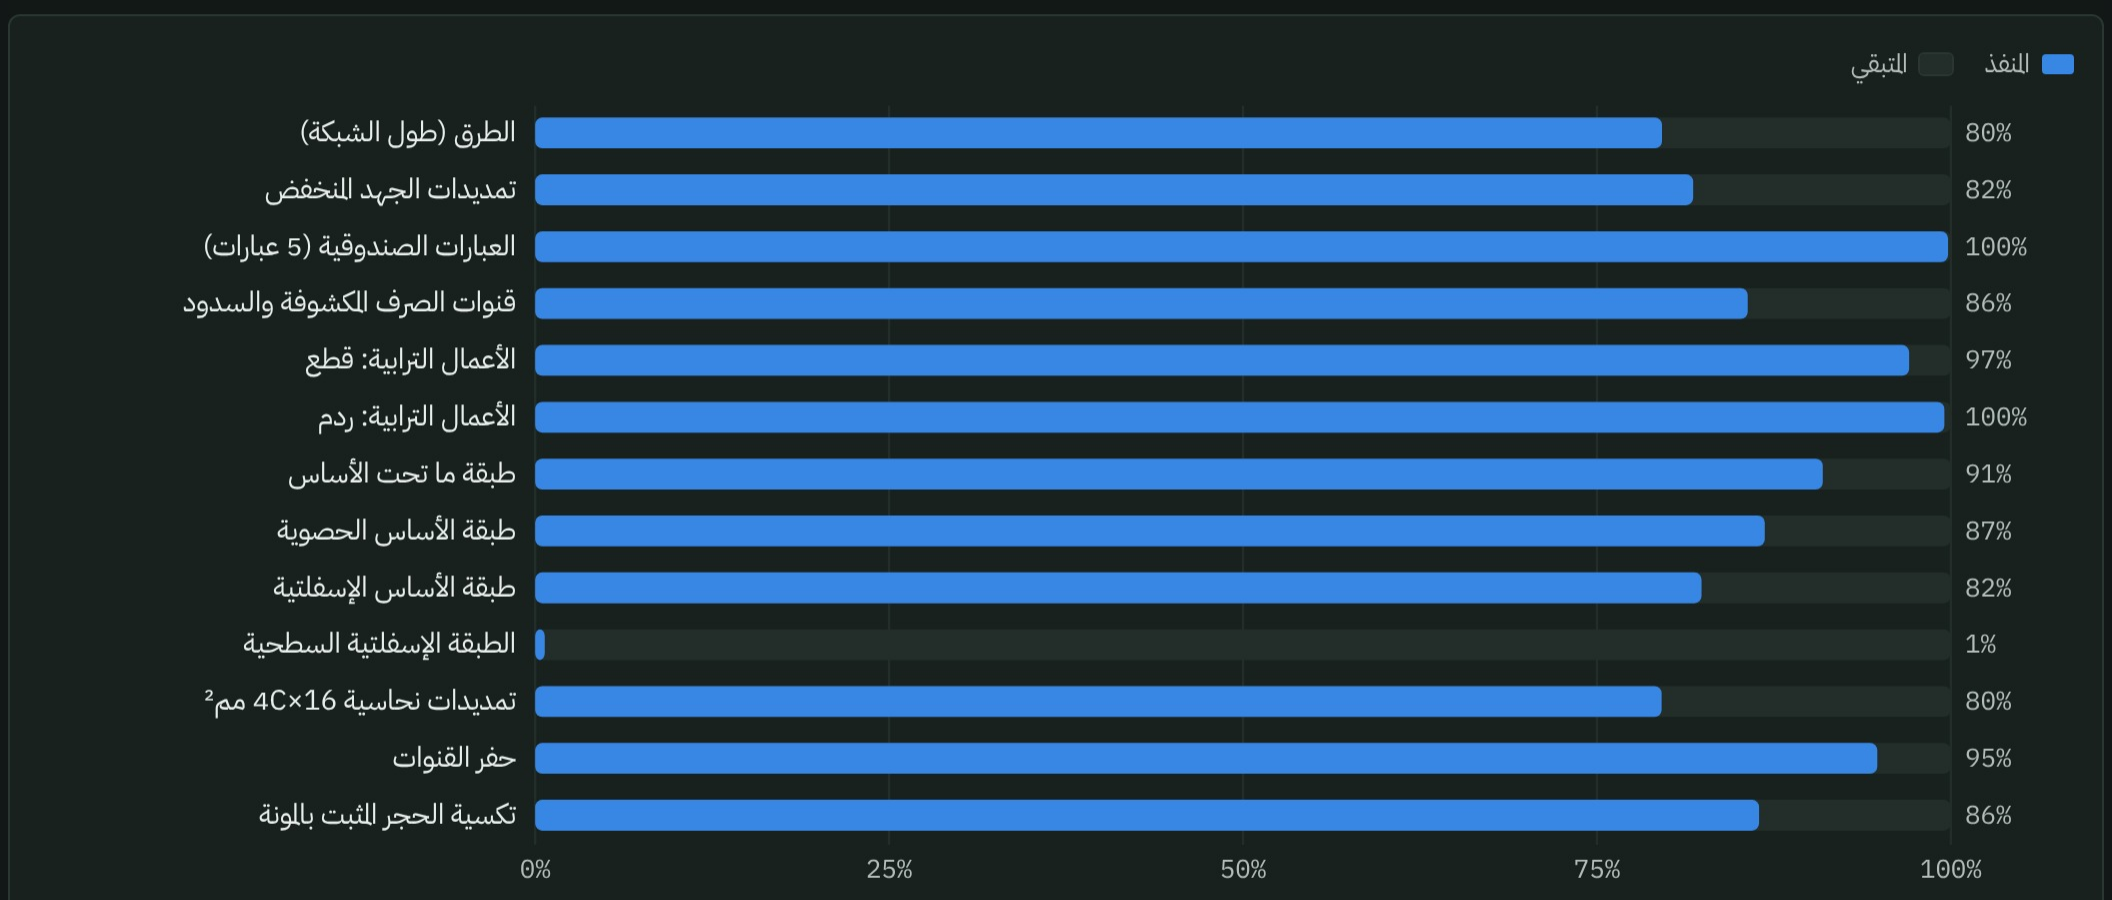

بند النطاق	المصدر	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
الطرق (طول الشبكة)	ملخص التقدم	م.ط	3,754	2,988	189+	766	79.6%
تمديدات الجهد المنخفض	ملخص التقدم	م.ط	8,464	6,923	0	1,541	81.8%
العبارات الصندوقية (5 عبارات)	ملخص التقدم	%	100	99.8	0	0.2	99.8%

بند النطاق	المصدر	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
قنوات الصرف المكشوفة والسدود	ملخص التقدم	م.ط	3,921	3,358	279.1+	562.6	85.6%
الأعمال الترابية: قطع	B1.31 22 00.01	م³	537,044	521,210	1,863+	15,834	97.1%
الأعمال الترابية: ردم	B1.31 22 00.02	م³	438,397	436,376	474.7+	2,020	99.5%
طبقة ما تحت الأساس	B1.31 22 00.03	م³	37,334	33,956	834.1+	3,378	91.0%
طبقة الأساس الحصوية	B1.32 11 23.01	م³	24,889	21,617	689.2+	3,272	86.9%
طبقة الأساس الإسفلتية	B1.32 11 26.01	م³	11,676	9,619	320.8+	2,056	82.4%
الطبقة الإسفلتية السطحية	B1.32 12 16.01	م³	5,253	35.6	0	5,218	0.7%
تمديدات نحاسية 4C×16 مم²	B2.26 05 19.01	م	8,007	6,371	0	1,636	79.6%
حفر القنوات	B6.31 22 00.04	م³	115,262	109,271	0	5,991	94.8%
تكسية الحجر المثبت بالمونة	B6.31 25 00.02	م²	49,594	42,875	3,018+	6,719	86.5%

العبارات الصندوقية والقنوات المكشوفة

اكتملت العبارات الصندوقية الخمس بنسبة 99.8%. وبلغت قنوات الصرف المكشوفة والسدود 85.7% من طولها (+279 م هذا الأسبوع)، وتكسية الحجر 86.5% بعد تنفيذ 3,018 م² هذا الأسبوع في القناة المكشوفة 3C وجدار السد 1.

لم تبدأ أو بالكاد بدأت

لا تزال الطبقة الإسفلتية السطحية عند 0.7% (35.6 من 5,253 م³)، ولم تتقدم تمديدات الجهد المنخفض النحاسية ولا حفر القنوات هذا الأسبوع. وتذكر ملفات الملخص أيضاً 471 م² من بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني 4، لكن التقرير لا يتضمن إجمالياً محدثاً للإنترلوك.

المعالم الرئيسية

التواريخ الأساسية والمتوقعة من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي، مع التوقع والفائض الزمني من تحديث P6 رقم UP 34.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	15-Feb-2026	15-Feb-2026	15-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد البرنامج الزمني الأساسي	14-Mar-2026	01-Mar-2026	01-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	14-Mar-2026	06-Jun-2026 (+84 يوماً)	06-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
التأهيل المسبق واعتماد المواد	14-Mar-2026	06-Jun-2026 (+84 يوماً)	06-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
توريد المواد طويلة الأجل	16-Aug-2026	29-Aug-2026 (+13 يوماً)	29-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
إنجاز أعمال الطرق	14-Dec-2026	18-Jan-2027 (+35 d)	18-Jan-2027	39	▼ بعد الموعد الأساسي
إنجاز قنوات الصرف المكشوفة	14-Jun-2027	06-Jul-2027 (+22 d)	06-Jul-2027	−3	▼ متأخر
إنجاز جميع الأعمال	14-Aug-2027	05-Sep-2027 (+22 d)	05-Sep-2027	−19	▼ متأخر
التسليم النهائي	14-Aug-2027	05-Sep-2027 (+22 d)	05-Sep-2027	−19	▼ متأخر

يتفق التقرير الأسبوعي وتحديث P6 على جميع التواريخ المتوقعة، وقد تأخرت المعالم الثلاثة المفتوحة جميعها هذا الأسبوع.

انتقل إنجاز جميع الأعمال والتسليم النهائي من 30-أغسطس إلى 05-سبتمبر-2027، أي بعد 22 يوماً تقويمياً من تاريخ العقد (فائض P6 −19 يوماً). وانتقلت أعمال الطرق من 11-يناير إلى 18-يناير-2027، أي بعد 35 يوماً من الموعد الأساسي، وقنوات الصرف المكشوفة من 29-يونيو إلى 06-يوليو-2027، وانخفض فائضها من 3 إلى −3 أيام.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المطلوبة التي تم توريدها لكل مادة. المصدر: سجل التوريدات (Procurement Log)، التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026.



دهانات الطرق: لا يوجد أمر شراء


المطلوب 5,712 م² والمورّد 0%، مع أن المادة كانت مطلوبة في الموقع منذ 17-مايو-2026.

توريد الأسفلت والبردورات مستمر

تم توريد 57% من طبقتي الأساس والسطح الإسفلتيتين (9,655 من 16,929 م³) و82% من البردورات مسبقة الصب (17,894 من 21,915 م). ويُظهر التقرير وجود 17 من 18 مادة مخططة في الموقع، وآخر مواد أعمال الطرق مستحقة بحلول 10-نوفمبر-2026.

القوى العاملة

متوسط عدد العاملين الشهري في الموقع، العمالة والموظفون معاً، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

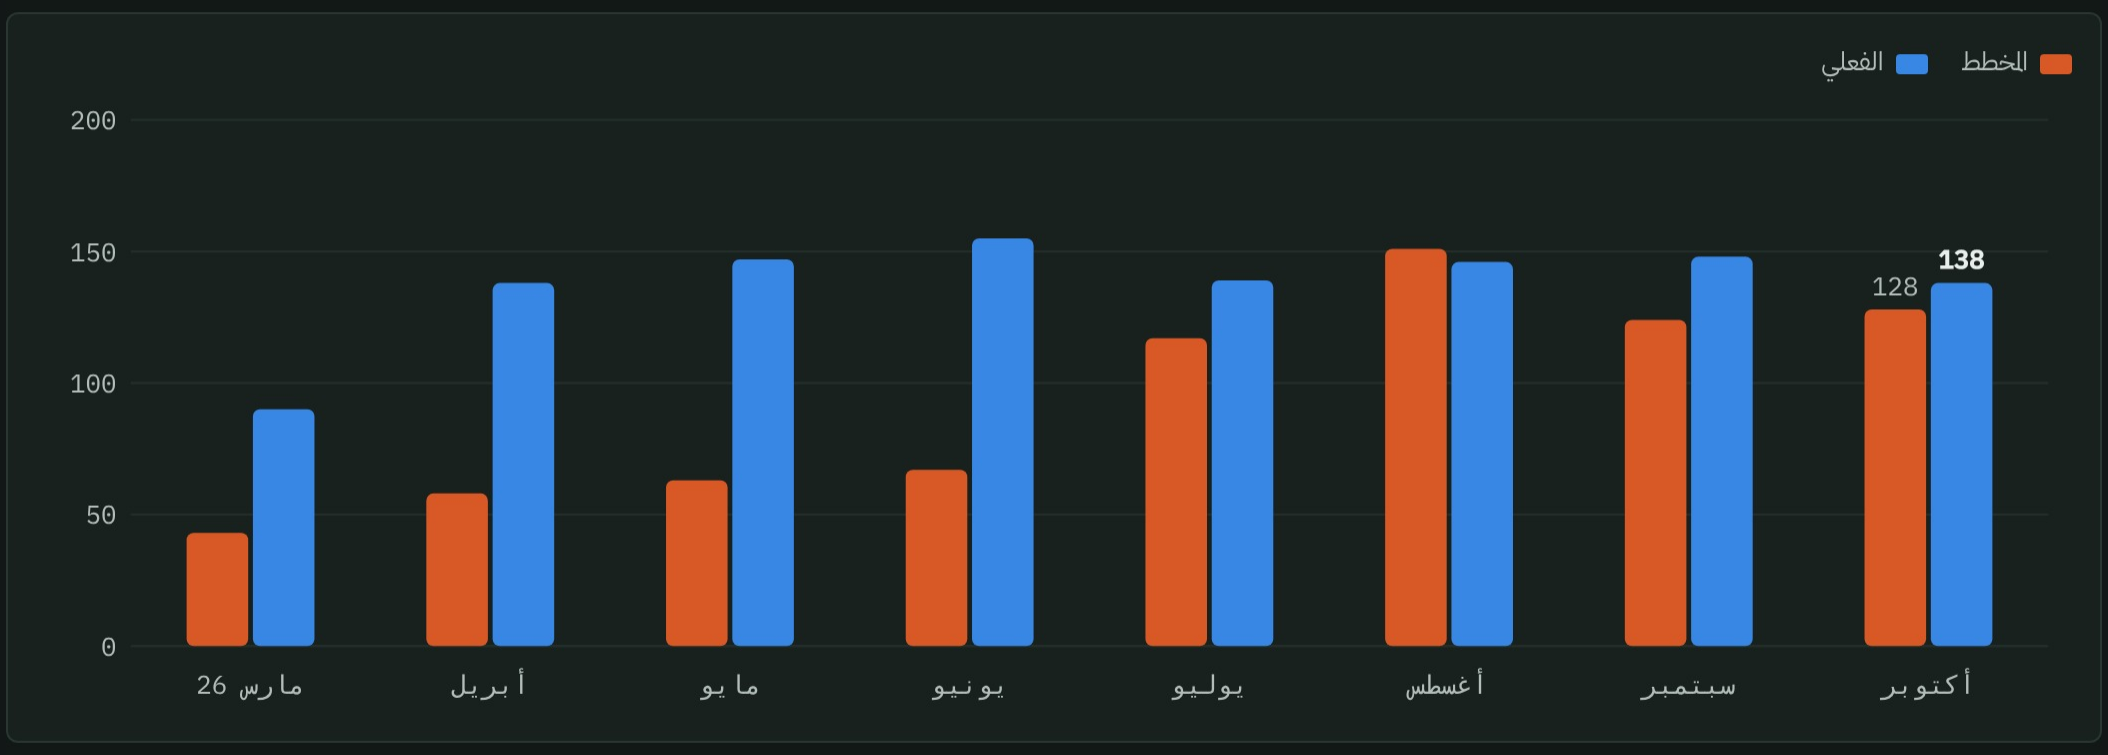

متوسط عدد العاملين في أكتوبر 138 مقابل 128 مخططاً: 113 عاملاً (116 مخططاً) و24.5 موظفاً (12 مخططاً). ومتوسط المعدات في الموقع 64 مقابل 49 مخططاً. وتبلغ خطة العمالة ذروتها 161 في يناير 2027.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	52,025,516
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	59,829,343
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	52,025,516
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	41,145,140

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	7
القيمة الإجمالية	29,797,667
الخصومات والغرامات	2,000
الصافي شاملاً الضريبة	34,269,317
المدفوع (7 مستخلصات)	34,269,317
معتمد بانتظار الصرف	0

بلغت المستخلصات 57.3% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 81.3%. وصُرف المستخلص 7 (من 24-أغسطس إلى 26-سبتمبر-2026) في 25-أكتوبر-2026، فلا يوجد مستخلص معلق. ولم يُقدَّم مستخلص جديد هذا الأسبوع، ولا توجد محتجزات أو دفعة مقدمة مسجلة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 87.5%

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	201,220
ساعات العمل هذا الأسبوع	4,560
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة (تراكمي)	1
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	12 / 52

تفتيش الاستشاري للصحة والسلامة، 27-أكتوبر-2026. متوسط التقييم حتى تاريخه 85.3%.

الجودة التقييم 90.1%

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	932 / 953
طلبات الفحص المعلقة	21
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	2 / 2
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	25 / 25
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	31 / 31
المخططات التنفيذية المعتمدة / المقدمة	36 / 36
اعتمادات المواد المعتمدة / المقدمة	63 / 65

تراكمي حتى 27-أكتوبر-2026. تقييم تفتيش الجودة من الاستشاري 90.12% هذا الأسبوع، والمتوسط حتى تاريخه 84.9%. وزادت طلبات الفحص 43 طلباً هذا الأسبوع.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
أعمال إضافية، الطريق التجميعي 9	المقاول / مدن	تغيير في النطاق بإضافة أعمال في الطريق التجميعي 9. مفتوح في سجل المخاطر، والتاريخ المستهدف 14-نوفمبر-2026.
الطريق الجديد 52	المقاول / مدن	تغيير في النطاق لإنشاء الطريق 52، بتصنيف مرتفع جداً (25 بعد المعالجة). مفتوح، والتاريخ المستهدف 28-ديسمبر-2026.
طريق الجلود الجديد	المقاول / مدن	مدرج ضمن تحديات المشروع في ملخص التقدم. يظهر مفتوحاً في سجل المخاطر ومغلقاً في ملف المخاطر، والتاريخ المستهدف 01-ديسمبر-2026.
قنوات الصرف المكشوفة والأعمال الكهربائية لمنحدر الدخول 2	المقاول	لكل منهما الآن فائض −19 يوماً في تحديث P6 رقم UP 34، وهما مع أعمال الإغلاق يحددان تاريخ انتهاء المشروع. وانتقل معلم قنوات الصرف المكشوفة إلى 06-يوليو-2027، أي بعد 22 يوماً من الموعد الأساسي.
الوصلة إلى الطريق الدائري الخامس	المقاول	بدأت أعمال الأسفلت في 08-أكتوبر-2026 ونسبة إنجازها الفعلي 35.0% بساعات العمل (3,792 من 10,830)، ولها مع أعمال التشطيب فائض −18 يوماً.

سجل المشكلات وجدول أهم خمس مشكلات في التقرير الأسبوعي فارغان هذا الأسبوع، وملف المخاطر (الملف 17) لم يتغير عن الأسبوع السابق. وبقية بنود السجل (تصميم القناة المكشوفة 3A، والعبارة 3، وتصاريح موسم الحج) مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- يعرض ملفا الملخص (15 و16) نسبة تقدم محسوبة على أساس التكلفة بوصفها «الفعلي»، ويعطيان نسبة مخططة على الأساس نفسه. يستخدم هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي المقاسة بساعات العمل فقط.
- يعطي الملفان 15 و16 تغير التقدم لهذا الأسبوع بإشارتين متعاكستين (سالبة في الملف 15 وموجبة في الملف 16).
- يذكر الملف 15 مدير المشروع باسم عبد الله الجليفي والملف 16 باسم عبد الله الشنيفي. كما يعطي الملف 16 بداية المشروع 24-نوفمبر-2025 ونهاية العقد 23-مايو-2026، بينما تذكر بقية الملفات تسليم الموقع 15-فبراير-2026 والانتهاء 14-أغسطس-2027.
- تختلف كميات هذا الأسبوع في ملفي الملخص (15 و16) عن التغير في ورقة Major Quantities للردم (972 م³ مقابل +474.7 م³) ولطبقة الأساس الحصوية (595 م³ مقابل +689.2 م³)، كما لا يذكر الملخصان +320.8 م³ من طبقة الأساس الإسفلتية. ويعتمد التقرير التغير في ورقة Major Quantities. ولا يظهر في الجدول الأسبوعي منجز لأسبوع 13-أكتوبر-2026 لعدم استخدام التقارير الأقدم.
- الخطة المعدلة في ورقة Physical-Chart Data مطابقة للخطة الأساسية.
- تحتوي ورقة Major Quantities على مجموعة قديمة من البنود بقيم صفرية (طبقة ما تحت الأساس 21,604 م³، طبقة الأساس 14,403 م³، البردورات 23,250 «م³»، تمديدات 15 ك.ف 5,632 «م²»، المحطة الفرعية، وحدة RMU، أعمدة إنارة 7 م وغيرها) بجانب البنود الحالية ذات التقدم. استُخدمت البنود الحالية فقط.
- تمديدات الجهد المنخفض: تعطي ورقة Major Quantities 6,371 من 8,007 م منفذة، بينما يعطي ملخص التقدم 6,923 من 8,463.65 م.
- عدد وحدات الإنارة 264 في ورقة Procurement و247 في ملخص التقدم، ووحدات التأريض 17 و15. ونسبة إنجاز التوريدات 92.8% بساعات العمل رغم الإفادة بوجود 17 من 18 مادة في الموقع.
- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة رغم تسجيل 7، وقيمة مقدمة (34,267,317) أقل بـ 2,000 ريال من القيمة المعتمدة والمدفوعة (34,269,317). كما تحتوي خانتا قيمة العقد المعدلة والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز على 21,100,000 و20,900,000 بجانب 52,025,516.
- تؤرخ ورقة General Information اعتماد البرنامج الأساسي في 01-مارس-2025، أي قبل ترسية العقد، بينما تعطي ورقة المعالم وP6 التاريخ 01-مارس-2026. ويسرد ملخص طلبات الفحص للفترة 21–27 أكتوبر طلبات مؤرخة من 17 إلى 20 أكتوبر 2026، أي قبل الفترة، ولا يزال يصف الإجمالي السابق بأنه «حتى 29-09-2026».
- عدد العمالة في أكتوبر 113.25 (116 مخططاً) في ورقة Manpower، بينما يُظهر توزيع المهن في ورقة Weekly Progress Report 105 مخططاً و108 فعلياً.
- تُظهر لوحة المخاطر (الملف 17) 240 خطراً مفتوحاً و133 مشكلة مفتوحة لكن الصفر في كل فئة، ويسرد السجل 8 مخاطر منها 3 مفتوحة. والعبارة 4 وطريق الجلود مفتوحان في سجل مخاطر التقرير الأسبوعي ومغلقان في الملف 17.
- جدول معالم P6 داخل ورقة Milestones (مثل التجهيز 02-أبريل-2026) غير محدث؛ أُخذت توقعات المعالم والفائض من ملف P6 رقم UP 34.
- يقيس التقرير الأسبوعي التأخير بـ 22 يوماً تقويمياً، بينما يعطي P6 فائضاً –19 يوماً. وتُظهر ورقة Testing أن اختبار الشبكات الكهربائية بدأ في 20-أكتوبر-2026 (20%)، بينما كان البدء المخطط في 08-مايو-2027.
