إستكمال شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة

Completion of the Infrastructure Development of the First Phase, Third Industrial City, Jeddah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	تاريخ الانتهاء المعدل
مدن	شركة الرواف للمقاولات	إيجيس (Egis)	شعيب الشعيبي	29-Jul-2024	26-Sep-2026

النطاق: شبكات الصرف الصحي وتصريف السيول (مع البحيرات والقنوات المفتوحة) والري ومياه الشرب، وتمديدات جهد 13.8 ك.ف، وإنارة الطرق، وتمديدات الاتصالات، والطرق الداخلية والخارجية بالأسفلت والأرصفة.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. في 18-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 98.96% مقابل 99.93% مخططاً، أي أن المشروع متأخر بنسبة 0.97% (مؤشر الأداء الزمني 0.99). ولم يُنجز هذا الأسبوع سوى 0.05% (25 من 48,045 ساعة عمل، في المناطق Z05 وZ09 وZ10). وقد انقضى تاريخ الانتهاء المعدل 26-سبتمبر-2026.


نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
99.0% / 99.9% مخطط	**+0.05**% / 0.00% مخطط	**103%** · اليوم 811 من 789	**78.3%** · 250.2 مليون ريال
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.99 −0.97%	25 ساعة عمل مكتسبة، ولا يتبقى في الخطة تقدم مخطط لهذا الأسبوع	▼ انتهاء P6: 08-ديسمبر-2026	24 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 31-أغسطس-2026

انقضى تاريخ الانتهاء المعدل، والتوقعات تُنهي المشروع متأخراً بين 50 و73 يوماً.

مُدّد تاريخ انتهاء العقد شهرين إلى 26-سبتمبر-2026 (أمر التغيير 2، المعتمد في 29-يونيو-2026). ويتوقع التقرير الأسبوعي الآن الانتهاء في 15-نوفمبر-2026، أي بتأخير 50 يوماً. أما مستخرج P6 في الملف نفسه فيُنهي المشروع في 08-ديسمبر-2026 بفائض زمني كلي −73 يوماً، وكان المستخرج السابق ينتهي في 01-ديسمبر-2026 بفائض −66 يوماً. وتتركز الأعمال المتبقية في الطرق الرئيسية (MR) والمناطق Z02 وZ04 وZ05 وZ08 وبنود النطاق الجديد والإغلاق، ويُظهر سجل الاختبار والتشغيل 0% لجميع الأنظمة.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، ونقطة 18-أكتوبر-2026 من ورقة Progress.

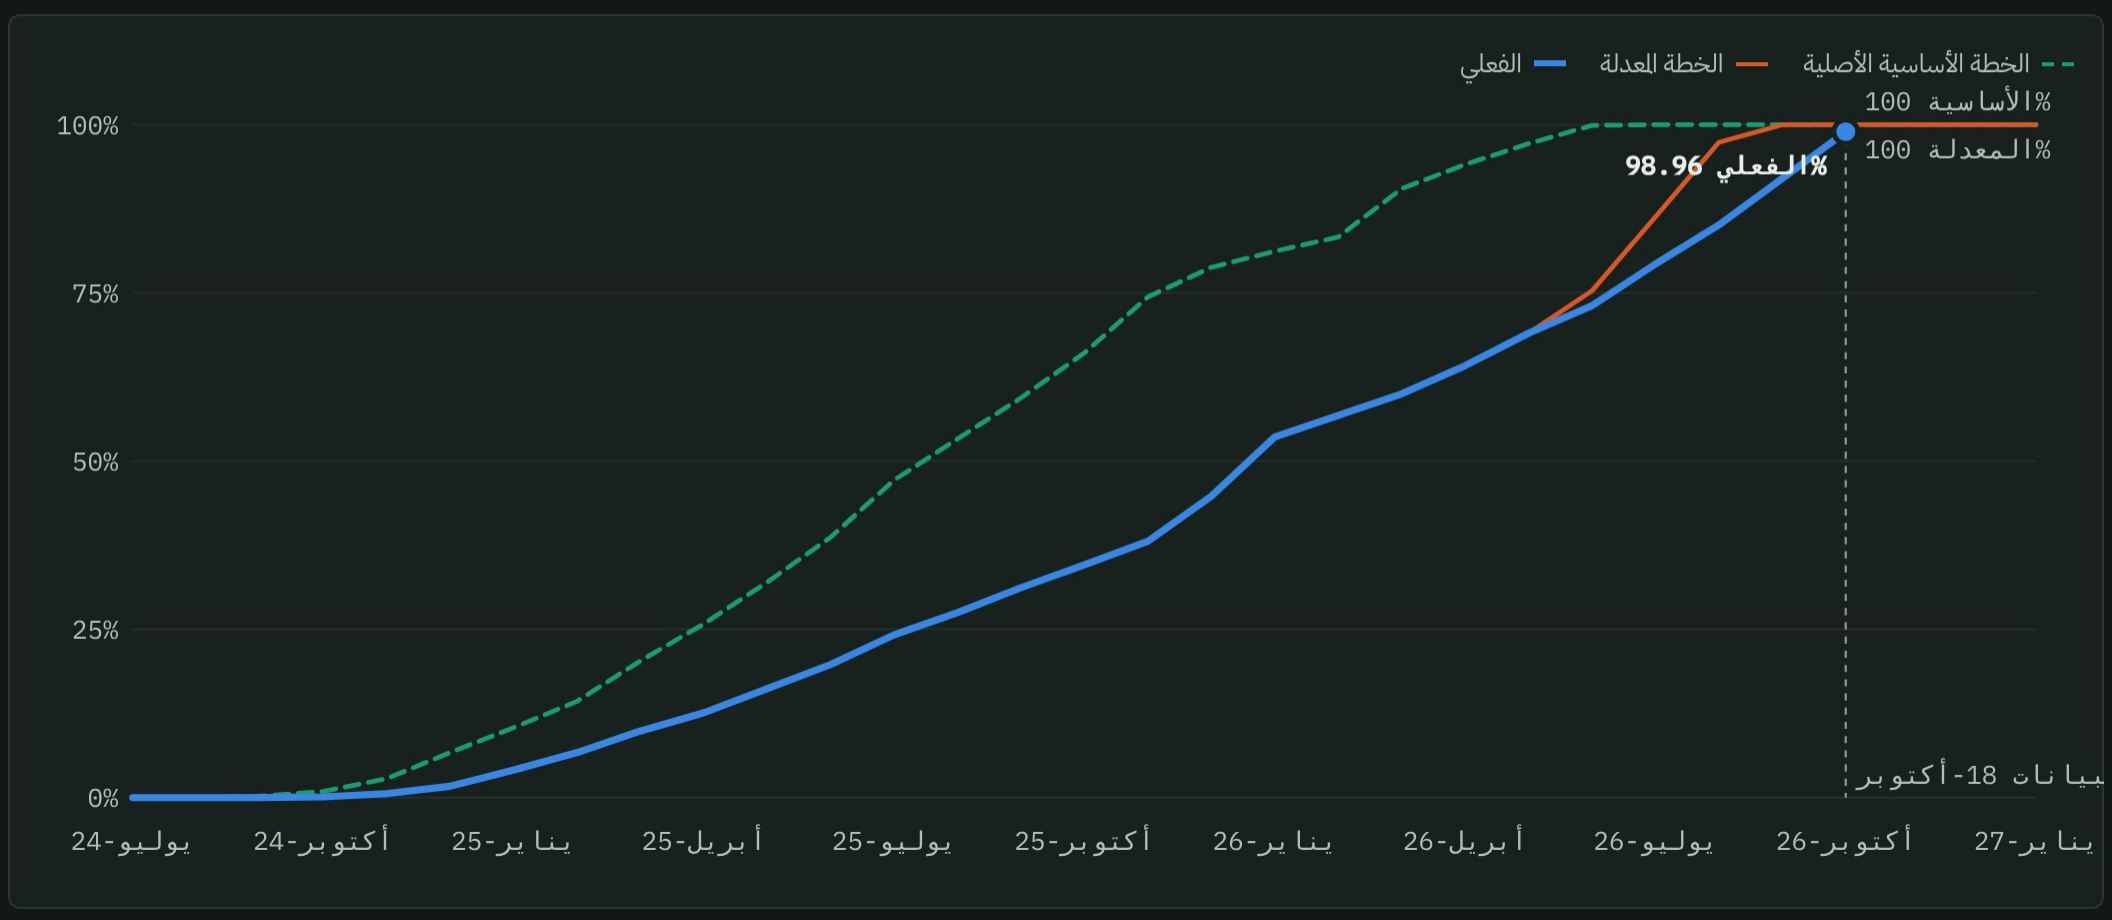

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
مستخرج P6 السابق	99.93	98.91	-1.02	–	0.99
18-Oct-2026	**99.93**	**98.96**	**-0.97**	**+0.05**	**0.99**

استُخدم تقرير 18-أكتوبر-2026 فقط. الصف الأول هو مستخرج P6 السابق المحفوظ في الملف نفسه (47,522 من 48,045 ساعة عمل مكتسبة)، ولا يذكر الملف تاريخه. ولا تُعرض الأسابيع السابقة. وتُظهر ورقة Physical-Chart Data إنجازاً فعلياً 100% في نهاية سبتمبر، وهو ما تناقضه ورقة Progress، لذا حُذفت تلك النقطة.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب حزم أعمال التنفيذ، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (48,045 ساعة إجمالاً). لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات والإغلاق ساعات عمل، لذا لا توجد لها نسبة إنجاز فعلي.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
MR	36.5%	99.9%	99.4%	-0.6	0.99	▼ متأخر
البحيرات والقنوات العشبية	7.7%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z05	7.7%	100.0%	93.7%	-6.3	0.94	▼ متأخر
Z02-2	6.4%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z06	6.3%	100.0%	99.6%	-0.4	1.00	▼ متأخر
Z01	5.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z02-1	5.6%	99.4%	100.0%	+0.6	1.01	✓ مكتمل
Z07	5.6%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z07-1	4.3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z10	3.2%	100.0%	99.0%	-1.0	0.99	▼ متأخر
الأعمدة العالية (High Mast)	2.5%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z09	1.8%	99.8%	99.2%	-0.6	0.99	▼ متأخر
النطاق الجديد	1.3%	100.0%	96.4%	-3.6	0.96	▼ متأخر
Z13	1.1%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z02	1.0%	100.0%	94.4%	-5.6	0.94	▼ متأخر
Z03	0.8%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
Z08	0.7%	100.0%	87.3%	-12.7	0.87	▼ متأخر
Z04	0.7%	100.0%	92.0%	-8.0	0.92	▼ متأخر
Z11	0.7%	100.0%	99.7%	-0.3	1.00	▼ متأخر
ELDREES	0.3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
CCTV	0.0%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
الإجمالي	100%	**99.93%**	**98.96%**	**-0.97**	**0.99**	▼ متأخر

تحصي إحصاءات جدول P6 (تاريخ البيانات 18-أكتوبر-2026) عدد 9,236 نشاطاً: 9,020 مكتملاً و86 قيد التنفيذ و130 لم يبدأ، منها 44 نشاطاً متأخراً. ويُنهي مستخرج P6 المشروع في 08-ديسمبر-2026 بفائض زمني كلي −73 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

كمية جدول الكميات المعدل والكمية المركّبة لكل شبكة، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 18-أكتوبر-2026. لا تتضمن الورقة عمود الأسبوع السابق، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز "–". وجميع البنود المدرجة مُبلغ عنها بأنها مركّبة بنسبة 100%.

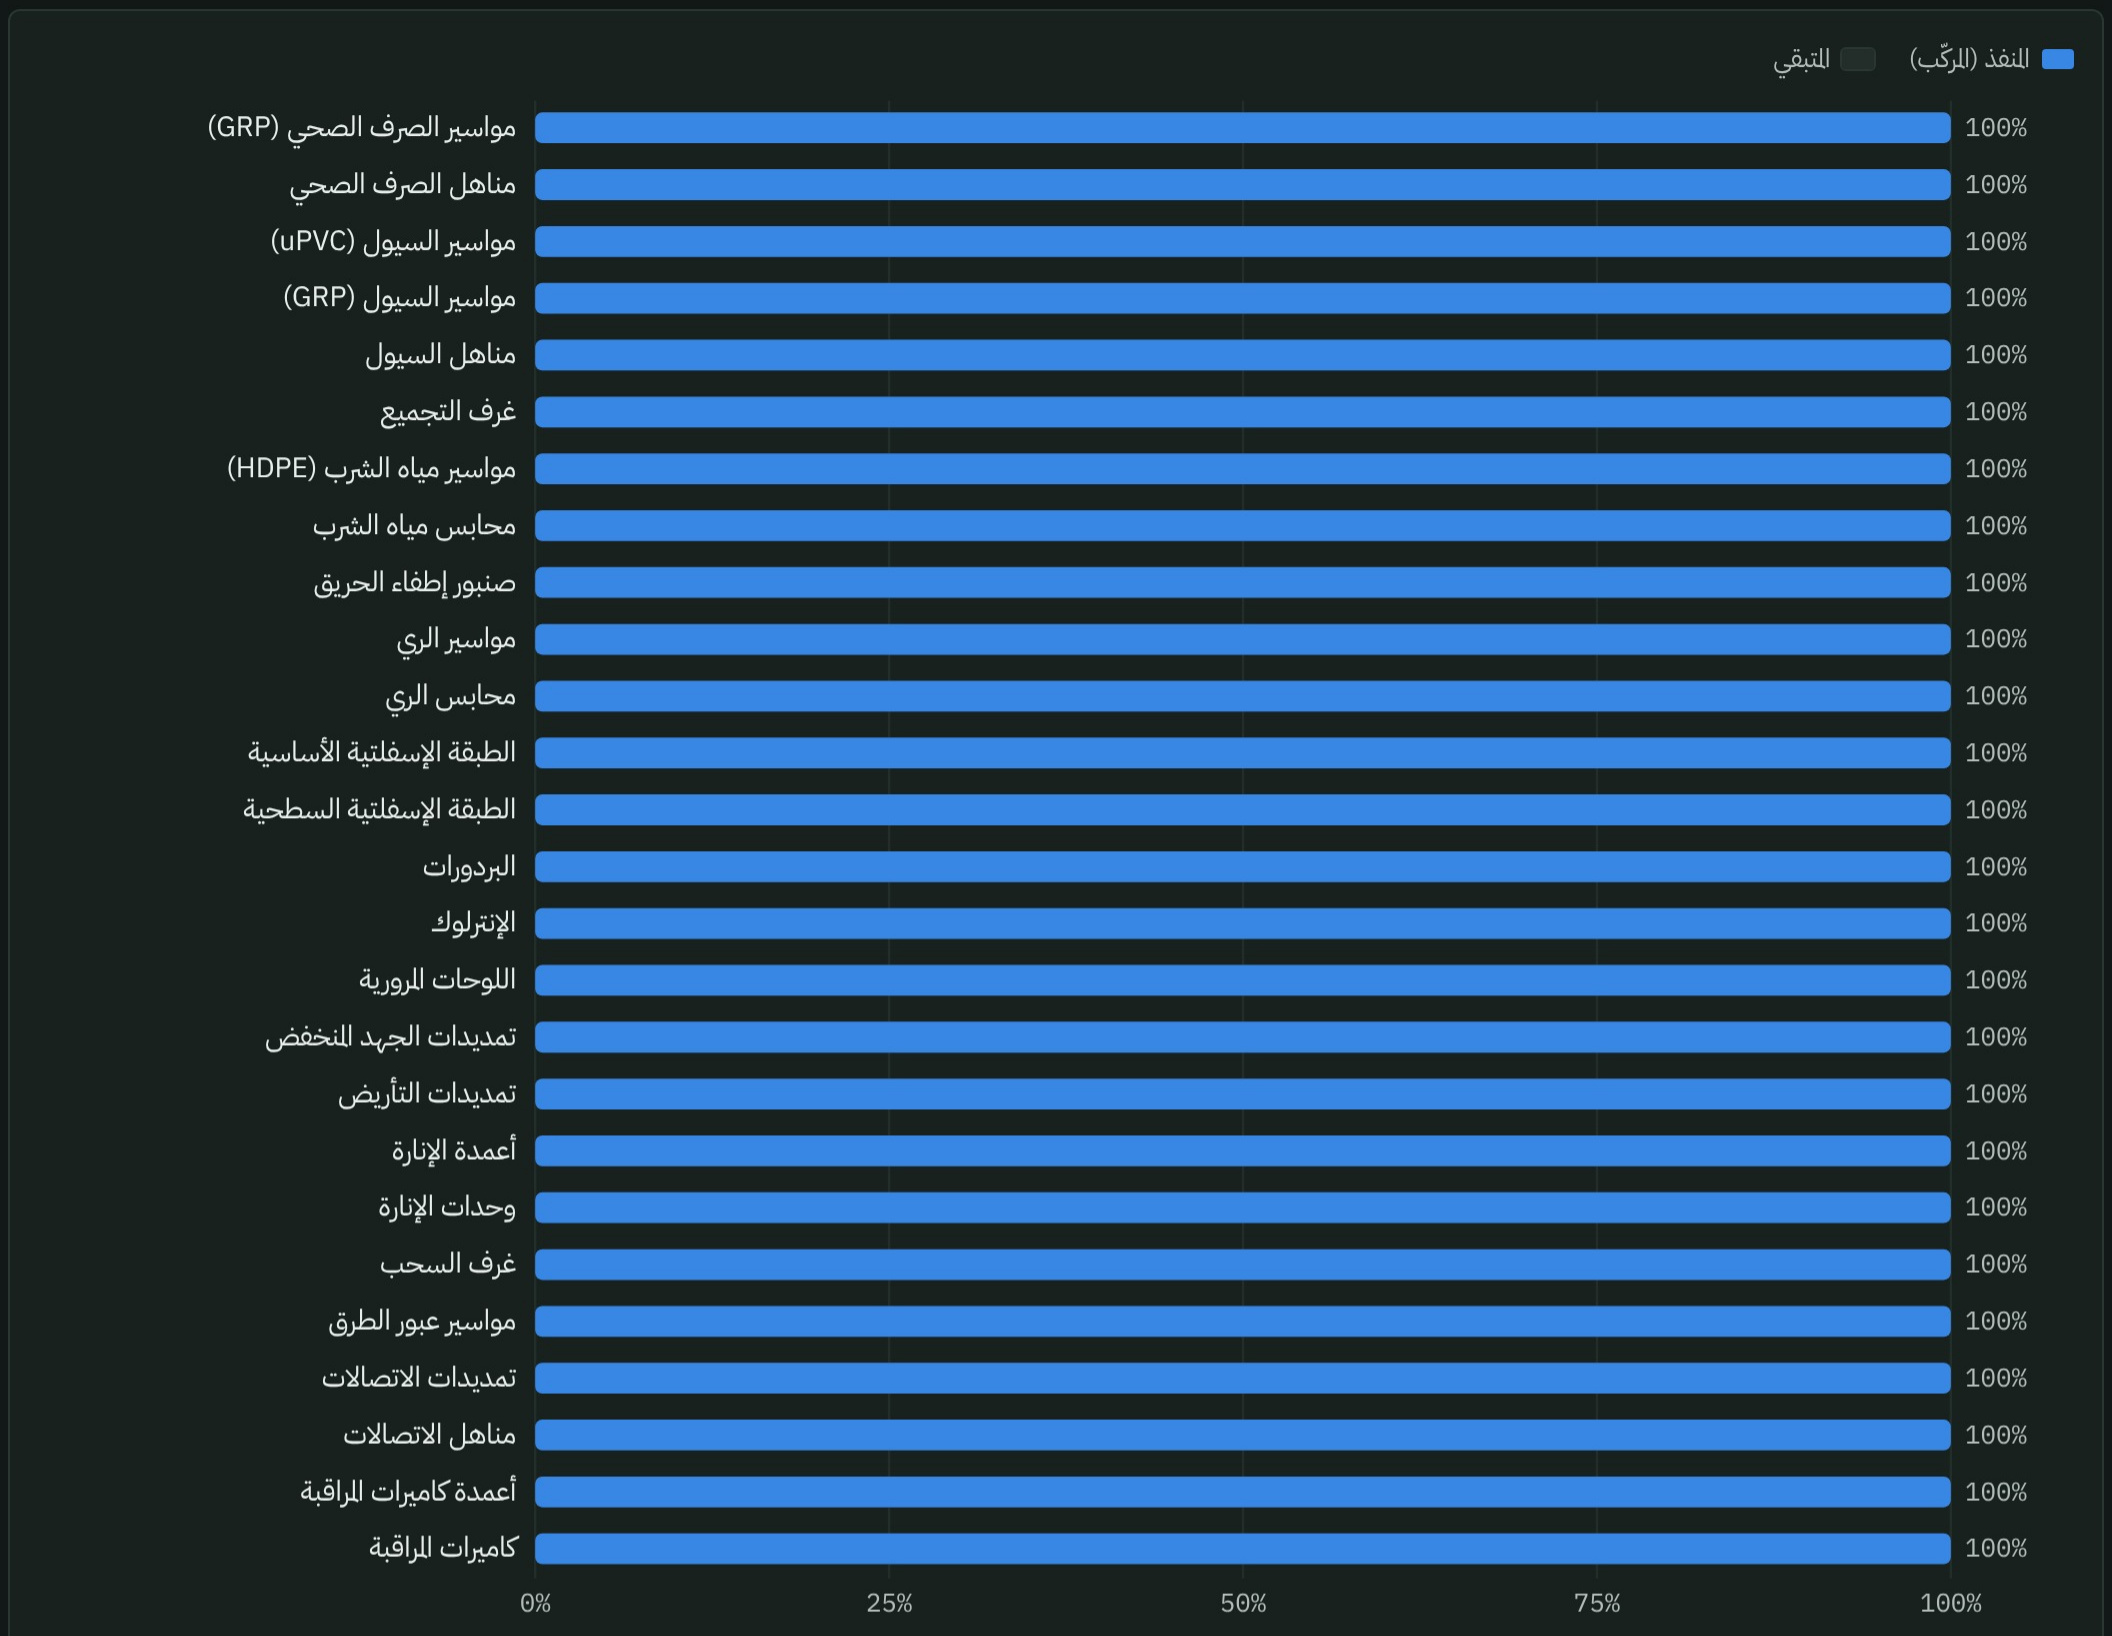

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مواسير الصرف الصحي (GRP)	DN 200	م.ط	21,379	21,379	–	0	100.0%	–
	DN 250	م.ط	4,579	4,579	–	0	100.0%	–
	DN 300	م.ط	204.6	204.6	–	0	100.0%	–
	DN 400	م.ط	531.9	531.9	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**26,695**	**26,695**	**–**	**0**	**100.0%**	–
مناهل الصرف الصحي	جميع المقاسات	عدد	355	355	–	0	100.0%	–
مواسير السيول (uPVC)	DN 300	م.ط	29,080	29,080	–	0	100.0%	–
مواسير السيول (GRP)	DN 400	م.ط	11,758	11,758	–	0	100.0%	–
	DN 500	م.ط	4,240	4,240	–	0	100.0%	–
	DN 600	م.ط	5,966	5,966	–	0	100.0%	–
	DN 700	م.ط	5,347	5,347	–	0	100.0%	–
	DN 800	م.ط	6,312	6,312	–	0	100.0%	–

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
	DN 900	م.ط	7,736	7,736	–	0	100.0%	–
	DN 1000	م.ط	2,856	2,856	–	0	100.0%	–
	DN 1100	م.ط	1,771	1,771	–	0	100.0%	–
	DN 1200	م.ط	8,972	8,972	–	0	100.0%	–
	DN 1400	م.ط	425.4	425.4	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**55,383**	**55,383**	**–**	**0**	**100.0%**	–
مناهل السيول	DN 1200	عدد	203	203	–	0	100.0%	–
	DN 1500	عدد	418	418	–	0	100.0%	–
	DN 2000	عدد	219	219	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**840**	**840**	**–**	**0**	**100.0%**	–
غرف التجميع	مفردة	عدد	1,007	1,007	–	0	100.0%	–
	مزدوجة	عدد	761	761	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**1,768**	**1,768**	**–**	**0**	**100.0%**	–
مواسير مياه الشرب (HDPE)	DN 160	م.ط	8,045	8,045	–	0	100.0%	–
	DN 225	م.ط	2,000	2,000	–	0	100.0%	–
	DN 315	م.ط	215	215	–	0	100.0%	–
	DN 450	م.ط	1,890	1,890	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**12,150**	**12,150**	**–**	**0**	**100.0%**	–
محابس مياه الشرب	محابس بوابية	عدد	77	77	–	0	100.0%	–
	محابس فراشة	عدد	2	2	–	0	100.0%	–
	محابس غسيل	عدد	3	3	–	0	100.0%	–
	محابس هواء	عدد	1	1	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**83**	**83**	**–**	**0**	**100.0%**	–
صنبور إطفاء الحريق	ULFM 150	عدد	193	193	–	0	100.0%	–
مواسير الري	HDPE DN 125	م.ط	24,479	24,479	–	0	100.0%	–
	HDPE DN 250	م.ط	28,362	28,362	–	0	100.0%	–
	HDPE DN 315	م.ط	7,061	7,061	–	0	100.0%	–
	HDPE DN 450	م.ط	8,870	8,870	–	0	100.0%	–
	HDPE DN 630	م.ط	2,221	2,221	–	0	100.0%	–
	GRP DN 800	م.ط	1,340	1,340	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**72,333**	**72,333**	**–**	**0**	**100.0%**	–
محابس الري	محابس بوابية	عدد	455	455	–	0	100.0%	–
	محابس فراشة	عدد	61	61	–	0	100.0%	–
	محابس غسيل	عدد	29	29	–	0	100.0%	–
	محابس هواء	عدد	44	44	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**589**	**589**	**–**	**0**	**100.0%**	–
الطبقة الإسفلتية الأساسية	تدرج I	م³	1,735	1,735	–	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية السطحية	تدرج I	م³	1,240	1,240	–	0	100.0%	–

بند النطاق	المقاس / النوع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
البردورات	نوع K1-D	م.ط	15,100	15,100	–	0	100.0%	–
	نوع L1	م.ط	1,972	1,972	–	0	100.0%	–
	منخفضة K2	م.ط	750	750	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**17,822**	**17,822**	**–**	**0**	**100.0%**	–
الإنترلوك	الكل	م²	1,576	1,576	–	0	100.0%	–
اللوحات المرورية	قائم مفرد	عدد	31	31	–	0	100.0%	–
	قائم مزدوج	عدد	4	4	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**35**	**35**	**–**	**0**	**100.0%**	–
تمديدات الجهد المنخفض	4C×6 mm²	م.ط	1,826	1,826	–	0	100.0%	–
	4C×10 mm²	م.ط	2,092	2,092	–	0	100.0%	–
	4C×16 mm²	م.ط	896	896	–	0	100.0%	–
	4C×25 mm²	م.ط	7,396	7,396	–	0	100.0%	–
	4C×35 mm²	م.ط	11,757	11,757	–	0	100.0%	–
	4C×50 mm²	م.ط	120	120	–	0	100.0%	–
	4C×150 mm²	م.ط	1,500	1,500	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**25,587**	**25,587**	**–**	**0**	**100.0%**	–
تمديدات التأريض	6 mm²	م.ط	4,208	4,208	–	0	100.0%	–
	16 mm²	م.ط	20,049	20,049	–	0	100.0%	–
	70 mm²	م.ط	2,700	2,700	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	م.ط	**26,957**	**26,957**	**–**	**0**	**100.0%**	–
أعمدة الإنارة	12 م، ذراعان	عدد	10	10	–	0	100.0%	–
	12 م، ذراع واحد	عدد	220	220	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**230**	**230**	**–**	**0**	**100.0%**	–
وحدات الإنارة	LED 150 W	عدد	240	240	–	0	100.0%	–
	LED 342 W	عدد	88	88	–	0	100.0%	–
	LED 208 W	عدد	102	102	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**430**	**430**	**–**	**0**	**100.0%**	–
غرف السحب	600×600	عدد	783	783	–	0	100.0%	–
	900×900	عدد	151	151	–	0	100.0%	–
	1800×900	عدد	18	18	–	0	100.0%	–
	الإجمالي	عدد	**952**	**952**	**–**	**0**	**100.0%**	–
مواسير عبور الطرق	UPVC 160 مم	م.ط	1,116	1,116	–	0	100.0%	–
تمديدات الاتصالات	6 مسارات، 50 مم	م.ط	8,100	8,100	–	0	100.0%	–
مناهل الاتصالات	نوع 1	عدد	90	90	–	0	100.0%	–
أعمدة كاميرات المراقبة	الكل	عدد	18	18	–	0	100.0%	–
كاميرات المراقبة	الكل	عدد	82	82	–	0	100.0%	–

الكميات المعدلة لأعمال الطرق أقل بكثير من جدول الكميات الأصلي

يجعل جدول الكميات المعدل، الذي لا يزال "قيد المراجعة"، كل إجمالي مساوياً للكمية المركّبة. وفي أعمال الطرق يمثل جزءاً صغيراً من جدول الكميات الأصلي: الطبقة الإسفلتية السطحية 1,240 من 63,689 م³، والبردورات مسبقة الصب K1-D بطول 15,100 من 187,209 م، والبردورات L1 بطول 1,972 من 123,805 م، والإنترلوك 1,576 من 59,537 م².

أعمال الجهد المتوسط عُدّلت إلى صفر

تمديدات جهد 13.8 ك.ف (30,720 م في جدول الكميات الأصلي) ووصلاتها ونهاياتها، ومجاري التمديدات بطول 950 م، ووحدات RMU للفتح العادي، والمحطات الفرعية الثلاث للإنارة ووحداتها، جميعها كميتها المعدلة 0، لذا لم تُدرج في الجدول.

المعالم الرئيسية

تواريخ المعالم من ورقة Milestones وتواريخ الانتهاء من مستخرج P6 في ورقة Progress. ويعطي المصدران توقعين مختلفين للانتهاء، لذا يُعرض كلاهما.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	29-Jul-2024	29-Jul-2024 (فعلي)	–	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	03-Sep-2024	26-Oct-2024 (فعلي)	–	–	✓ منجز
مسح الوضع القائم والتقارير النهائية	07-Sep-2025	23-Jul-2025 (فعلي)	–	–	✓ منجز
اكتمال الأعمال الميكانيكية	01-Oct-2025	27-Jun-2026	–	–	؟ لم يُحدَّث
اكتمال تركيب الهياكل المعدنية	02-Jul-2026	25-Feb-2026	–	–	؟ لم يُحدَّث
اكتمال الأعمال الترابية	07-Jul-2026	02-Jul-2026	–	–	؟ لم يُحدَّث
اكتمال جميع الأعمال المدنية	07-Jul-2026	02-Jul-2026	–	–	؟ لم يُحدَّث
اكتمال إخلاء الموقع	23-Jul-2026	20-Jul-2026	–	–	؟ لم يُحدَّث
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	28-Jul-2026	28-Jul-2026	–	–	؟ لم يُحدَّث
التنفيذ (P6)	26-Sep-2026	–	10-Nov-2026	−45	▼ متأخر
الإغلاق (P6)	26-Sep-2026	–	08-Dec-2026	−63	▼ متأخر
انتهاء المشروع	26-Sep-2026 (الأصلي 28-يوليو-2026)	15-Nov-2026 (+50 يوماً)	08-Dec-2026	−73	▼ متأخر

يفصل بين توقعي الانتهاء 23 يوماً، ولم تُحدَّث المعالم المرحلية.

يتوقع التقرير الأسبوعي الانتهاء في 15-نوفمبر-2026، بينما ينتهي مستخرج P6 في الملف نفسه في 08-ديسمبر-2026. ولا تزال ستة معالم مرحلية تحمل تواريخ متوقعة بين فبراير ويوليو 2026 انقضت دون تسجيل تواريخ فعلية. والتاريخ الأساسي لانتهاء المشروع هو التاريخ المعدل بعد التمديد لمدة شهرين (أمر التغيير 2).

توريد المواد الرئيسية

الكمية المورّدة مقابل كمية جدول الكميات المعدل. المصدر: ورقة Major Quantities، التقرير الأسبوعي 18- أكتوبر-2026.



التوريدات مكتملة مقابل الكميات المعدلة


جميع المواد في ورقة Major Quantities مورّدة ومركّبة بنسبة 100% مقابل كمياتها المعدلة. ولا يزال ملخص التوريدات يُظهر إصدار 12 من 20 أمر شراء، ويتبقى 8، و10 مواد في الموقع.

ورقة التوريدات غير محدّثة

لا تزال ورقة التوريدات التفصيلية، المخفية في الملف، تعرض نسب توريد من مرحلة سابقة، مثل البردورات 4.8% والإنترلوك 6.9% وصنبور إطفاء الحريق 79%. وتسعة من بنودها الـ42 موسومة "سيتم حذفها من النطاق".

القوى العاملة

عدد العمالة اليدوية الشهري، المخطط مقابل الفعلي، من أغسطس 2024 إلى يناير 2026، آخر شهر يتوفر فيه رقم فعلي. المصدر: ورقة Manpower.

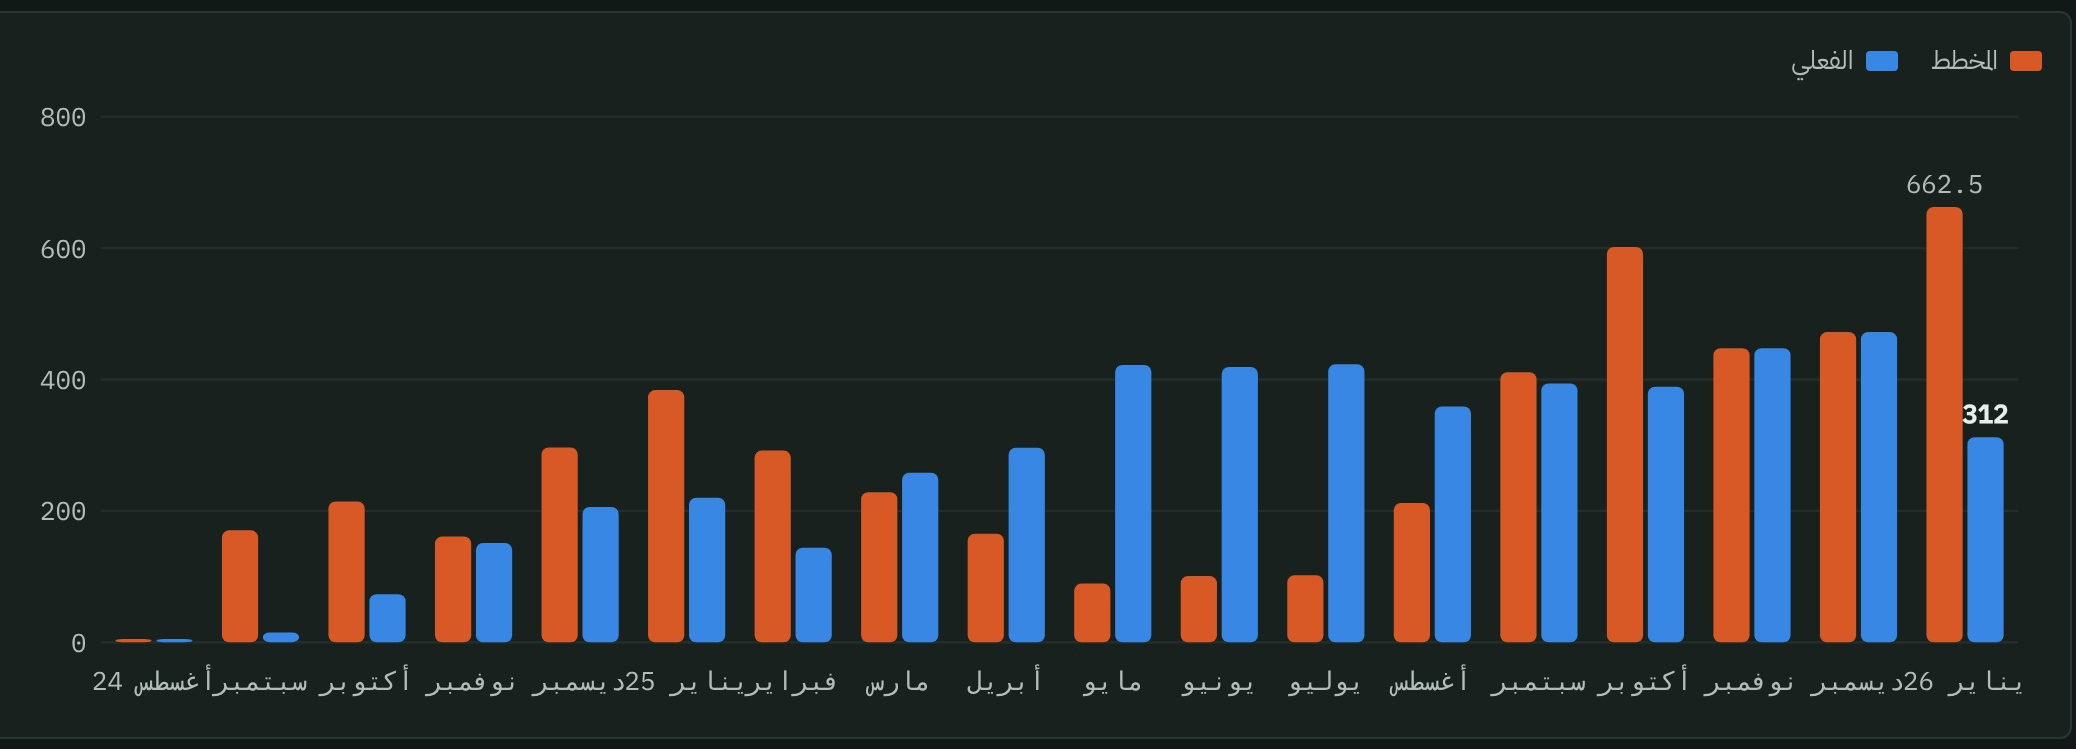

يناير 2026: 312 مقابل 662.5 مخططاً. والأرقام الفعلية لنوفمبر وديسمبر 2025 مطابقة تماماً للقيم المخططة. ولشهر أكتوبر 2026 تذكر لوحة الموارد 1,092 عاملاً و92 موظفاً (1,184) دون خطة للشهر، بينما يذكر التوزيع حسب المهنة 389 عاملاً مقابل 602 مخططاً. المعدات في الموقع: 135 مقابل 167 مخططة، منها 3 متوقفة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

شبكة تصريف السيول والأمطار	161,546,482
الطرق والرصف والعلامات الأرضية واللوحات	67,012,837
شبكة المياه المعالجة (الري)	49,057,170
شبكة الصرف الصناعي	19,706,041
الأعمال الكهربائية	13,120,144
شبكة مياه الشرب	9,302,202
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**319,744,876**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	367,706,607
أوامر التغيير	2 (دون تكلفة)

جميع القيم بالريال. أمر التغيير 1 (جدول الكميات المعدل، المعتمد في 23-يوليو-2025) وأمر التغيير 2 (تمديد المدة شهرين، المعتمد في 29-يونيو-2026) لا يغيران قيمة العقد.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	24
القيمة الإجمالية	250,214,133
استرداد الدفعة المقدمة	25,021,413
الخصومات والغرامات	260,000
المحتجزات	0
الصافي شاملاً الضريبة	258,711,628
المعتمد من مدير المشروع (23 مستخلصاً)	246,537,903
المدفوع (المسجل)	0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	278,116,807

المفوتر 78.3% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 98.96%. لا يسجل السجل أي دفعات، والمستخلصان #22 و#23 موسومان "قيد المراجعة" رغم إدخال تواريخ اعتماد مدير المشروع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.82

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	2,210,362
ساعات العمل هذا الأسبوع	22,920
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة (تراكمي)	11
حوادث المركبات (تراكمي)	1
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	223 / 3,335

هذا الأسبوع: 8 اجتماعات توعية وتدريبان داخليان. وآخر تفتيش للسلامة في الموقع ضمن الملف مؤرخ 26-يوليو-2026.

الجودة التقييم 0.91

تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / مفتوحة	129 / 96 / 33
تعليمات الموقع: صادرة / مفتوحة	187 / 1
طلبات فحص المواد: صادرة / مفتوحة	357 / 2
طلبات الفحص الميداني: صادرة / معلقة	31,551 / 1,488
طلبات الاستيضاح: صادرة / مفتوحة	238 / 0
المخططات التنفيذية: مقدمة / الإجمالي	2,520 / 2,539
اعتمادات المواد المعلقة	35 من 78

تفتيش مراقبة الجودة 18-أكتوبر-2026. متوسط مدة إغلاق تقارير عدم المطابقة 7 أيام.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
مخططات حسب التنفيذ	مدن	مخططات حسب التنفيذ لا تطابق الوضع في الموقع، لذا تحتاج مناطق الربط إلى حفر لتحديد الخدمات.
المقاطع العرضية لممرات الخدمات	مدن	المقطع العرضي في وثائق العقد لا يطابق الموقع، ويحتاج كل طريق إلى مقطع عرضي معتمد خاص به.
مصنع داخل منطقة العمل	مدن	يقع أحد المصانع داخل منطقة العمل، لذا يجب إعادة توزيع الشبكات في هذه الطرق. ولم يصل رد رسمي من الاستشاري بعد.
الخطوط القائمة تغيّر النطاق	مدن	الخطوط القائمة التي كشفها المسح تغيّر توزيع الشبكات وتقلل النطاق، كما حدث في شبكتي الصرف الصناعي والمياه.
خطوط الجهد المتوسط القائمة	مدن	خطوط الجهد المتوسط القائمة تغيّر النطاق، ولم تُسلَّم بيانات حسب التنفيذ للجهد المتوسط إلى المقاول.
العبارة الصندوقية، المنطقة 01	المقاول	خدمات قائمة أكثر من المتوقع، ويستمر العمل ببطء وحذر.
العبارة الصندوقية، المنطقة 06	مدن	يتعارض الحفر مع أحد المصانع ومدخله.

جميع البنود المفتوحة في سجل المشكلات سُجلت بين سبتمبر وديسمبر 2024 ولا تزال موسومة نشطة، ولا يتضمن السجل أي إدخالات أحدث.

ملاحظات على البيانات

- يعتمد هذا التقرير فقط على التقرير الأسبوعي بتاريخ بيانات 18-أكتوبر-2026، وهو الملف الوحيد في مجلد هذا الأسبوع. وتذكر ورقة Milestones فيه أن أسبوع العقد هو 116، وقد اعتُمد رقماً لأسبوع التقرير، بينما يعطي حساب الأسابيع الكاملة منذ تسليم الموقع 115.
- صور الموقع: الصور الوحيدة في الملف المرفوع موجودة في ورقة Weekly Photos المخفية، وتحمل أختام الكاميرا تواريخ من 24 إلى 30 يونيو 2025، لذا لم تُعرض كصور لهذا الأسبوع.
- تُظهر ورقة Physical-Chart Data إنجازاً فعلياً 100% في 30-سبتمبر-2026، بينما تعطي ورقة Progress نسبة 98.96% في 18-أكتوبر-2026. وتبلغ الخطة المعدلة 100% في 30-سبتمبر-2026، لكن ورقة Progress تعطي 99.93% مخططاً حتى تاريخه. والخطة الأساسية الأصلية مبنية على 69,385 ساعة عمل، والخطة المعدلة على 48,045.
- تتضمن ورقة Progress مستخرجين من P6: أحدهما ينتهي في 01-ديسمبر-2026 (−66 يوماً، 47,522 ساعة عمل مكتسبة) والآخر في 08-ديسمبر-2026 (−73 يوماً، 47,547 ساعة عمل). والثاني يطابق أرقام هذا الأسبوع واعتُمد هنا. ولا يطابق توقع التقرير الأسبوعي (15-نوفمبر-2026) أياً منهما.
- المعالم من 6 إلى 11 تحتفظ بتواريخ متوقعة من فبراير إلى يوليو 2026 انقضت دون تواريخ فعلية. ومعلم "اكتمال تركيب الهياكل المعدنية لجميع المباني" لا يناسب مشروع بنية تحتية.
- القوى العاملة: تتوقف الأرقام الفعلية الشهرية عند يناير 2026، والأرقام الفعلية لنوفمبر وديسمبر 2025 تساوي القيم المخططة. وعدد العمالة لأكتوبر 2026 (1,092 عاملاً) لا يطابق التوزيع حسب المهنة (389).
- الكميات الرئيسية: جدول الكميات المعدل يساوي الكمية المركّبة لكل بند. ويبدو أن "(193) "Fire hydrant و"Fire hydrant (193) "ULFM 150 بند واحد مدرج مرتين، كما يتكرر صف موصل التأريض 70 مم²، واحتُسب كل منهما مرة واحدة هنا.

- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة بينما يدرج السجل 24 مستخلصاً. وترقّم ورقة قيمة طلبات الفحص آخر إدخالاتها كتقارير أسبوعية من 104 إلى 106 لكنها تؤرخها 04 و05 و06 أكتوبر 2026.
- يعرض الملف أيضاً تقدماً مبنياً على التكلفة ويسميه مخططاً وفعلياً، بما في ذلك ورقتا Conclusion وSOURCE المخفيتان اللتان تحملان أرقاماً قديمة. ويعتمد هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي (بعدد ساعات العمل المخططة) فقط. وتُظهر ورقة Testing نسبة 0% لجميع الأنظمة بتواريخ مخططة في 2025.
