استكمال شبكات البنية التحتية بالمدينة الصناعية الثانية بمكة

Completion of Infrastructure Works, Second Industrial City in Makkah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	15-Feb-2026	14-Aug-2027

النطاق: أعمال الطرق، والعبارات الصندوقية، وقنوات الصرف المكشوفة والسدود، وإنارة الشوارع وتمديدات الجهد المنخفض، والمجاري الخرسانية عند تقاطعات الطرق. قيمة العقد 52,025,516 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 18 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ الإنجاز 80.0% مقابل 50.0% مخططاً، فالمشروع متقدم على الخطة بنسبة 30.1%. وحقق هذا الأسبوع 0.74% مقابل 1.33% مخططاً، أي أن وتيرة الأسبوع كانت دون الخطة.

نسبة الإنجاز الفعلي
80.0% / 50.0% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.60 +30.1%

التقدم هذا الأسبوع
+0.74% / +1.33% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.59%

المدة المنقضية من العقد
45.3% · اليوم 247 من 545
▼ الانتهاء المتوقع 30-أغسطس-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
57.3% · 29.8M SAR
7 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 26-سبتمبر-2026

المشروع متقدم كثيراً على الخطة، لكن الانتهاء المتوقع يتأخر 16 يوماً عن تاريخ العقد.

يتوقع التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (UP 33، تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026) كلاهما الانتهاء في 30-أغسطس-2027، أي بعد 16 يوماً من تاريخ انتهاء العقد 14-أغسطس-2027، بفائض زمني كلي −14 يوماً. يمر الفائض السالب بأعمال الأسفلت والتشطيبات في وصلة الطريق الدائري الخامس، ثم الاختبار والتشغيل والإغلاق. ولا تزال الأعمال الإضافية في الطريق التجميعي 9 والطريق 52 مفتوحة.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 20-أكتوبر-2026، مختومة بتاريخي 15 و17 أكتوبر 2026. لا تحمل الصور ختم GPS، وهي صغيرة في الملف المصدر (عرضها نحو 600 بكسل). اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال القطع، الطريق التجميعي 9

حفار يعمل في قطع الصخور. مختومة 17-أكتوبر-2026، 07:09.



طبقة الأساس الحصوية، طريق غير المسلمين

فرادة ومدحلة على طبقة الأساس. مختومة 17-أكتوبر-2026، 07:50.



إنشاء الكتف الترابي، القناة المكشوفة 3C

حفار يشكّل الكتف الترابي بجوار تكسية الحجر. مختومة 17-أكتوبر-2026، 07:53.




البلاطة السفلية للعبارة الصندوقية 5

صب الخرسانة للبلاطة السفلية. مختومة 15-أكتوبر-2026، 10:14.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

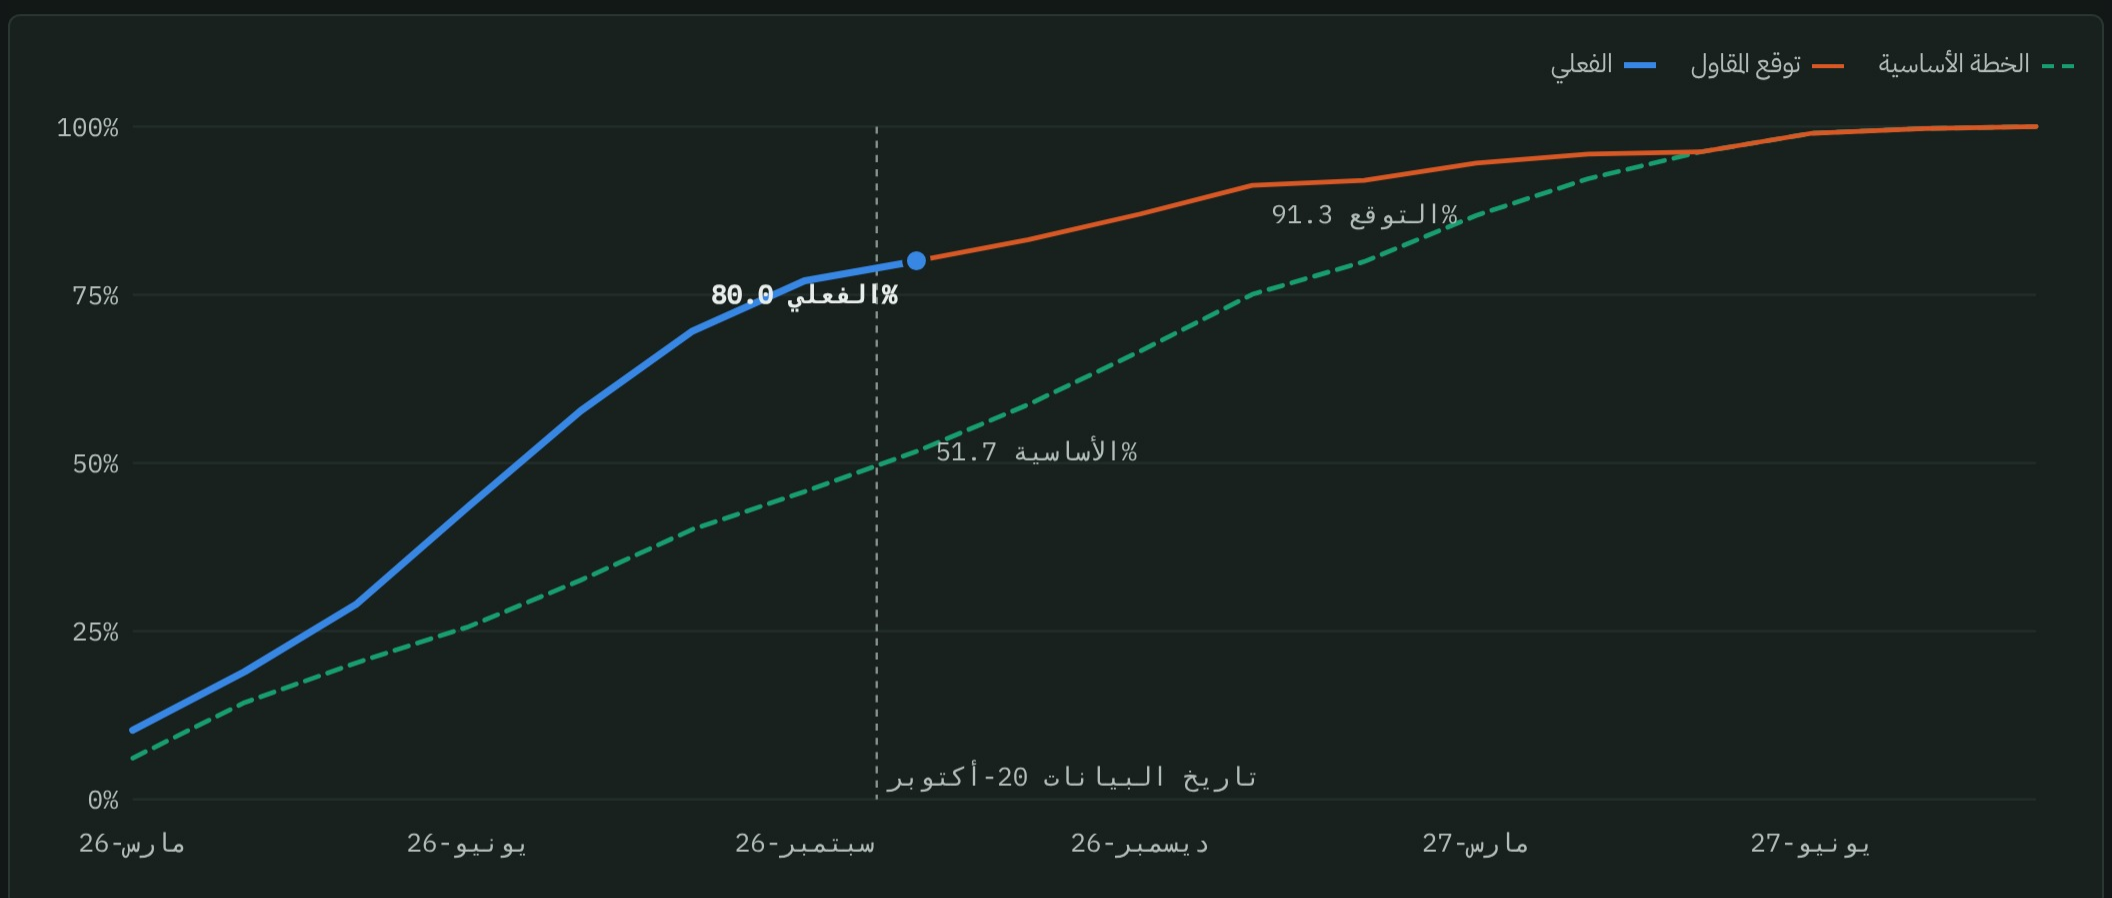

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026	48.66	79.31	+30.65	—	1.63
20-Oct-2026	**49.99**	**80.05**	**+30.06**	**+0.74**	**1.60**

نسبة الإنجاز الفعلي محسوبة من مجاميع ساعات العمل في تقرير 20-أكتوبر-2026، الذي يعطي القيم التراكمية لهذا الأسبوع والأسبوع السابق فقط. الخطة المعدلة في المصدر مطابقة للخطة الأساسية، لذا يعرض الخط البرتقالي توقع المقاول: الفعلي حتى سبتمبر، ثم التوقع ابتداءً من أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	12.0%	100.0%	90.5%	−9.5%	0.90	▼ متأخر
أعمال الطرق	24.0%	48.9%	61.4%	+12.5%	1.26	▲ متقدم
الأعمال الكهربائية	8.3%	25.4%	71.8%	+46.4%	2.83	▲ متقدم
أعمال الإزالة	1.3%	100.0%	67.6%	−32.4%	0.68	▼ متأخر
العبّارات الصندوقية	3.5%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
قنوات الصرف المكشوفة	37.6%	30.3%	96.2%	+65.9%	3.18	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإغلاق وتسريح الموارد	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**50.0%**	**80.0%**	**+30.1%**	**1.60**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 رقم 33 UP (تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026) 399 نشاطاً: 312 مكتملاً و30 قيد التنفيذ و57 لم تبدأ. وتاريخ الانتهاء المجدول 30-أغسطس-2027، أي بعد 16 يوماً من تاريخ العقد. وانخفضت أنشطة المسار الحرج من 66 إلى 43 هذا الأسبوع.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الكلية والمنفذة والمتبقية لكل شبكة وبند رئيسي. إجماليات الشبكات من ورقة Progress Summary، وكميات البنود من ورقة Major Quantities في تقرير 20-أكتوبر-2026. «المنفذ هذا الأسبوع» هو الكمية المذكورة كأعمال منفذة هذا الأسبوع في ملفي الملخص (15 و16)؛ وتعني «–» أن التقرير لا يعطي رقماً أسبوعياً.

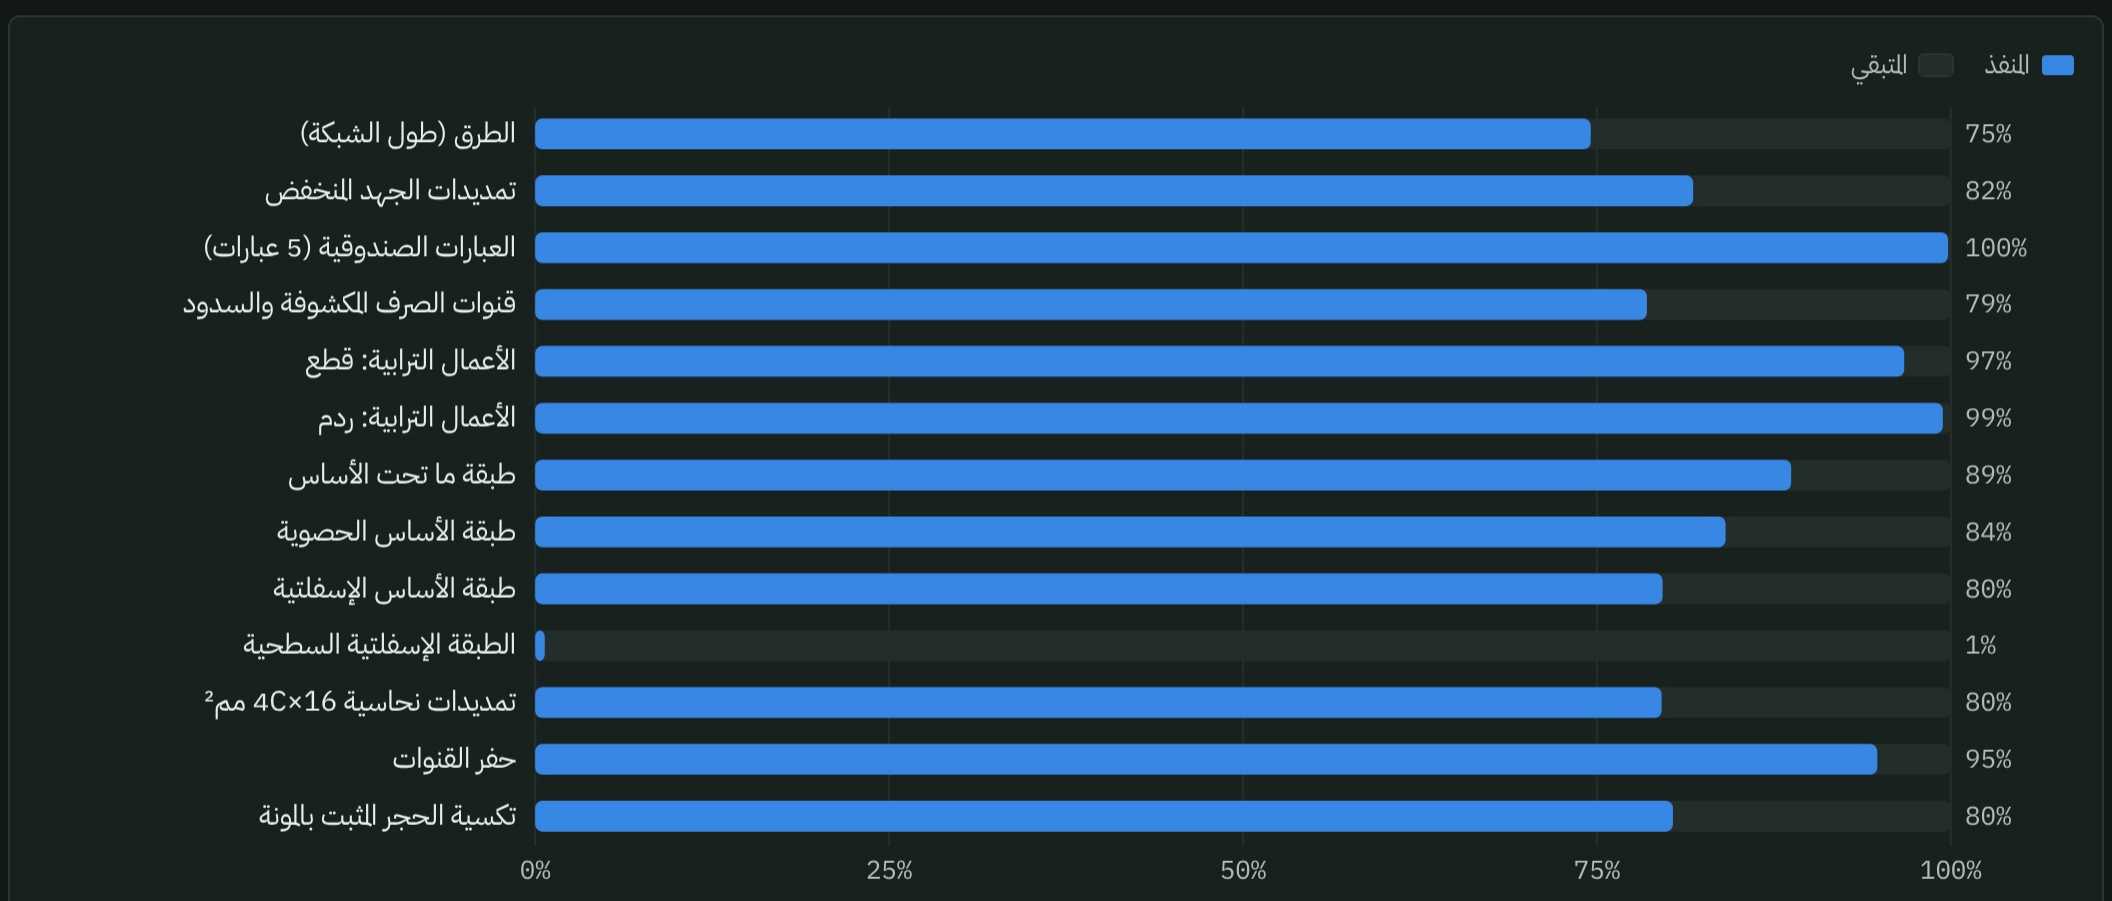

بند النطاق	المصدر	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
الطرق (طول الشبكة)	ملخص التقدم	م.ط	3,754	2,799	–	955	74.6%
تمديدات الجهد المنخفض	ملخص التقدم	م.ط	8,464	6,923	–	1,541	81.8%
العبارات الصندوقية (5 عبارات)	ملخص التقدم	%	100	99.8	–	0.2	99.8%

بند النطاق	المصدر	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
قنوات الصرف المكشوفة والسدود	ملخص التقدم	م.ط	3,921	3,079	–	841.7	78.5%
الأعمال الترابية: قطع	B1.31 22 00.01	م³	537,044	519,347	10,548+	17,697	96.7%
الأعمال الترابية: ردم	B1.31 22 00.02	م³	438,397	435,902	3,240+	2,495	99.4%
طبقة ما تحت الأساس	B1.31 22 00.03	م³	37,334	33,122	301+	4,212	88.7%
طبقة الأساس الحصوية	B1.32 11 23.01	م³	24,889	20,928	802+	3,961	84.1%
طبقة الأساس الإسفلتية	B1.32 11 26.01	م³	11,676	9,298	313+	2,377	79.6%
الطبقة الإسفلتية السطحية	B1.32 12 16.01	م³	5,253	35.6	–	5,218	0.7%
تمديدات نحاسية 4C×16 مم²	B2.26 05 19.01	م	8,007	6,371	–	1,636	79.6%
حفر القنوات	B6.31 22 00.04	م³	115,262	109,271	–	5,991	94.8%
تكسية الحجر المثبت بالمونة	B6.31 25 00.02	م²	49,594	39,857	–	9,737	80.4%

العبارات الصندوقية والقنوات المكشوفة

اكتملت العبارات الصندوقية الخمس بنسبة 99.8%، وصُبت البلاطة السفلية للعبارة 5 هذا الأسبوع. ونُفذ حفر القنوات بنسبة 94.8% وتكسية الحجر بنسبة 80.4%.

لم تبدأ أو بالكاد بدأت

الطبقة الإسفلتية السطحية عند 0.7% (35.6 من 5,253 م³). وشملت أعمال هذا الأسبوع أيضاً 571 م² من بلاط الإنترلوك في الطريق الشرياني 4، لكن التقرير لا يتضمن إجمالياً محدثاً للإنترلوك.

المعالم الرئيسية

التواريخ الأساسية والمتوقعة من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي، مع التوقع والفائض الزمني من تحديث P6 رقم UP 33.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	15-Feb-2026	15-Feb-2026	15-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد البرنامج الزمني الأساسي	14-Mar-2026	01-Mar-2026	01-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	14-Mar-2026	06-Jun-2026 (+84 يوماً)	06-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
التأهيل المسبق واعتماد المواد	14-Mar-2026	06-Jun-2026 (+84 يوماً)	06-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
توريد المواد طويلة الأجل	16-Aug-2026	29-Aug-2026 (+13 يوماً)	29-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
إنجاز أعمال الطرق	14-Dec-2026	11-Jan-2027 (+28 يوماً)	11-Jan-2027	45	▼ بعد الموعد الأساسي
إنجاز قنوات الصرف المكشوفة	14-Jun-2027	29-Jun-2027 (+15 يوماً)	29-Jun-2027	3	▼ معرّض للتأخير
إنجاز جميع الأعمال	14-Aug-2027	30-Aug-2027 (+16 يوماً)	30-Aug-2027	−14	▼ متأخر
التسليم النهائي	14-Aug-2027	30-Aug-2027 (+16 يوماً)	30-Aug-2027	−14	▼ متأخر

يتفق التقرير الأسبوعي وتحديث P6 على جميع التواريخ المتوقعة.

يضع كلاهما إنجاز جميع الأعمال والتسليم النهائي في 30-أغسطس-2027، أي بعد 16 يوماً تقويمياً من تاريخ العقد، ويظهر ذلك في P6 كفائض −14 يوماً. تحتفظ أعمال الطرق بفائض 45 يوماً لكنها تنتهي بعد 28 يوماً من موعدها الأساسي، ولقنوات الصرف المكشوفة فائض 3 أيام فقط.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المطلوبة التي تم توريدها لكل مادة. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 20-أكتوبر-2026.



دهانات الطرق: لا يوجد أمر شراء


المطلوب 5,712 م² والمورّد 0%، مع أن المادة كانت مطلوبة في الموقع منذ 17-مايو-2026.

توريد الأسفلت والبردورات مستمر

تم توريد 55% من طبقتي الأساس والسطح الإسفلتيتين (9,334 من 16,929 م³) و79% من البردورات مسبقة الصب (17,414 من 21,915 م). ويُظهر التقرير وجود 17 من 18 مادة مخططة في الموقع، وآخر مواد أعمال الطرق مستحقة بحلول 10-نوفمبر-2026.

القوى العاملة

متوسط عدد العاملين الشهري في الموقع، العمالة والموظفون معاً، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

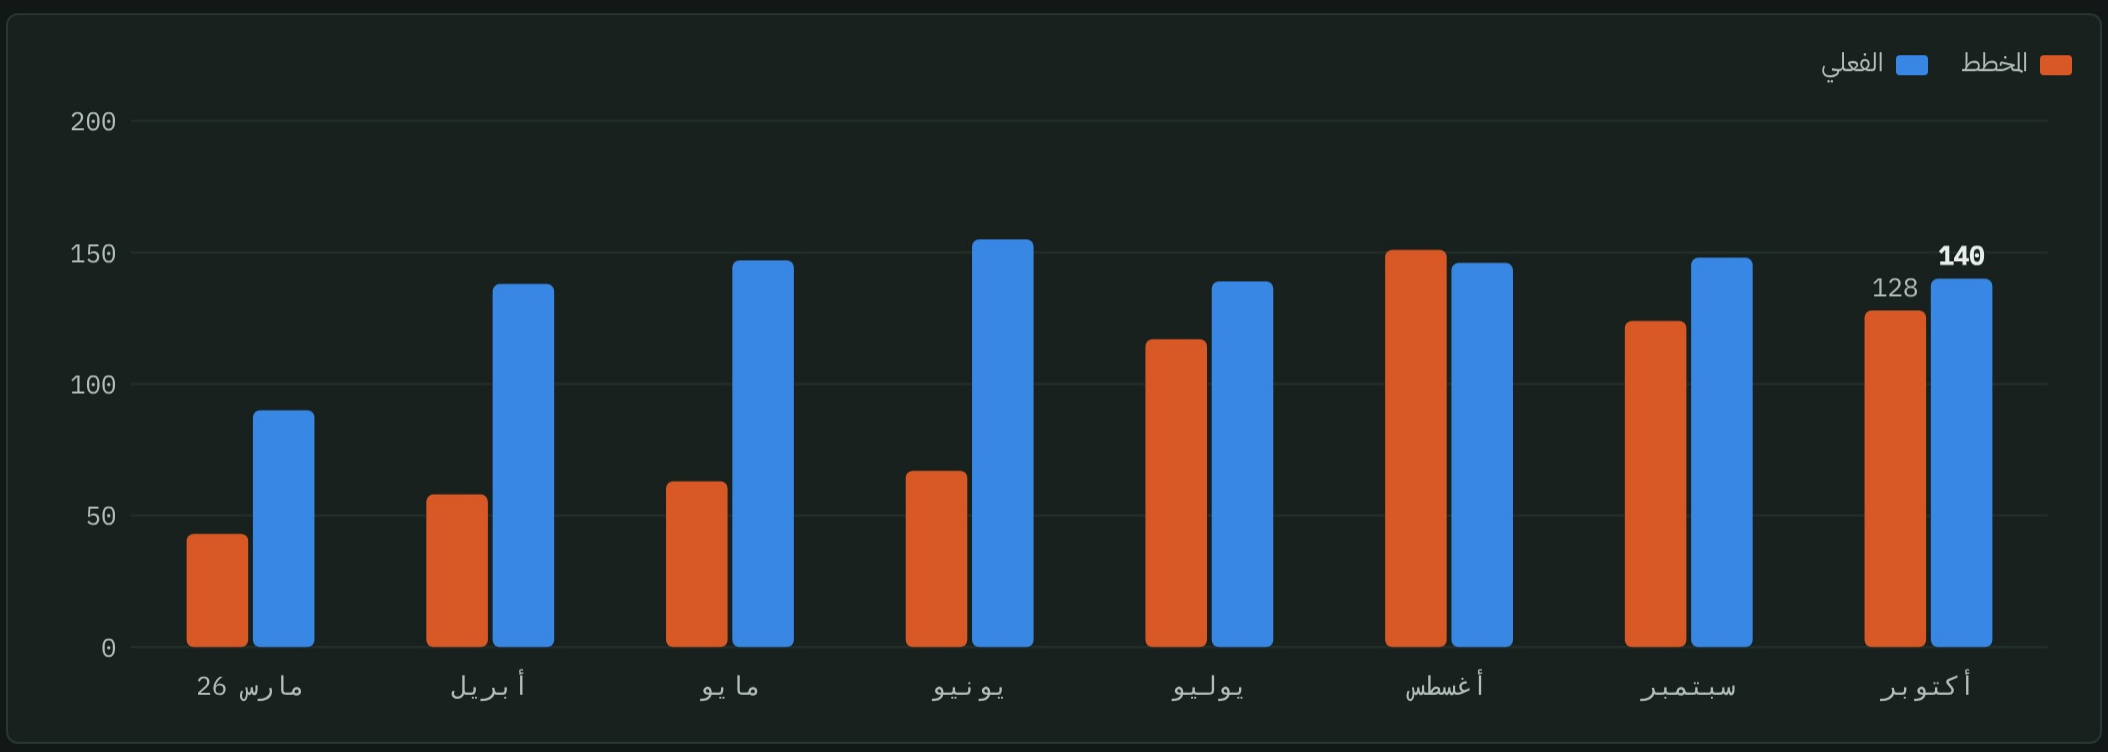

عدد العاملين في أكتوبر 140 مقابل 128 مخططاً: 115 عاملاً (116 مخططاً) و25 موظفاً (12 مخططاً). ومتوسط المعدات في الموقع 64 مقابل 49 مخططاً. وتبلغ خطة العمالة ذروتها 161 في يناير 2027.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	52,025,516
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	59,829,343
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	52,025,516
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	40,386,553

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	7
القيمة الإجمالية	29,797,667
الخصومات والغرامات	2,000
الصافي شاملاً الضريبة	34,269,317
المدفوع (6 مستخلصات)	31,459,715
معتمد بانتظار الصرف	2,809,602

بلغت المستخلصات 57.3% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 80.0%. واعتمدت الحسابات المستخلص 7 (من 24-أغسطس إلى 26-سبتمبر-2026) في 12-أكتوبر-2026 ولم يُصرف بعد. لا توجد محتجزات أو دفعة مقدمة مسجلة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 86.4%

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	196,660
ساعات العمل هذا الأسبوع	4,560
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة (تراكمي)	1
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	12 / 51

تفتيش الاستشاري للصحة والسلامة، 20-أكتوبر-2026. متوسط التقييم حتى تاريخه 85.2%.

الجودة التقييم 90.0%

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	910 / 901
طلبات الفحص المعلقة	9
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	2 / 2
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	25 / 24
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	31 / 31
المخططات التنفيذية المعتمدة / المقدمة	28 / 36
اعتمادات المواد المعتمدة / المقدمة	63 / 65

تراكمي حتى 20-أكتوبر-2026. تقييم تفتيش الجودة من الاستشاري 89.95% هذا الأسبوع، والمتوسط حتى تاريخه 84.7%.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
أعمال إضافية، الطريق التجميعي 9	المقاول / مدن	تغيير في النطاق بإضافة أعمال في الطريق التجميعي 9. مفتوح في سجل المخاطر، والتاريخ المستهدف 14-نوفمبر-2026.
الطريق الجديد 52	المقاول / مدن	تغيير في النطاق لإنشاء الطريق 52، بتصنيف مرتفع جداً (25 بعد المعالجة). مفتوح، والتاريخ المستهدف 28-ديسمبر-2026.
طريق الجلود الجديد	المقاول / مدن	مدرج ضمن تحديات المشروع في ملخص التقدم. يظهر مفتوحاً في سجل المخاطر ومغلقاً في ملف المخاطر، والتاريخ المستهدف 01-ديسمبر-2026.
الوصلة إلى الطريق الدائري الخامس	المقاول	بدأت أعمال الأسفلت في 08-أكتوبر-2026 ونسبة إنجازها الفعلي 8.0% بساعات العمل (864 من 10,830)، ولها مع أعمال التشطيب فائض −14 يوماً وهي التي تحدد تاريخ انتهاء المشروع.

سجل المشكلات وجدول أهم خمس مشكلات في التقرير الأسبوعي فارغان هذا الأسبوع. وبقية بنود السجل (تصميم القناة المكشوفة 3A، والعبارة 3، وتصاريح موسم الحج) مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- يعرض ملفا الملخص (15 و16) نسبة تقدم محسوبة على أساس التكلفة بوصفها «الفعلي»، ويعطيان نسبة مخططة على الأساس نفسه. يستخدم هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي المقاسة بساعات العمل فقط.
- يعطي الملفان 15 و16 تغير التقدم لهذا الأسبوع بإشارتين متعاكستين (سالبة في الملف 15 وموجبة في الملف 16).
- يذكر الملف 15 مدير المشروع باسم عبد الله الجليفي والملف 16 باسم عبد الله الشنيفي. كما يعطي الملف 16 بداية المشروع 24-نوفمبر-2025 ونهاية العقد 23-مايو-2026، بينما تذكر بقية الملفات تسليم الموقع 15-فبراير-2026 والانتهاء 14-أغسطس-2027.

- لا يتضمن التقرير إلا التقدم التراكمي لهذا الأسبوع والأسبوع السابق، لذا يضم الجدول الأسبوعي صفين ويظهر منجز الأسبوع السابق «—».
- الخطة المعدلة في ورقة Physical-Chart Data مطابقة للخطة الأساسية.
- تحتوي ورقة Major Quantities على مجموعة قديمة من البنود بقيم صفرية (طبقة ما تحت الأساس 21,604 م³، طبقة الأساس 14,403 م³، البردورات 23,250 «م³»، تمديدات 15 ك.ف 5,632 «م²»، المحطة الفرعية، وحدة RMU، أعمدة إنارة 7 م وغيرها) بجانب البنود الحالية ذات التقدم. استُخدمت البنود الحالية فقط.
- تمديدات الجهد المنخفض: تعطي ورقة Major Quantities 6,371 من 8,007 م منفذة، بينما يعطي ملخص التقدم 6,923 من 8,463.65 م.
- عدد وحدات الإنارة 264 في ورقة Procurement و247 في ملخص التقدم، ووحدات التأريض 17 و15. ونسبة إنجاز التوريدات 90.5% بساعات العمل رغم الإفادة بوجود 17 من 18 مادة في الموقع.
- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة رغم تسجيل 7، وقيمة مقدمة (34,267,317) أقل بـ 2,000 ريال من القيمة المعتمدة (34,269,317). كما تحتوي خانتا قيمة العقد المعدلة والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز على 21,100,000 و20,900,000 بجانب 52,025,516.
- تؤرخ ورقة General Information اعتماد البرنامج الأساسي في 01-مارس-2025، أي قبل ترسية العقد، بينما تعطي ورقة المعالم وP6 التاريخ 01-مارس-2026. وفي ملخص طلبات الفحص، يحمل FIR-0880 تاريخ 10-نوفمبر-2026 (بعد تاريخ البيانات)، ويحمل FIR-0882 وFIR-0885 تاريخي يونيو ومايو 2026 ضمن فترة 14–20 أكتوبر.
- عدد العمالة في أكتوبر 115 (116 مخططاً) في ورقة Manpower، بينما يُظهر توزيع المهن في ورقة Weekly Progress Report 105 مخططاً و105 فعلياً.
- تُظهر لوحة المخاطر (الملف 17) 240 خطراً مفتوحاً و133 مشكلة مفتوحة لكن الصفر في كل فئة، ويسرد السجل 8 مخاطر منها 3 مفتوحة. والعبارة 4 وطريق الجلود مفتوحان في سجل مخاطر التقرير الأسبوعي ومغلقان في الملف 17.
- جدول معالم P6 داخل ورقة Milestones (مثل التجهيز 02-أبريل-2026) غير محدث؛ أُخذت توقعات المعالم والفائض من ملف P6 رقم UP 33.
- يقيس التقرير الأسبوعي التأخير بـ 16 يوماً تقويمياً، بينما يعطي P6 فائضاً −14 يوماً.

أُعد في 28-أكتوبر-2026 من التقرير الأسبوعي بتاريخ 20-أكتوبر-2026 (التقرير رقم 36) وتحديث P6 رقم UP 33.
