مبادرة الحرفيين (الصناعات منخفضة العمليات التصنيعية بنجران)

Construction of Industrial Units for Artisans in Najran

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة لبنات البناء	إيجيس (EGIS)	م. أحمد قطبي	03-Mar-2026	02-Jan-2027

النطاق: وحدة الصناعات منخفضة العمليات (RBF) ومسجد خارجي وغرفة مضخات وخزان مياه GRP، مع أعمال الموقع والخرسانة والمباني والتشطيبات والمنشآت المعدنية سابقة التصميم، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية بما فيها مكافحة الحريق وإنذار الحريق والطاقة الشمسية.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بلغت نسبة الإنجاز 98.5% مقابل 82.4% مخطط، أي أن المشروع متقدم على الخطة الأساسية بنسبة 16.1% (مؤشر الأداء الزمني 1.195). بلغ تقدم هذا الأسبوع 2.0%، أقل من 3.8% المخطط للأسبوع.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
98.5% / 82.4% مخطط	**+2.0%** / +3.8% مخطط	**76.1%** · اليوم 232 من 305	**83.1%** · 7.94 مليون ريال
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.195 · +16.1%	▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.8%	● تاريخ الإنجاز المتوقع 15-أكتوبر-2026 قد مضى	6 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

الأعمال شارفت على الانتهاء، لكن تاريخ الإنجاز المتوقع في التقرير لم يعد صالحاً.

يتوقع التقرير الأسبوعي إنجاز جميع الأعمال في 15-أكتوبر-2026، أي قبل تاريخ بياناته بستة أيام، في حين بلغت أعمال الإغلاق 67.2% والأعمال الكهربائية 98.5%. ولا يزال الاختبار والتشغيل مخططاً من 09-ديسمبر-2026 إلى 19-ديسمبر-2026، وتاريخ انتهاء العقد 02-يناير-2027. يجب تحديث التاريخ المتوقع.

صور الموقع هذا الأسبوع

صورتان من ورقة "Weekly Photos" في التقرير الأسبوعي بتاريخ 21-أكتوبر-2026 (أعمال غرفة المضخات)، وكلتاهما مختومة بتاريخ 21-أكتوبر-2026، منطقة نجران. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



مظلة مضخات الحريق

مضخات الحريق ومواسير مكافحة الحريق تحت مظلة غرفة المضخات. مختومة بتاريخ 21-أكتوبر-2026، 09:23.




غرفة المضخات وخزان المياه GRP

غرفة المضخات بجوار خزان المياه GRP، مع عمال في الموقع. مختومة بتاريخ 21-أكتوبر-2026، 09:24.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً؛ قيمة أكتوبر حتى 21-أكتوبر-2026. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

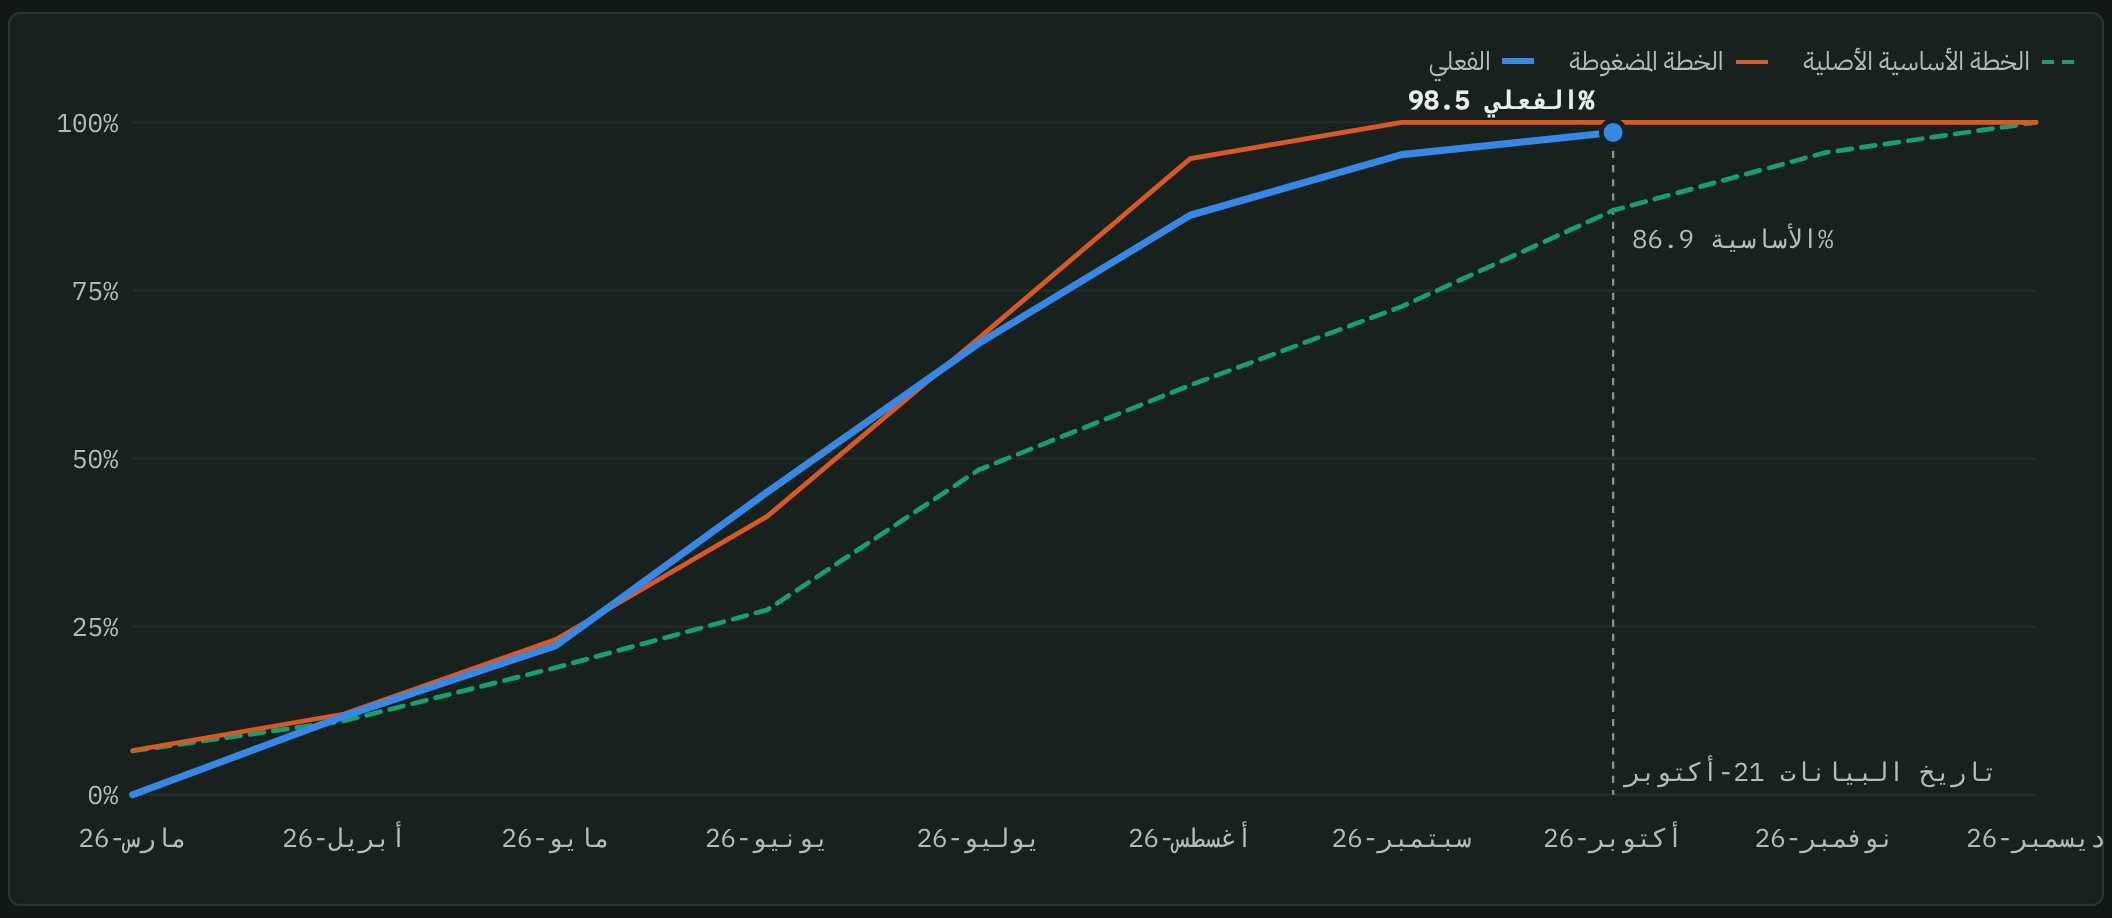

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
21-Oct-2026	**82.4**	**98.5**	**+16.1**	**+2.0**	**1.195**

استُخدم تقرير هذا الأسبوع فقط، لذلك لا تظهر الأسابيع السابقة. المنجز هذا الأسبوع (2.0% مقابل 3.8% مخطط) هو التقدم الأسبوعي المذكور في التقرير.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقتا Weekly Progress Report وProgress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	4.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	4.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	12.0%	98.2%	100.0%	+1.8%	1.02	✓ مكتمل
التنفيذ	**76.3%**	**82.1%**	**99.6%**	**+17.5%**	**1.21**	▲ متقدم
· أعمال الموقع	4.7%	66.9%	100.0%	+33.1%	1.49	✓ مكتمل
· الخرسانة	17.4%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· أعمال المباني	2.2%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· الأعمال المعدنية	0.6%	41.6%	100.0%	+58.4%	2.40	✓ مكتمل
· العزل الحراري والمائي	2.7%	92.9%	100.0%	+7.1%	1.08	✓ مكتمل
· الأبواب والنوافذ	3.6%	56.1%	100.0%	+43.9%	1.78	✓ مكتمل
· التشطيبات	5.0%	29.4%	100.0%	+70.6%	3.41	✓ مكتمل
· الأعمال الخاصة	0.6%	0.0%	100.0%	+100.0%	–	✓ مكتمل
· المنشآت المعدنية سابقة التصميم	8.1%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· الأعمال الميكانيكية	13.1%	87.8%	100.0%	+12.2%	1.14	✓ مكتمل
· الأعمال الكهربائية	18.3%	76.9%	98.5%	+21.6%	1.28	▲ متقدم

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الإغلاق	3.7%	0.0%	67.2%	+67.2%	–	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**82.4%**	**98.5%**	**+16.1%**	**1.195**	▲ متقدم

تُظهر حالة جدول P6 في التقرير 1,462 نشاطاً: 1,430 مكتملاً و17 قيد التنفيذ و15 لم تبدأ (97.8% مكتملة من حيث العدد). لا توجد أنشطة على المسار الحرج.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة لكل بند رئيسي، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 21-أكتوبر-2026. يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز "–" لأن التقرير لا يتضمن كميات الأسبوع السابق.



بند النطاق	بند جدول الكميات	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
مواد الردم	2.1.6	م³	2,615	2,615	–	0	100.0%
طبقة ما تحت الأساس	2.2.4	م³	1,300	1,300	–	0	100.0%
طبقة الأساس الحصوية	2.2.3	م³	867	867	–	0	100.0%
الطبقة الإسفلتية الأساسية	2.2.2	م³	304	304	–	0	100.0%
الطبقة الإسفلتية السطحية	2.2.1	م³	217	217	–	0	100.0%
الإنترلوك	2.2.7.1	م²	1,326	1,326	–	0	100.0%
البردورات	2.3.8	م.ط	1,294	1,294	–	0	100.0%
الخرسانة المسلحة	3.2	م³	449	449	–	0	100.0%
بلاطة أرضية خرسانية بسماكة 150 مم	3.3	م³	307	307	–	0	100.0%
ألواح الخرسانة الخلوية	3.4	م²	55	55	–	0	100.0%
البلوك الخرساني	4.1	م²	444	444	–	0	100.0%
مواسير مكافحة الحريق HDPE	15.1.2.1 · 200 mm	م.ط	48	48	–	0	100.0%
	15.1.2.2 · 150 mm	م.ط	200	200	–	0	100.0%
	15.4.1.1 · 8 in	م.ط	15	15	–	0	100.0%

بند النطاق	بند جدول الكميات	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
	الإجمالي	م.ط	**263**	**263**	–	**0**	**100.0%**
مواسير تغذية المياه HDPE	15.2.2.1 · mm 100	م.ط	20	20	–	0	100.0%
	15.2.2.2 · mm 90	م.ط	235	235	–	0	100.0%
	15.2.2.3 · mm 63	م.ط	8	8	–	0	100.0%
	15.2.2.4 · mm 50	م.ط	40	40	–	0	100.0%
	15.5.1.1 · mm 63	م.ط	40	40	–	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**343**	**343**	–	**0**	**100.0%**
مواسير الصرف الصحي uPVC	15.3.2.1 · mm 110	م.ط	105	105	–	0	100.0%
	15.3.2.2 · mm 160	م.ط	75	75	–	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**180**	**180**	–	**0**	**100.0%**
مواسير الصرف والتصريف للمباني uPVC	15.6.1.1 · in 4	م.ط	168	168	–	0	100.0%
	15.6.1.2 · in 3	م.ط	30	30	–	0	100.0%
	15.6.1.3 · in 2	م.ط	132	132	–	0	100.0%
	15.6.1.4 · in 1	م.ط	180	180	–	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**510**	**510**	–	**0**	**100.0%**
تمديدات الجهد المنخفض	16.6.1 · 4C×185 mm²	م.ط	120	120	–	0	100.0%
	16.6.2 · 4C×120 mm²	م.ط	75	75	–	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**195**	**195**	–	**0**	**100.0%**

حالة الأسفلت متعارضة بين الأوراق

تُظهر ورقة Major Quantities طبقتي الأسفلت والإنترلوك منفذة بالكامل، لكن ورقة Procurement تُدرج طبقتي الأسفلت "جاهزة للتوريد"، ومخطط الموقع في ورقة Project Summary يُظهر الطبقة السطحية "لم تبدأ".

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية وآخر خطة والتوقع من ورقة Milestones. التغيير هو عدد الأيام التي يسبق بها التوقع الخطة الأساسية، كما هو مذكور في الورقة.

المعلم	الخطة الأساسية	آخر خطة	المتوقع	التغيير (أيام)	الحالة
ترسية العقد	25-Jan-2026	25-Jan-2026	25-Jan-2026	0	✓ منجز
توقيع العقد	12-Feb-2026	12-Feb-2026	12-Feb-2026	0	✓ منجز
تسليم الموقع	03-Mar-2026	03-Mar-2026	03-Mar-2026	0	✓ منجز
اكتمال التجهيز	31-Mar-2025	31-Mar-2025	31-Mar-2025	0	✓ منجز
مسح الوضع القائم والتقارير النهائية	31-Mar-2025	31-Mar-2025	31-Mar-2025	0	✓ منجز
توريد المواد طويلة الأجل	27-Oct-2026	27-Oct-2026	27-Oct-2026	0	؟ التاريخ الفعلي بعد تاريخ البيانات
توريد المواد قصيرة الأجل	29-Oct-2026	05-Sep-2026	05-Sep-2026	0	✓ منجز
جميع أعمال المستودع	29-Nov-2026	03-Oct-2026	03-Oct-2026	0	✓ منجز
المسجد الخارجي (المصلى)	05-Dec-2026	30-Sep-2026	30-Sep-2026	0	✓ منجز
خزان المياه GRP وغرفة المضخات	24-Aug-2026	24-Aug-2026	24-Aug-2026	0	؟ التاريخ المتوقع قد مضى
جميع الأعمال الخارجية	25-Nov-2026	25-Nov-2026	30-Sep-2026	56	؟ التاريخ المتوقع قد مضى
جميع الأعمال شاملة الاختبار والتشغيل والإغلاق (الاستلام الابتدائي)	02-Jan-2027	02-Jan-2027	15-Oct-2026	79	؟ التاريخ المتوقع قد مضى

المعلم	الخطة الأساسية	آخر خطة	المتوقع	التغيير (أيام)	الحالة
إخلاء الموقع	02-Jan-2027	02-Jan-2027	15-Oct-2026	79	؟ التاريخ المتوقع قد مضى

أربعة معالم لا تزال متوقعة رغم مضي تواريخها.

خزان المياه GRP وغرفة المضخات، والأعمال الخارجية، وإنجاز جميع الأعمال، وإخلاء الموقع مُدرجة كتواريخ متوقعة بين 24-أغسطس-2026 و15-أكتوبر-2026، وجميعها قبل تاريخ البيانات 21-أكتوبر-2026. أعمال الإغلاق مكتملة بنسبة 67.2% والاختبار والتشغيل مخطط في ديسمبر 2026، لذا تحتاج إلى تواريخ فعلية أو تواريخ متوقعة جديدة.

توريد المواد الرئيسية

نسبة بنود المواد المورّدة إلى الموقع حسب التخصص. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 21-أكتوبر-2026 (86 من 108 بنود مورّدة).



التشطيبات: 5 من 11 بنداً مورّدة


بلاط الجرانيت وشرائح الرخام والوزرة الخشبية "جاهزة للتوريد"؛ وحبيبات الرخام والقواطع الفينولية "جاهزة لدى المقاول"؛ والسجاد "متوفر محلياً".

بنود أخرى لم تورَّد بعد

طبقتا الأسفلت ودهان الطرق (جاهزة للتوريد)، ومراوح التكييف والدكت والناشرات والشبكات (جاهزة لدى المقاول)، وعزل سطح السقف (التوريد جارٍ)، وكسوة الألمنيوم، والسياج الحديدي المجلفن وبوابته، ورشاشات المياه، وسطح كوريان، ولوحات دورات المياه والمسجد وشعارات مدن.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمالة والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

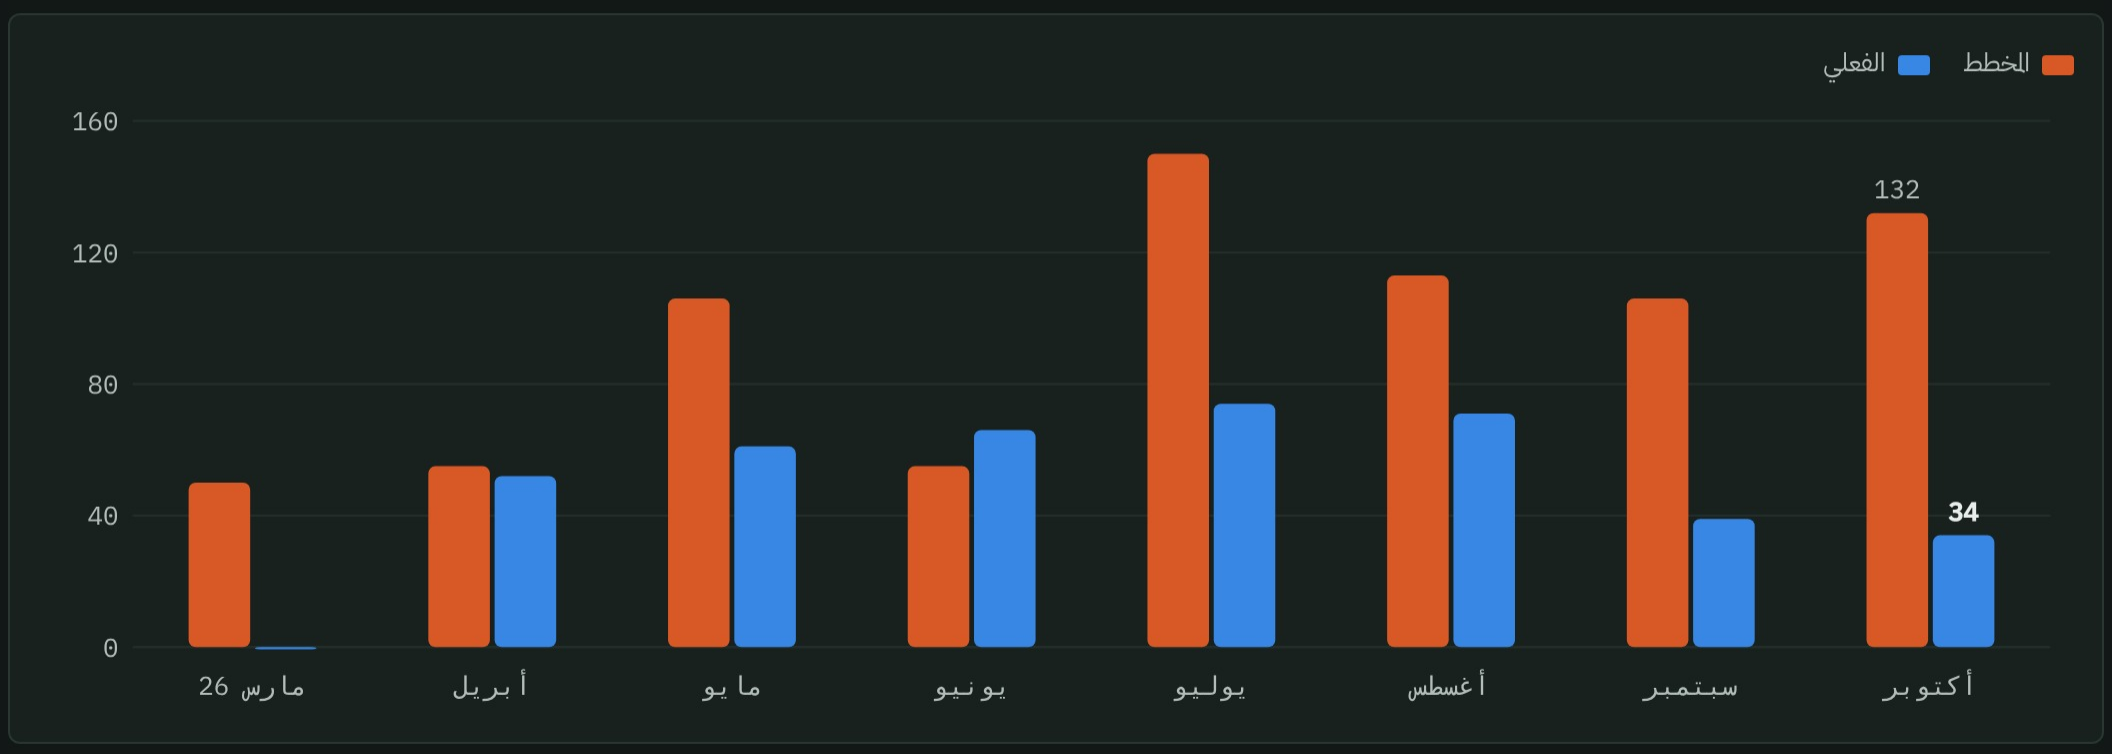

عدد العمالة في أكتوبر 34 (13 موظفاً و21 عاملاً) مقابل 132 مخطط (أقل بنسبة 74%). المعدات في الموقع 8 مقابل 34 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	9,554,134
قيمة العقد المعدلة	9,554,134
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	10,987,254
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة / المعتمدة من مدير المشروع	6 / 6
القيمة الإجمالية	7,935,744
المستخلصات المدفوعة	4
القيمة المدفوعة	4,460,610
المحتجزات	0
الخصومات والغرامات	-20,000
الصافي شاملاً الضريبة	9,106,107
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	9,332,210

المفوتر 83.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 98.5%. المستخلصان 5 و6 (3,475,134 ريال إجمالي) معتمدان ولم يُدفعا بعد.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.83

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	83,990
ساعات العمل هذا الأسبوع	1,824
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	2
حوادث وشيكة (منذ بداية العام)	9
حوادث الحريق	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	40 / 28

من ورقة HSE-Stat؛ تختلف لوحة الملخص، انظر ملاحظات على البيانات.

الجودة التقييم 0.89

طلبات الفحص الميداني الصادرة / المغلقة	407 / 407
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	64 / 64
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	17 / 17
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	18 / 18
المخططات التنفيذية المعتمدة	93 / 93
اعتمادات المواد	95 / 95
قيمة طلبات الفحص لهذه الفترة (ريال)	65,380

فترة طلبات الفحص: 12-أكتوبر-2026 إلى 18-أكتوبر-2026.

ملاحظات على البيانات

- تاريخ الإنجاز المتوقع لجميع الأعمال (15-أكتوبر-2026) يسبق تاريخ بيانات التقرير 21-أكتوبر-2026، بينما أعمال الإغلاق مكتملة بنسبة 67.2% وتخطط ورقة Testing للاختبار والتشغيل من 09-ديسمبر-2026 إلى 19-ديسمبر-2026.
- المعالم: للتجهيز ومسح الوضع القائم تواريخ أساسية 31-مارس-2025، أي قبل ترسية العقد في 25-يناير-2026. توريد المواد طويلة الأجل مُعلَّم كفعلي بتاريخ 27-أكتوبر-2026، أي بعد تاريخ البيانات؛ وتذكر لوحة الملخص آخر خطة له 03-أكتوبر-2026 بينما تذكر ورقة Milestones 27-أكتوبر-2026. يُظهر عمود التغيير 0 يوم لتوريد المواد قصيرة الأجل والمستودع والمسجد، رغم أن توقعاتها تسبق الخطة الأساسية بـ 54 إلى 66 يوماً.
- منحنى S: تقسم ورقة Physical-Chart Data ساعات العمل المكتسبة على 241,519.85 (إجمالي الخطة المضغوطة) من أبريل إلى سبتمبر، وعلى 224,320 لشهر أكتوبر. يستخدم هذا التقرير 224,320، وهي الميزانية في ورقة Progress، لكل الأشهر؛ وبنسب الورقة نفسها يكون سبتمبر 88.4% بدلاً من 95.2%.
- استُخدم أحدث تقرير أسبوعي فقط. تظهر كميات هذا الأسبوع بالرمز "–" لعدم وجود أرقام الأسبوع السابق في التقرير، ويتضمن جدول منحنى S هذا الأسبوع فقط.
- الأسفلت: تُظهر ورقتا Major Quantities وLookahead الطبقتين الأساسية والسطحية منفذتين بنسبة 100%، لكن ورقة Procurement تُدرجهما "جاهزة للتوريد" ومخطط ورقة Project Summary يُظهر الطبقة السطحية "لم تبدأ". خانات المخطط حتى تاريخه فارغة وعمود الانحراف يُظهر الكمية كاملة.
- التوريدات: تُظهر ورقة Procurement توريد 86 من 108 بنود، بينما تُظهر لوحة الملخص 95 من 95 مادة في الموقع. ولا يزال رأس الورقة يذكر "حتى 26-يوليو-2026". التشطيبات والأعمال الخاصة مُبلغ عنها مكتملة 100% رغم عدم توريد 6 من 11 بنداً للتشطيبات و2 من 3 بنود للأعمال الخاصة.
- القوى العاملة: العدد الفعلي للموظفين في أكتوبر 13 في الجدول الشهري، و16 في ملخص ورقة Manpower، و14 في لوحة التقرير الأسبوعي.
- الصحة والسلامة: تُظهر لوحة التقرير الأسبوعي حالة إسعافات أولية واحدة وحادثين وشيكين وحادث حريق واحد؛ بينما تُظهر ورقة HSE-Stat حالتي إسعافات أولية و9 حوادث وشيكة منذ بداية العام (0 تراكمي) ولا حوادث حريق.

- تحتوي الورقتان المخفيتان PV-PH وPV على بيانات القيمة المخططة لمشروع آخر (HAL1-05-1، محطة الدفاع المدني بمدينة حائل الصناعية، 2024–2025). ولم تُستخدما.
- يُظهر سجل المستخلصات قيمة عقد معدلة 21,100,000 وتكلفة متوقعة عند الإنجاز 20,900,000 وتغييرات محتملة 200,000 بجانب قيمة العقد 9,554,134. يستخدم المستخلص 1 وورقة Lookahead رقم المشروع NJR1-01-007، وتذكر ورقة Lookahead محمد الحربي مديراً للمشروع.
- توزع ورقة Project Summary قيمة العقد على المكونات بشكل مختلف عن ورقة Progress (مثلاً أعمال الموقع 1,067,430 مقابل 682,299)، رغم أن الإجمالي في كلتيهما 9,554,134. كما تعرض نسبة تقدم مخططة مبنية على التكلفة؛ ويستخدم هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي (بساعات العمل) فقط.
- سجل المشكلات وسجل المخاطر فارغان، لذا حُذف قسم المشكلات والمخاطر. تقييم الجودة الأسبوعي 0.8878 في كل أسبوع منذ أبريل. تُظهر عدة خلايا في الملخص الخطأ #REF!.
- الملف هو "Weekly Report #29"؛ ويستخدم هذا التقرير أسبوع المشروع 33 (عدد الأيام منذ تسليم الموقع مقسوماً على 7)، وهو ما يطابق "Current Contract Weeks: 33 of 44" في ورقة Milestones.
