تطوير شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بسدير المرحلة الثالثة

Infrastructure Network Development, Sudair City for Industry and Business

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة تطوير التقنية للمقاولات (TDC)	إيجيس (EGIS)	م. زياد الشبات	06-Jan-2026	05-Jul-2027

النطاق: أعمال الطرق والرصف، وشبكات مياه الشرب والمياه المعالجة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والري وتنسيق المواقع، والشبكة الكهربائية (الجهد المتوسط والاتصالات وإنارة الطرق) وكاميرات المراقبة في المنطقتين A وG، خلال 18 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في 19-أكتوبر-2026 بلغت نسبة الإنجاز 45.4% مقابل 40.7% مخططاً، أي أن المشروع متقدم بنسبة 4.8% (مؤشر الأداء الزمني 1.12). وأنجز هذا الأسبوع 0.64% مقابل 1.56% مخططاً، فتقلص التقدم من 5.7% إلى 4.8%. أعمال الطرق وشبكتا السيول والصرف الصحي متقدمة، بينما التوريدات والتصميم الهندسي متأخران.

نسبة الإنجاز الفعلي
45.4% / 40.7% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.12 +4.8%

التقدم هذا الأسبوع
+0.64% / +1.56%
مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.92%

المدة المنقضية من العقد
52.5% · اليوم 286 من 545
● انتهاء P6: 05-يوليو-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
14.6% · 24.6 مليون ريال
4 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

المشروع متقدم إجمالاً، لكن التقدم يتقلص والتوريدات متأخرة.

جاء تقدم هذا الأسبوع (0.64%) أقل بكثير من الخطة الأسبوعية (1.56%). التوريدات عند 60.1% مقابل 99.2% مخططاً (مؤشر الأداء 0.61): لم تُورَّد بعد تمديدات الجهد المتوسط (0 من 51,500 م) ولا المحطات الفرعية ولا أعمدة الإنارة ولا لوحات الإنارة، ولا يزال الموقع النهائي للمحطة الفرعية بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء. ويُنهي تحديث P6 المشروع في تاريخ العقد 05-يوليو-2027 بفائض زمني صفر.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة "Weekly Progress Photos" في التقرير الأسبوعي بتاريخ 19-أكتوبر-2026. صورة البردورات وحدها تحمل ختم الكاميرا (17-أكتوبر-2026). غلبت أعمال الطرق على هذا الأسبوع: تسوية طبقة الأساس، والطبقة التمهيدية، وطبقة الأساس الإسفلتية، والبردورات في المنطقتين A وG. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



طبقة الأساس الإسفلتية، MC20 المنطقة A

فرش الطبقة الإسفلتية الأولى لطبقة الأساس.



تسوية طبقة الأساس، MC10 المنطقة A

تسوية الطبقة الأولى من طبقة الأساس على الطريق الشرياني.



الطبقة التمهيدية (MC1)، MC20 المنطقة A

رش MC1 على طبقة الأساس.



خرسانة البردورات، MCZ0 المنطقة G

صب الخرسانة للبردورات. ختم الكاميرا 17-أكتوبر-2026، 10:38.



دمك الأسفلت، MCE0 المنطقة G

دحّال يدمك طبقة الأساس الإسفلتية.




فرش الأسفلت، MCE0 المنطقة G

فرّادة تفرش الطبقة الإسفلتية الأولى لطبقة الأساس.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، بنقاط شهرية مؤرخة في اليوم السادس من كل شهر.
المصدر: ورقة Physical-Chart Data. لا توجد خطة معدلة.

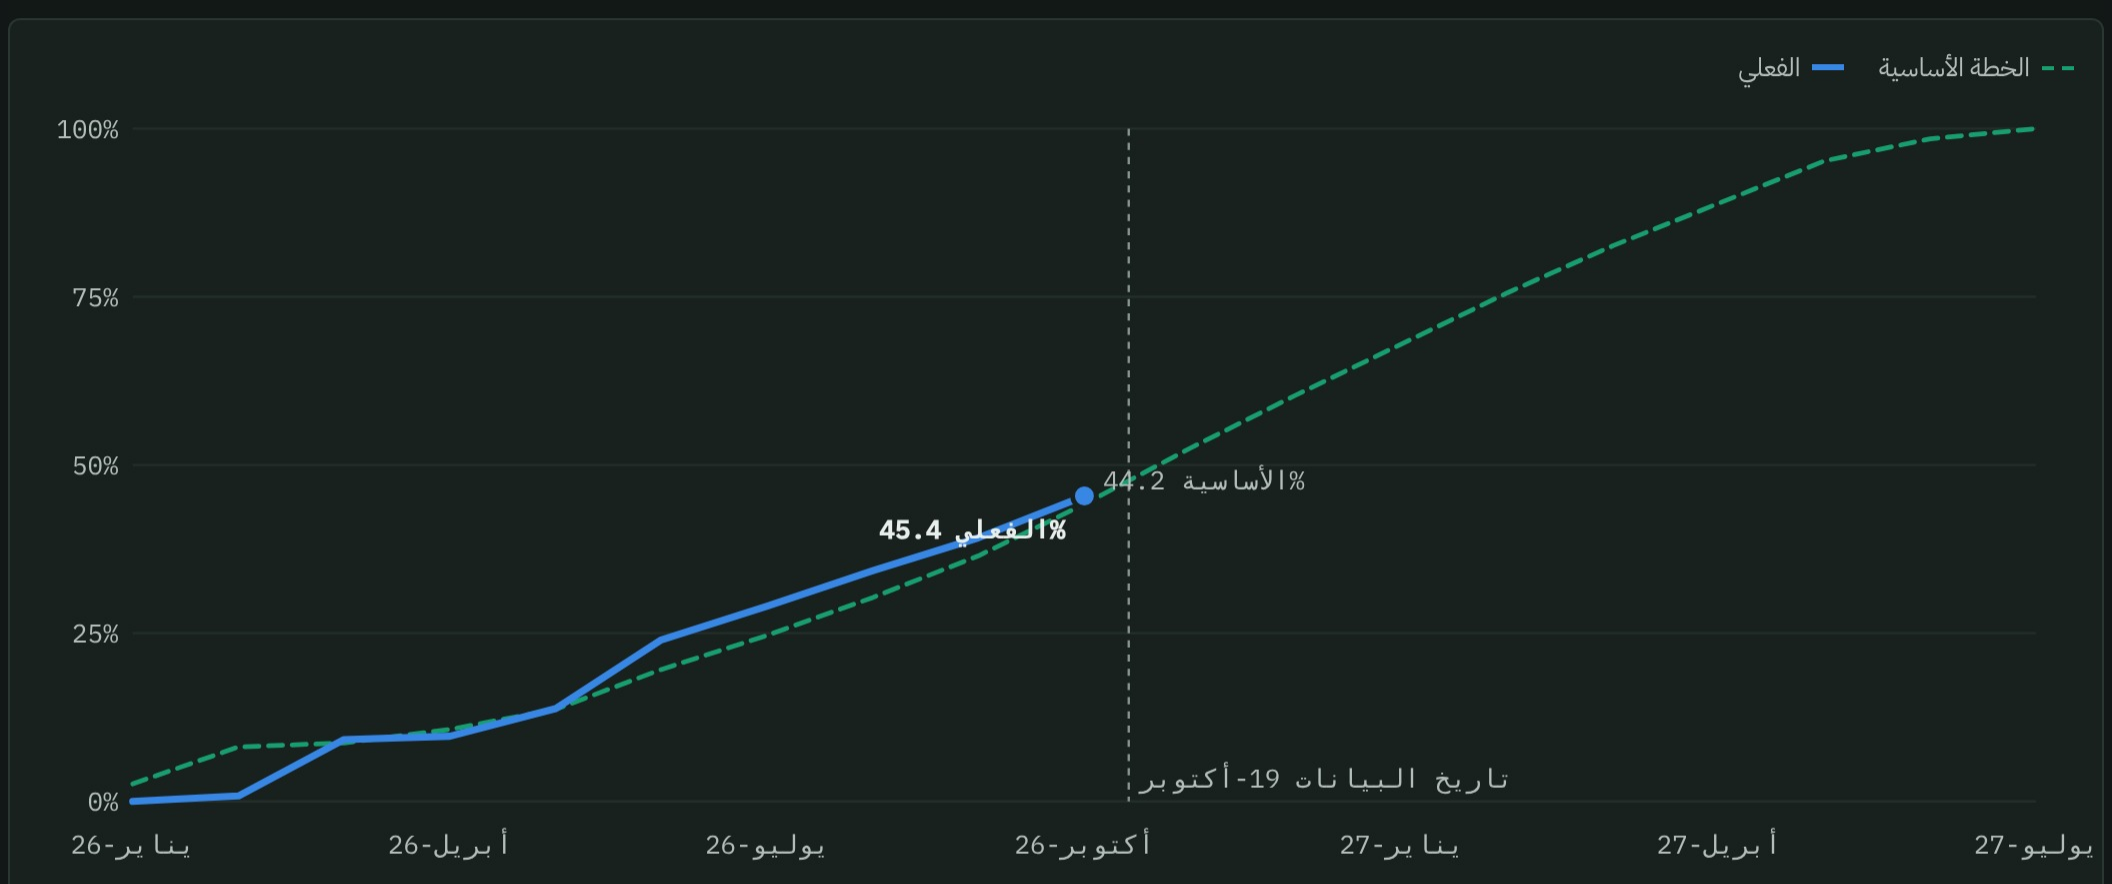

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
12-Oct-2026	39.10	44.79	+5.69	–	1.15
19-Oct-2026	**40.66**	**45.43**	**+4.77**	**+0.64**	**1.12**

استُخدم تقرير 19-أكتوبر-2026 فقط. صف 12-أكتوبر-2026 هو قيمة الأسبوع السابق الواردة في ذلك التقرير (حتى تاريخه ناقص هذا الأسبوع)، ولا تظهر الأسابيع الأقدم. نقطة أكتوبر في المنحنى (44.2% مخطط) مؤرخة 06-أكتوبر، بينما يخطط التقرير الأسبوعي 40.7% حتى 19-أكتوبر؛ انظر ملاحظات على البيانات.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. صفوف الشبكات جزء من التنفيذ، وأوزانها حصص من المشروع كاملاً. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5%	100.0%	93.4%	−6.6%	0.93	▼ متأخر
التوريدات	13%	99.2%	60.1%	−39.1%	0.61	▼ متأخر
التنفيذ	75%	26.4%	39.9%	+13.6%	1.51	▲ متقدم
· أعمال الطرق	16.4%	72.2%	80.6%	+8.3%	1.12	▲ متقدم
· تصريف مياه الأمطار	16.5%	20.7%	44.0%	+23.3%	2.13	▲ متقدم
· الصرف الصحي	5.5%	5.8%	72.6%	+66.8%	12.50	▲ متقدم
· المياه المعالجة	7.7%	0.0%	6.1%	+6.1%	–	▲ بدأ مبكراً
· مياه الشرب	12.3%	0.0%	14.2%	+14.2%	–	▲ بدأ مبكراً
· الأعمال الكهربائية	8.7%	43.8%	33.2%	−10.6%	0.76	▼ متأخر
· تنسيق المواقع والري	6.8%	0.0%	4.7%	+4.7%	–	▲ بدأ مبكراً
· كاميرات المراقبة	1.2%	34.0%	12.2%	−21.8%	0.36	▼ متأخر
الاختبار والتشغيل	2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإغلاق	2%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**40.7%**	**45.4%**	**+4.8%**	**1.12**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 19-أكتوبر-2026) عدد 2,115 نشاطاً: 787 مكتملاً و300 قيد التنفيذ و1,028 لم يبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 05-يوليو-2027، وهو تاريخ انتهاء العقد.

نطاق العمل: الكميات

الكمية المنفذة في الموقع للبنود الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 19-أكتوبر-2026. لا يقسّم التقرير الكميات حسب المنطقة ولا يذكر رقم الأسبوع السابق، لذا يظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بالرمز "–". جدول النطاق في صفحة الملخص يُظهر 0 منفذاً لكل الشبكات ولم يُستخدم.

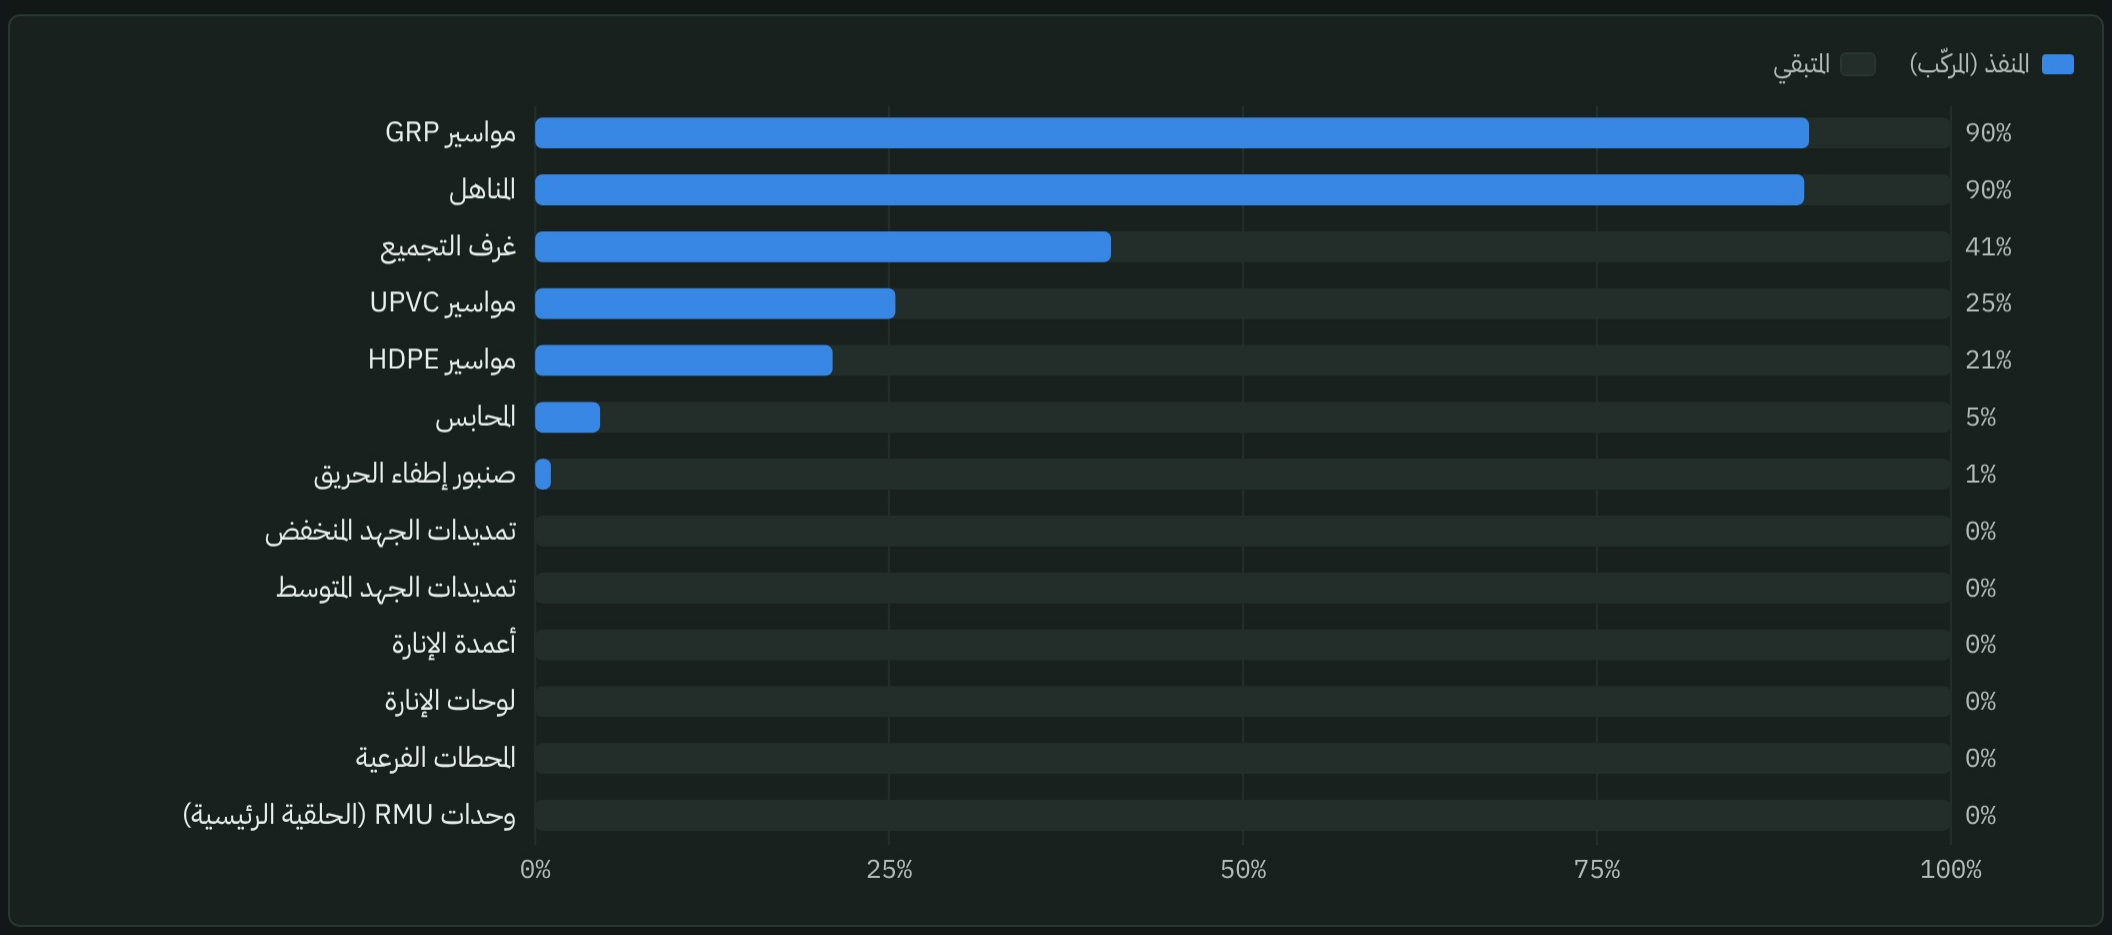

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الرديم
مواسير GRP	جميع المناطق	م	18,337	16,500	–	1,837	90.0%	–
المناهل	جميع المناطق	عدد	251	225	–	26	89.6%	–
غرف التجميع	جميع المناطق	عدد	295	120	–	175	40.7%	–
مواسير UPVC	جميع المناطق	م	4,716	1,200	–	3,516	25.4%	–
مواسير HDPE	جميع المناطق	م	28,557	6,000	–	22,557	21.0%	–
المحابس	جميع المناطق	عدد	218	10	–	208	4.6%	–
صنبور إطفاء الحريق	جميع المناطق	عدد	90	1	–	89	1.1%	–
تمديدات الجهد المنخفض	جميع المناطق	م	68,400	0	–	68,400	0.0%	–
تمديدات الجهد المتوسط	جميع المناطق	م	51,500	0	–	51,500	0.0%	–
أعمدة الإنارة	جميع المناطق	عدد	592	0	–	592	0.0%	–
لوحات الإنارة	جميع المناطق	عدد	52	0	–	52	0.0%	–
المحطات الفرعية	جميع المناطق	عدد	5	0	–	5	0.0%	–
وحدات RMU (الحلقية الرئيسية)	جميع المناطق	عدد	11	0	–	11	0.0%	–

الشبكات الرطبة متقدمة

مواسير GRP مركّبة بنسبة 90% (16,500 من 18,337 م) والمناهل 90% (225 من 251). غرف التجميع عند 41%، ومواسير UPVC عند 25%، ومواسير HDPE عند 21%.

لم تبدأ أو بالكاد بدأت

صنبور إطفاء الحريق (1 من 90) والمحابس (10 من 218) بالكاد بدأت. لم يُركّب بعد أي من تمديدات الجهد المنخفض أو المتوسط أو أعمدة الإنارة أو لوحات الإنارة أو المحطات الفرعية أو وحدات RMU.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 تواريخ مختلفة لعدة معالم. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول.
تواريخ الخطة الأساسية لآخر أربعة معالم تعاقدية مأخوذة من الجدول الأساسي المعتمد.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	06-Jan-2026	06-Jan-2026	06-Jan-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	05-Feb-2026	05-Feb-2026	06-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم الخطة الأساسية	05-Feb-2026	06-Apr-2026 (+60 يوماً)	06-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
مختبر الجودة	05-Feb-2026	16-Feb-2026 (+11 يوماً)	–	–	✓ منجز
RBF	05-Feb-2026	16-Feb-2026 (+11 يوماً)	–	–	✓ منجز
التقديمات الفنية (المخططات والمواد)	05-Mar-2026	16-Aug-2026 (+164 يوماً)	25-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
انتهاء مرحلة التصميم الهندسي	05-Mar-2026	28-Sep-2026 (+207 يوماً)	19-Oct-2026	83	▼ متأخر
انتهاء مرحلة التوريدات	23-Jan-2027	17-Jan-2027	22-Dec-2026	36	● في المسار
اكتمال أعمال الجهد المتوسط	21-Jan-2027	–	18-Feb-2027	27	▼ معرّض للتأخير
اكتمال جميع أعمال الشبكات	04-May-2027	–	14-Apr-2027	65	● في المسار
اكتمال أعمال الطرق	14-Apr-2027	–	17-Apr-2027	18	● يوجد فائض زمني
اكتمال أعمال التشطيبات	05-Jul-2027	–	27-Jun-2027	7.7	● في المسار
انتهاء المشروع (جميع الأعمال)	05-Jul-2027	05-Jul-2027	05-Jul-2027	0	● في الموعد

يختلف التقرير الأسبوعي وتحديث P6 في تواريخ أربعة معالم.

انتهى التجهيز في 05-فبراير-2026 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 06-أبريل-2026 حسب P6. وانتهت التقديمات الفنية في 16-أغسطس-2026 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 25-يوليو-2026 حسب P6. ويتوقع التقرير الأسبوعي انتهاء مرحلة التصميم الهندسي في 28-سبتمبر-2026، بينما لا تزال مفتوحة في P6 حتى 19-أكتوبر-2026. وتنتهي التوريدات في 17-يناير-2027 حسب التقرير الأسبوعي، وفي 22-ديسمبر-2026 حسب P6. وتنتهي أعمال الجهد المتوسط بعد خطتها الأساسية بـ28 يوماً، ولم يبقَ أي فائض زمني لانتهاء المشروع.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ورقة Major Quantities؛ والأسفلت والإنترلوك والبردورات من نسبة الإنجاز في ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 19-أكتوبر-2026.

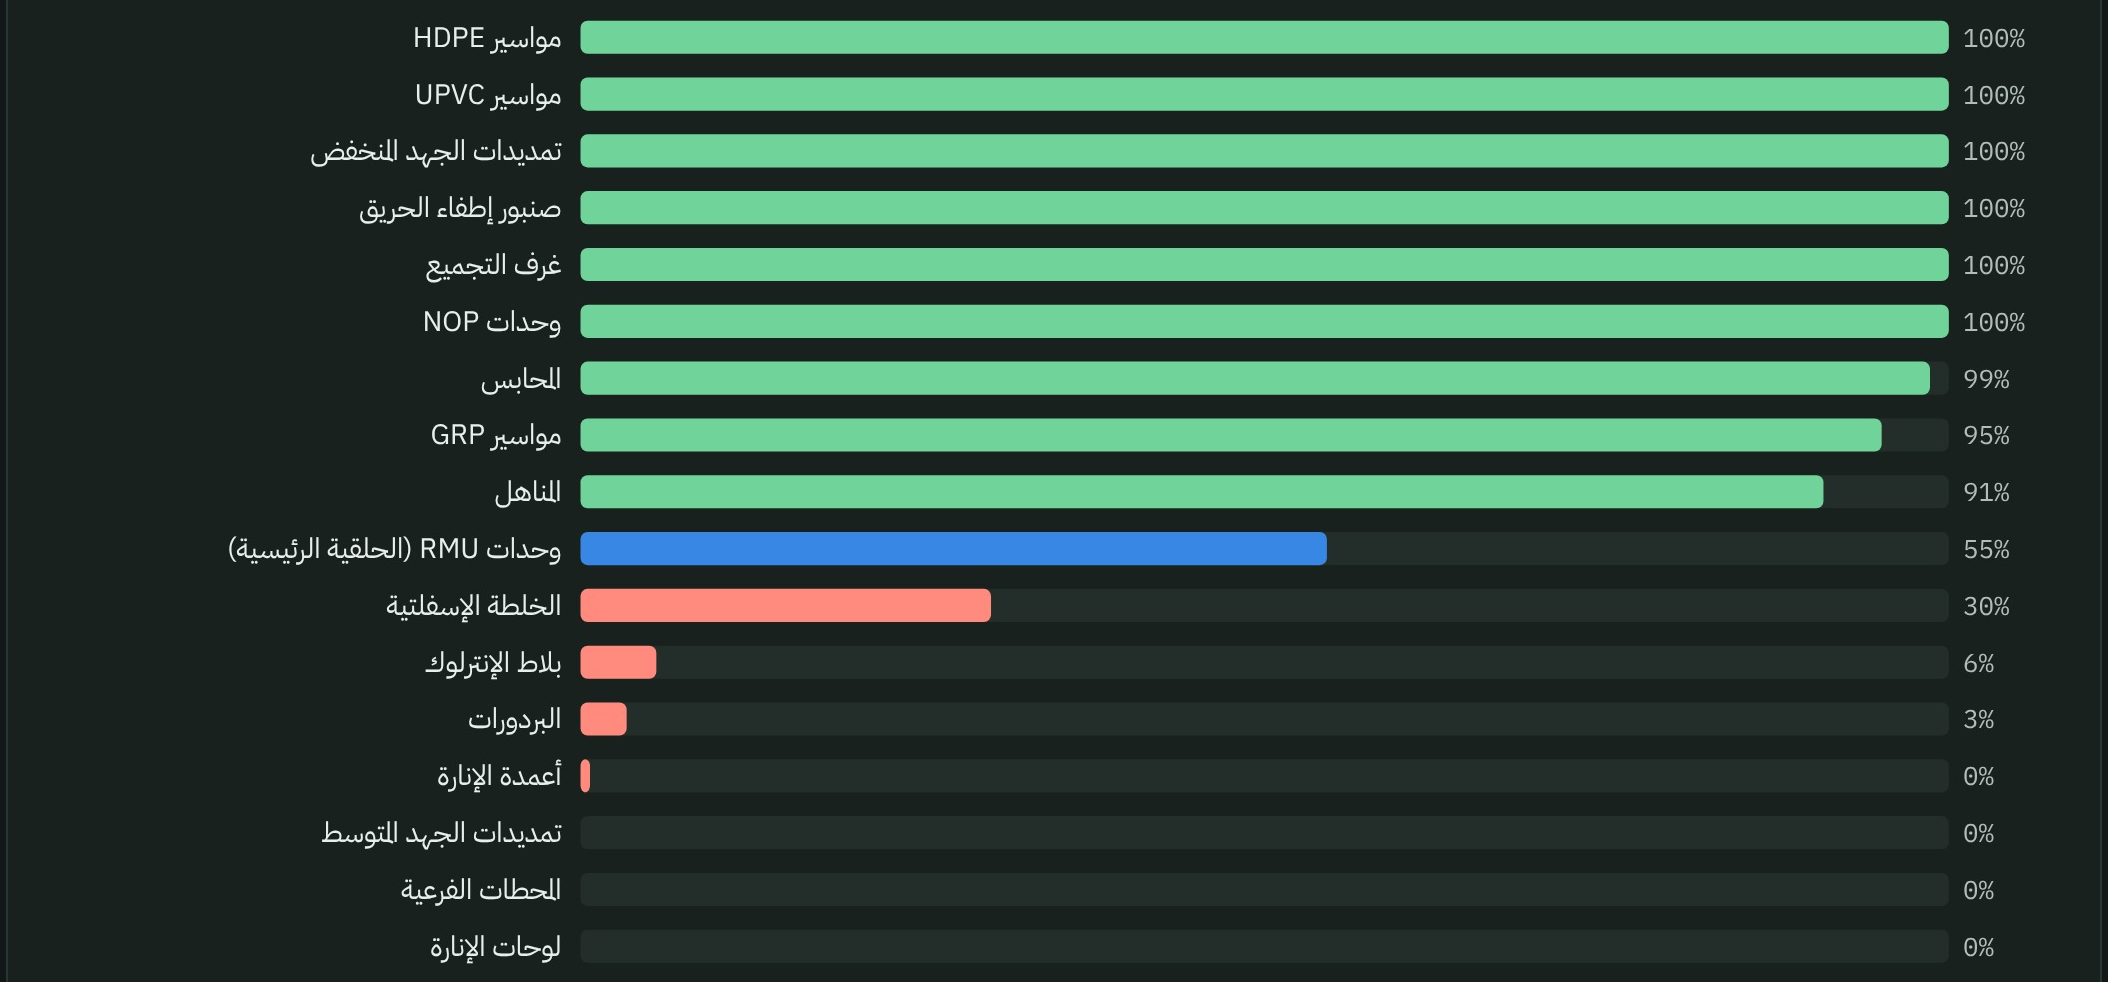

تمديدات الجهد المتوسط: لم يُورَّد شيء


0 من 51,500 م. تُظهر ورقة Procurement أن اعتماد المادة لم يُقدَّم، وأن الموعد المطلوب لوصولها إلى الموقع 31-مايو-2026. ويذكر سجل المخاطر أن التمديدات تم شراؤها، وأن الموقع النهائي للمحطة الفرعية لا يزال بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء.

الإنارة والمحطات الفرعية ومواد الرصف

أعمدة الإنارة الموّردة 1 من 592، ولوحات الإنارة 0 من 52، والمحطات الفرعية 0 من 5 (لم يُقدَّم الاعتماد). البردورات موّردة بنسبة 3.4%، والإنترلوك 5.5%، والخلطة الإسفلتية 30%.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمالة الميدانية وغير الميدانية)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

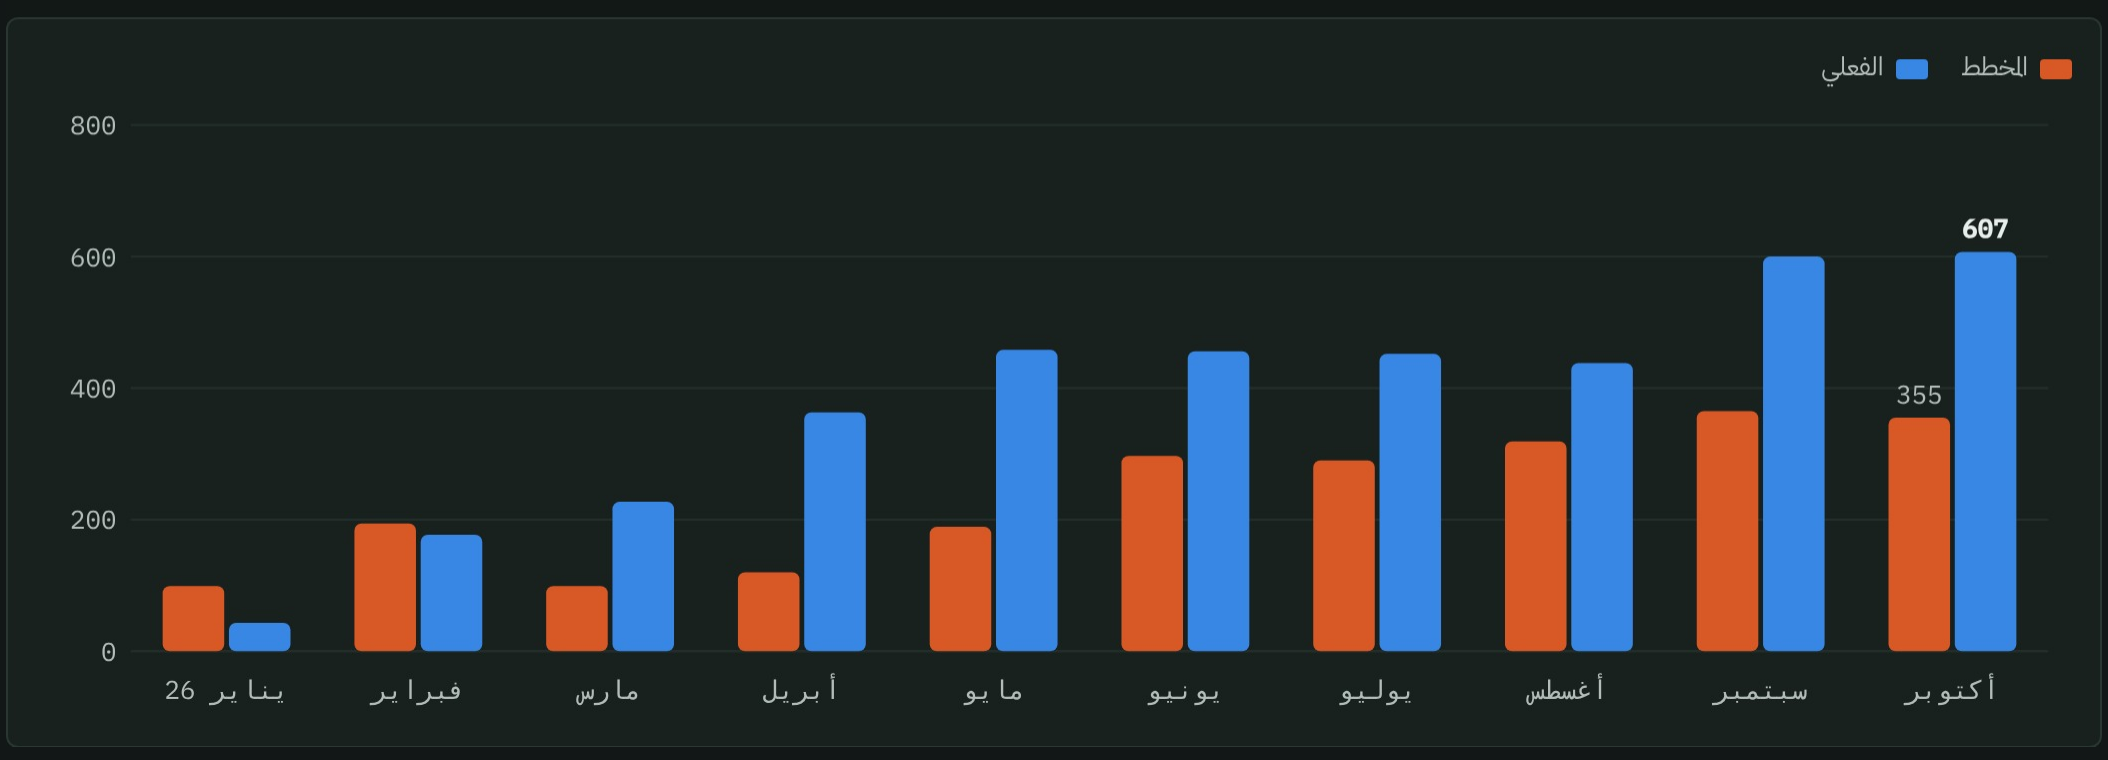

عدد العمالة في أكتوبر 607 (540 ميدانية و67 غير ميدانية) مقابل 355 مخططاً (+71%). العدد الفعلي أعلى من المخطط كل شهر منذ فبراير. ويوجد في الموقع أيضاً 332 معدة مقابل 200 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الطرق	88,002,863
شبكة تصريف مياه الأمطار	25,405,198
الأعمال الكهربائية	20,082,302
أعمال كاميرات المراقبة	9,305,708
شبكة مياه الشرب	7,779,405
شبكة الصرف الصحي	7,071,027
تنسيق المواقع والري	6,835,461
شبكة المياه المعالجة	4,147,557
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**168,629,520**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	193,923,948
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. إجمالي جدول الكميات مع ضريبة 15% يطابق قيمة العقد. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	4
القيمة الإجمالية	24,575,402
استرداد الدفعة المقدمة (10%)	-2,457,540
المحتجزات	0
الخصومات والغرامات	-34,000
ضريبة القيمة المضافة	3,317,679
الصافي شاملاً الضريبة	25,401,542
معتمد من مدير المشروع / مدفوع	0 / 0
الدفعة المقدمة (10%)	16,862,952

المفوتر 14.6% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 45.4%. يُظهر سجل المستخلصات أن أياً من المستخلصات الأربعة لم يُعتمد من مدير المشروع ولم يُدفع بعد؛ ويغطي أولها الأعمال حتى 28-يونيو-2026.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة

التقييم 81.8%

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	900,536
ساعات العمل هذا الأسبوع	36,720
ساعات العمل هذا الشهر	98,080
التدريبات الداخلية (تراكمي)	55
اجتماعات التوعية (تراكمي)	41
تقييم تفتيش السلامة من الاستشاري	80.7%
ملاحظات السلامة المسجلة / المغلقة	13 / 13

جميع ساعات العمل مسجلة كساعات آمنة. لا يذكر التقرير أعداد الحوادث بوضوح.

الجودة

التقييم 81.3%

تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة / المفتوحة	21 / 16 / 5
تعليمات الموقع الصادرة / المفتوحة	7 / 2
طلبات فحص المواد الصادرة / المفتوحة	235 / 1
طلبات الفحص الميداني الصادرة / المفتوحة	3,781 / 61
المخططات التنفيذية المقدمة / المعالجة	420 / 339
مخططات تنفيذية معلقة لدى الاستشاري	21
اعتمادات المواد المعالجة	60 من 64

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
موقع المحطة الفرعية (الجهد المتوسط)	المالك / الشركة السعودية للكهرباء	لا يزال الموقع النهائي للمحطة الفرعية بانتظار التأكيد بين المالك والشركة السعودية للكهرباء. حُسم مقاس تمديدات الجهد المتوسط بطلب استيضاح (أُجيب في 09-فبراير-2026)، وينفذ المقاول مجاري عبور الطرق لتمديدات الجهد المتوسط على مسؤوليته. قد يؤثر استمرار التأخير على الاختبار والتشغيل والتسليم. التصنيف: مرتفع (5 × 5).
اعتماد مقترح تنسيق المواقع	المالك	مقترح تنسيق المواقع (RFI-0036، 23-أغسطس-2026) بانتظار اعتماد المالك، وهو مطلوب لإنهاء المخططات التنفيذية لتنسيق المواقع وتوريد المواد. التصنيف: متوسط.
التوريدات متأخرة عن الخطة	المقاول	التوريدات عند 60.1% مقابل 99.2% مخططاً. لم يُقدَّم بعد اعتماد تمديدات الجهد المتوسط والمحطات الفرعية وعدادات الكهرباء وسياج الأعمال الكهربائية وتخطيط الطرق.
التصميم الهندسي لم يُغلق	المقاول	التصميم الهندسي عند 93.4% مقابل 100% مخططاً، مع 21 مخططاً تنفيذياً معلقاً لدى الاستشاري و5 تقارير عدم مطابقة مفتوحة.

جميع ملاحظات السلامة الـ13 في سجل المشكلات (من 08-سبتمبر إلى 17-أكتوبر-2026) و16 من أصل 18 خطراً في السجل مغلقة.

ملاحظات على البيانات

- تسمي الملفات المرفوعة المشروع "المرحلة الثانية – الجزء الثاني" (SUD1-02-011)، بينما يسميه مجلد المستودع وسجل المشاريع المرحلة الثالثة.
- تُظهر ورقة الملخص 39.12% مخططاً و48.30% فعلياً، وهذه أرقام القيمة المكتسبة (التكلفة)؛ أما التقدم الفعلي المستخدم في هذا التقرير فهو 40.66% مخططاً و45.43% فعلياً.
- تخطط ورقة Physical-Chart Data نسبة 44.2% عند نقطة أكتوبر (06-أكتوبر)، وهي أعلى من 40.66% المخططة حتى 19-أكتوبر في الورقة الرئيسية، كما تضع الفعلي في 19-أكتوبر (45.43%) على نقطة 06-أكتوبر.
- تترك الورقة الرئيسية التقدم الفعلي للأعمال الكهربائية وتنسيق المواقع وكاميرات المراقبة فارغاً، فاستُخدمت ساعات العمل في ورقة Progress. كما تُظهر قيم جدول الكميات لكاميرات المراقبة في المنطقتين A وG مبلغ 46,056 و2 ريال بدلاً من 6,513,996 و2,791,854.
- تختلف أعداد الأنشطة: في تحديث P6 عدد 787 مكتملاً و300 قيد التنفيذ و1,028 لم يبدأ؛ وفي لوحة الجدول بالتقرير الأسبوعي 711 و352 و1,052 (وتُظهر الورقة الرئيسية 144 قيد التنفيذ).
- يضع التقرير الأسبوعي تاريخ الخطة الأساسية لانتهاء التوريدات في 23-يناير-2027، بينما يحدده الجدول الأساسي المعتمد في 21-نوفمبر-2026.
- يُظهر جدول النطاق في صفحة الملخص 0 منفذاً لكل الشبكات، وتختلف إجمالياته عن ورقة Conclusion المخفية (مثلاً الطرق 15,234 م مقابل 18,252 م). والمناهل موسومة بالمتر في ورقة Major Quantities لكنها معدودة بالوحدة.
- تختلف أرقام التوريدات: أعمدة الإنارة 590 وحدة بنسبة 10% في ورقة Procurement، لكنها 592 وحدة وُرِّد منها 1 في Major Quantities؛ وتمديدات الجهد المنخفض 29,700 م مقابل 68,400 م. وتمديدات الجهد المتوسط "لم تُقدَّم" في التوريدات، بينما يذكر سجل المخاطر أنه تم شراؤها.
- عدد العمالة المخطط لأكتوبر 355 في الجدول الشهري (327 ميدانية و28 غير ميدانية)، لكنه 335 في لوحة العمالة (300 ميدانية و35 غير ميدانية).
- تُظهر عدة خلايا أخطاء !REF# (التكلفة المتوقعة عند الإنجاز، وتقييمات المخاطر، وتقييم السلامة في تقييم الحالة). ويحمل خطر المحطة الفرعية قيمة 6,835,460.61 ريال، وهي قيمة تنسيق المواقع في جدول الكميات.
- استُخدم تقرير 19-أكتوبر-2026 فقط. لا يذكر التقرير المنجز الأسبوعي للأسابيع السابقة ولا كميات هذا الأسبوع، لذا تظهر بالرمز "–". رقم أسبوع التقرير هو أسبوع العقد الذي يذكره التقرير (41 من 78)؛ وعدد الأسابيع الكاملة منذ تسليم الموقع 40.

أُعدّ في 28-أكتوبر-2026 من التقرير الأسبوعي للأسبوع المنتهي في 19-أكتوبر-2026، مع تحديث P6 والجدول الأساسي المرفوعين معه.
