مبادرة الملاعب بالمنطقة الشرقية (عرعر, واحة الاحساء, الدمام الثانية)

Playground Initiative for Eastern Region (Arar, Hasa Oasis, Dammam 2nd)

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة بروفاست المحدودة	إيجيس (EGIS)	م. محمد العيسى	03-Mar-2026	02-Jan-2027

النطاق: ملاعب كرة قدم وكرة سلة وبادل، وقبة هوائية، ومبنى خدمات ودورات مياه، وأعمال تنسيق المواقع، ومواقف سيارات، ومسارات للدراجات والمشي في ثلاثة مواقع: واحة الأحساء، والمدينة الصناعية الثانية بعرعر، والمدينة الصناعية الثانية بالدمام.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ المشروع 59.2% مقابل 58.9% مخططاً، أي متقدم بنسبة 0.3% على الخطة الحالية (مؤشر الأداء الزمني 1.01). وأنجز 3.9% هذا الأسبوع مقابل 5.2% مخططاً، أي أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.3%. كما عدّل التقرير رقم الأسبوع الماضي من 53.9% إلى 55.3%. وأعمال التنفيذ في واحة الأحساء متقدمة (64.5% مقابل 53.6% مخططاً)، بينما موقع عرعر متأخر بنسبة 1.3% والتوريدات متأخرة بنسبة 18.7%.

نسبة الإنجاز الفعلي
59.2% / 58.9% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.01 +0.3%

التقدم هذا الأسبوع
+3.9% / +5.2% مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.3%

المدة المنقضية من العقد
80.0% · اليوم 244 من 305
▼ الانتهاء المتوقع 27-فبراير-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
15.0% · 4.50 مليون ريال
6 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 20-أكتوبر-2026

يُتوقع انتهاء المشروع متأخراً 56 يوماً.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026) انتهاء المشروع في 27-فبراير-2027، مقابل تاريخ انتهاء العقد 02-يناير-2027، أي قبل توقع الأسبوع الماضي (14-مارس-2027) بـ 15 يوماً. ويُظهر P6 فائضاً زمنياً –46 يوماً على انتهاء المشروع و258 نشاطاً مفتوحاً بفائض سالب مقابل 268 في الأسبوع الماضي. ومعالم اكتمال المواقع الثلاثة متوقعة بين 11 فبراير و27-فبراير-2027. ويبقى توريد القبة الهوائية سبب التأخير المذكور في الملخص الأسبوعي. وكانت الخطة الأساسية الأصلية تستهدف 85.7% بنهاية أكتوبر و91.5% بنهاية نوفمبر.

صور الموقع هذا الأسبوع

أربع صور من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026، أما الصورتان الأخريان فعرضهما أقل من 600 بكسل فلم تُعرضا. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



الواجهة الزجاجية لمبنى الخدمات، عرعر

تركيب الواجهة الزجاجية والمدخل في مبنى دورات المياه والخدمات.



أعمدة الإنارة، عرعر

تركيب أعمدة الإنارة في أرجاء الموقع. مختومة 02-نوفمبر-2026، 09:00، عرعر.



زراعة الأشجار، واحة الأحساء

زراعة الأشجار في أحواض التشجير المحاطة بالبردورات. ختم الموقع: الهفوف، الأحساء، والتاريخ غير مقروء.




بلاط الإنترلوك، الدمام

جارٍ تركيب الإنترلوك بين الملاعب.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة) بقيم نهاية كل شهر، وآخر نقطة فعلية عند تاريخ البيانات 2 نوفمبر. المصدر: ورقتا Physical-Chart Data وWeekly Progress Report، التقرير الأسبوعي 02-نوفمبر-2026.

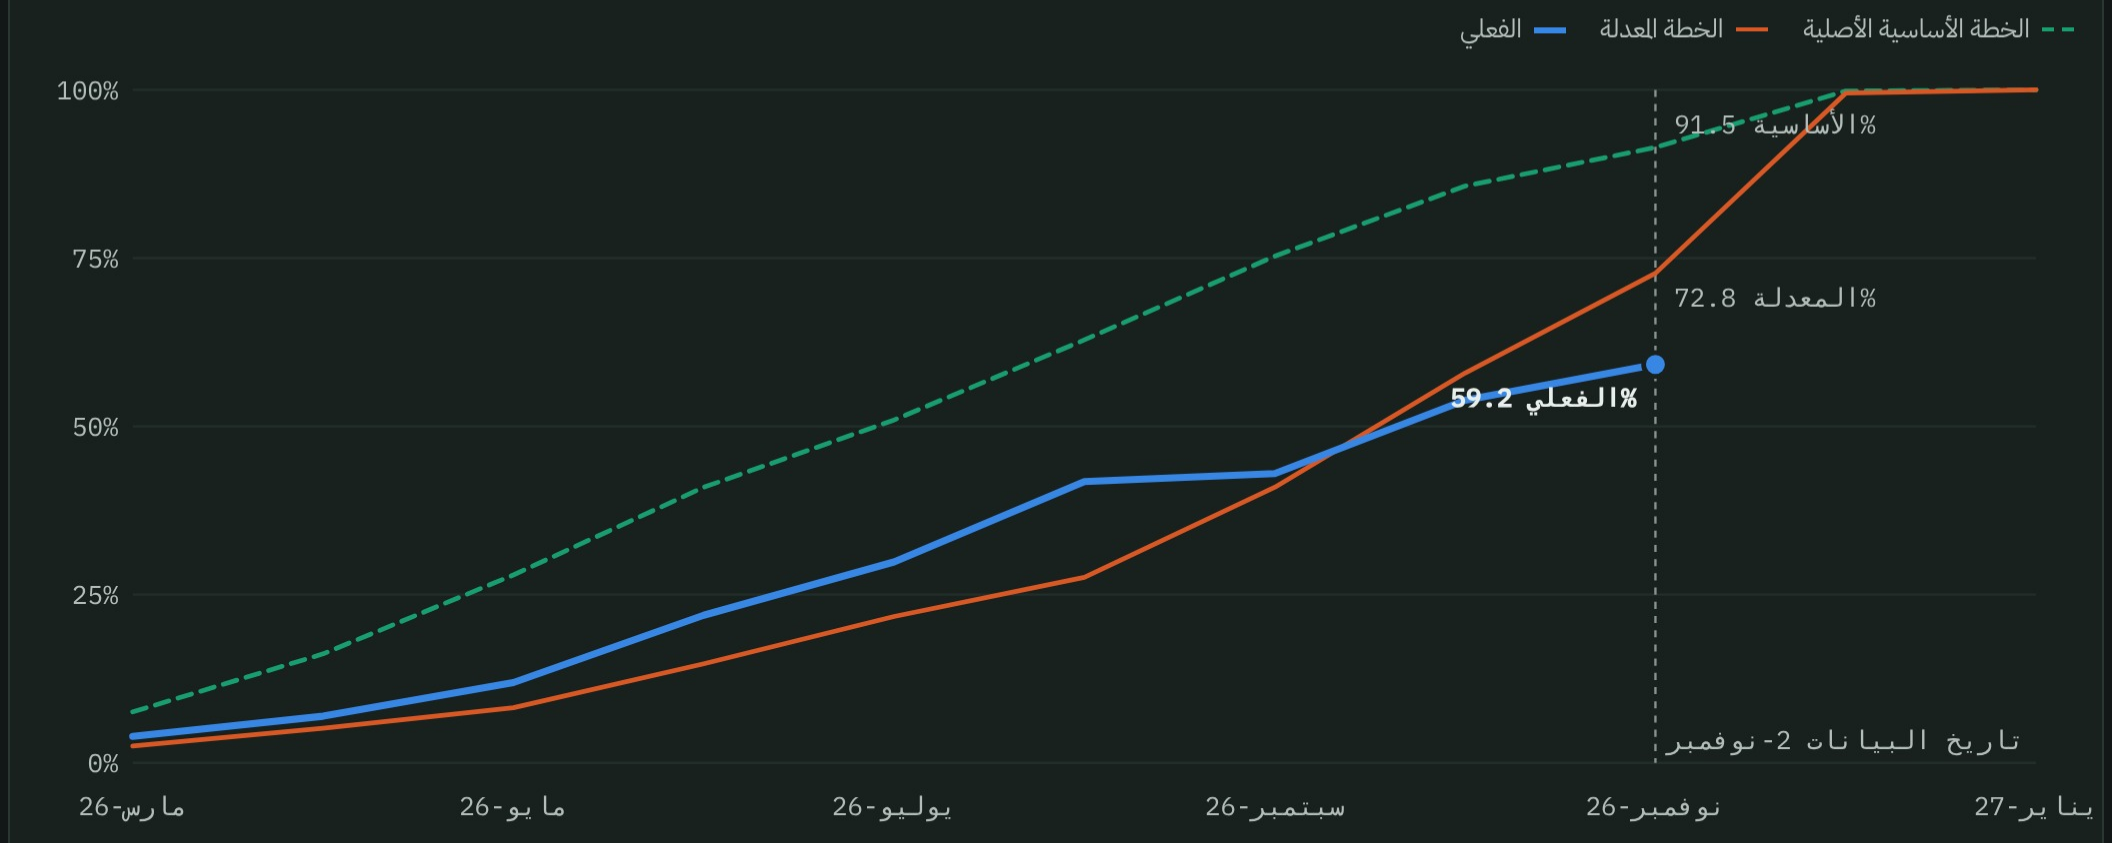

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
05-Oct-2026	—	46.0	—	+3.0	—
12-Oct-2026	—	46.9	—	+0.9	—
19-Oct-2026	50.1	50.3	+0.2	+3.4	1.00
26-Oct-2026	53.7	53.9	+0.2	+3.6	1.00
26-أكتوبر-2026 (معدّل)	53.7	55.3	+1.6	—	1.03
02-Nov-2026	**58.9**	**59.2**	**+0.3**	**+3.9**	**1.01**

الصفوف حتى 26 أكتوبر مأخوذة من تقرير الأسبوع الماضي (ملفات W05). ورقم هذا الأسبوع حتى تاريخه يساوي مستخرج P6، بينما أعطى تقرير الأسبوع الماضي 53.9% ومستخرج P6 فيه 55.3%، لذا يُقاس إنجاز هذا الأسبوع من القيمة المعدلة 55.3%. ومقارنة بـ 53.9% المعلنة في الأسبوع الماضي يبلغ التغير +5.3%.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Weekly Progress Report بتاريخ 02-نوفمبر-2026.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5.0%	97.8%	99.2%	+1.4%	1.01	▲ متقدم
التوريدات	12.0%	84.0%	65.4%	−18.7%	0.78	▼ متأخر
التنفيذ	75.0%	54.5%	57.8%	+3.4%	1.06	▲ متقدم
التنفيذ: عرعر	24.9%	54.2%	53.0%	−1.3%	0.98	▼ متأخر قليلاً
التنفيذ: واحة الأحساء	25.0%	53.6%	64.5%	+11.0%	1.20	▲ متقدم
التنفيذ: الدمام	25.0%	55.7%	56.0%	+0.4%	1.01	● وفق الخطة
الاختبار والتشغيل	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	○ لم يبدأ
الإقفال	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	–	○ لم يبدأ
الإجمالي	100%	**58.9%**	**59.2%**	**+0.3%**	**1.01**	● وفق الخطة

حسب الموقع، شاملاً جميع المراحل: عرعر 56.5% مقابل 60.1% مخططاً، وواحة الأحساء 65.3% مقابل 60.2%، والدمام 59.4% مقابل 59.9%. ويضم تحديث P6 عدد 2,150 نشاطاً: 1,835 مكتملاً و30 قيد التنفيذ و285 لم تبدأ. وتاريخ انتهائه المجدول 27-فبراير-2027، أي بعد تاريخ العقد بـ 56 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والكمية المنفذة حتى تاريخه لبنود جدول الكميات الرئيسية، للمواقع الثلاثة مجتمعة، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026. ولا تفصل الورقة الكميات حسب الموقع. و"المنفذ هذا الأسبوع" هو الفرق عن تقرير 26-أكتوبر-2026، وجميع الكميات في الورقة لم تتغير.

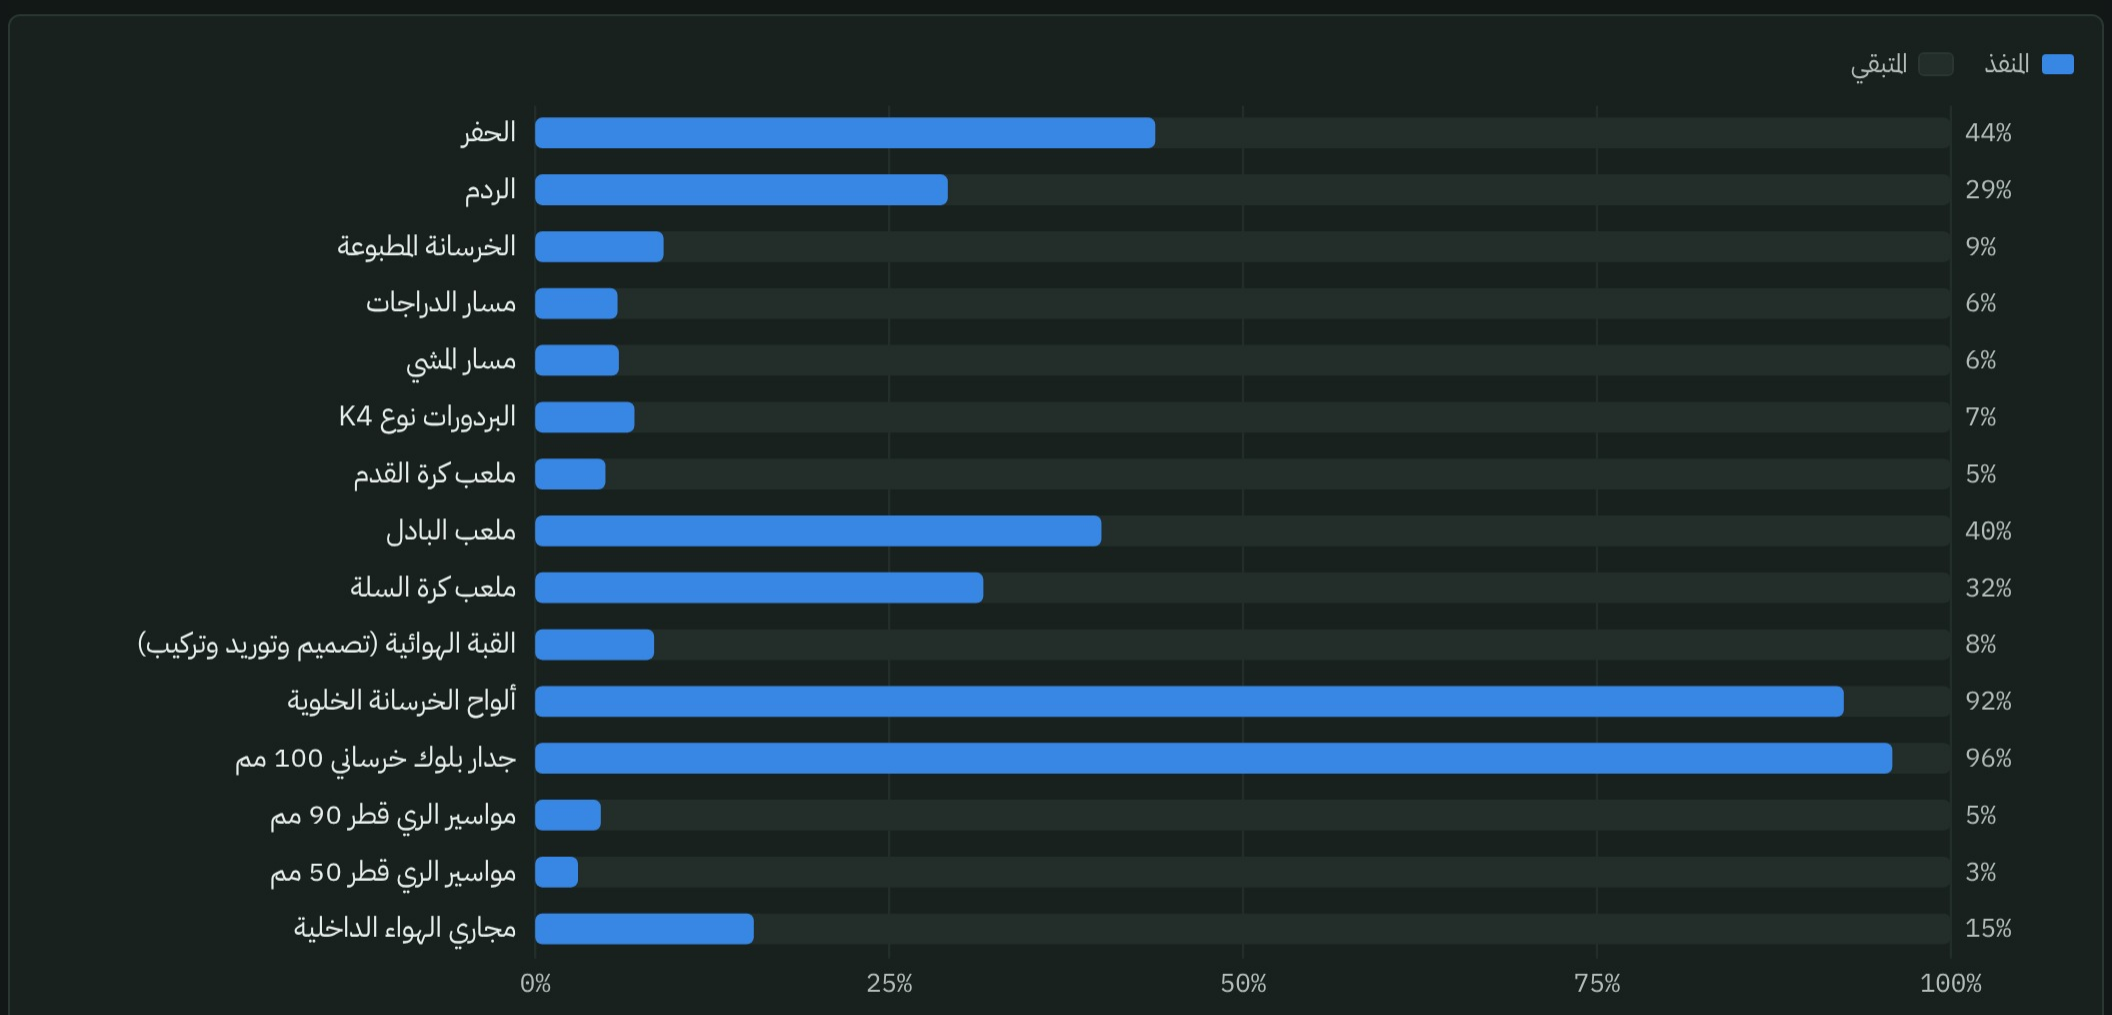

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر	جميع المواقع	م³	10,295	4,510	0	5,785	43.8%	–
الردم	جميع المواقع	م³	10,266	2,992	0	7,274	29.1%	–
الخرسانة المطبوعة	جميع المواقع	م²	1,800	163.3	0	1,637	9.1%	–

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
مسار الدراجات	جميع المواقع	م²	2,300	133.8	0	2,166	5.8%	–
مسار المشي	جميع المواقع	م²	2,200	130.1	0	2,070	5.9%	–
البردورات نوع K4	جميع المواقع	م.ط	9,080	636.7	0	8,443	7.0%	–
ملعب كرة القدم	جميع المواقع	م²	3,000	148.9	0	2,851	5.0%	–
ملعب البادل	جميع المواقع	م²	600	240	0	360	40.0%	–
ملعب كرة السلة	جميع المواقع	م²	1,530	484.4	0	1,046	31.7%	–
القبة الهوائية (تصميم وتوريد وتركيب)	جميع المواقع	بند	3	0.3	0	2.7	8.4%	–
ألواح الخرسانة الخلوية	جميع المواقع	م²	750	693.3	0	56.7	92.4%	–
جدار بلوك خرساني 100 مم	جميع المواقع	م²	135	129.4	0	5.6	95.9%	–
مواسير الري قطر 90 مم	جميع المواقع	م.ط	750	34.8	0	715.2	4.6%	–
مواسير الري قطر 50 مم	جميع المواقع	م.ط	350	10.6	0	339.4	3.0%	–
مجاري الهواء الداخلية	جميع المواقع	كغ	300	46.3	0	253.7	15.4%	–

حالة المواقع هذا الأسبوع

عرعر: اكتمل الجبس بورد والدهان والمغاسل في مبنى الخدمات، وتم تمديد ودفن تمديدات أعمدة الإنارة، وتركيب الأعمدة والكشافات. واحة الأحساء: زراعة الأشجار، وتركيب المفاتيح والمقابس والإنارة في مبنى الخدمات، وجارٍ تسوية مسارات الدراجات والمشي لطبقة الأسفلت. الدمام: جارٍ تركيب الإنترلوك بين الملاعب، وتم تركيب المفاتيح والمقابس في مبنى الخدمات. وتم تركيب الواجهة الزجاجية في المواقع الثلاثة، وتستمر أعمال الحدادة والنجارة لمدخل القبة الهوائية في عرعر والدمام.

الكميات لم تُحدَّث

ورقة Major Quantities مطابقة لورقة الأسبوع الماضي، رغم أن الملخص الأسبوعي يذكر تركيب الإنترلوك وأعمدة الإنارة والأشجار والواجهات الزجاجية هذا الأسبوع. واستُبعدت من المخطط والجدول البنود التي تتجاوز إجمالي جدول الكميات (مواسير uPVC قطر 150 مم للصرف الخارجي 126.81 من 50 م، واللياسة 551.07 من 471 م²، وعزل الأساسات 101.55 من 60 م²، والبلاطة على الأرض 46.17 من 45 م³، وشرائح البولي إيثيلين ومكافحة النمل الأبيض 288.75 من 270 م²).

المعالم الرئيسية

تعطي ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي وتحديث P6 تواريخ التوقع نفسها. والفائض الزمني من تحديث P6 (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026).


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	03-Mar-2026	03-Mar-2026	03-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اعتماد البرنامج الزمني الأساسي	01-Apr-2026	04-Apr-2026	04-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	02-Apr-2026	02-Apr-2026	02-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال أعمال التسوية	02-Apr-2026	02-May-2026	02-May-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التصميم الهندسي	02-May-2026	03-Jan-2027	03-Jan-2027	−4	▼ متأخر
اكتمال مبنى دورات المياه	02-Aug-2026	15-Feb-2027	15-Feb-2027	−38	▼ متأخر
اكتمال منطقة الملاعب	24-Aug-2026	15-Feb-2027	15-Feb-2027	−38	▼ متأخر
اكتمال أعمال المناظر الطبيعية	02-Nov-2026	27-Feb-2027	27-Feb-2027	−46	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع عرعر	21-Dec-2026	11-Feb-2027	11-Feb-2027	−34	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع واحة الأحساء	21-Dec-2026	15-Feb-2027	15-Feb-2027	−37	▼ متأخر
اكتمال أعمال موقع الدمام	21-Dec-2026	27-Feb-2027	27-Feb-2027	−46	▼ متأخر
اكتمال الاختبار والتشغيل	21-Dec-2026	27-Feb-2027	27-Feb-2027	−46	▼ متأخر
انتهاء المشروع	02-Jan-2027	27-Feb-2027	27-Feb-2027	−46	▼ متأخر

القبة الهوائية وتنسيق موقع الدمام وأوامر الشراء المتأخرة تحدد تاريخ الانتهاء.

في P6 يمتد توريد غشاء PVC من 2 نوفمبر إلى 24-ديسمبر-2026، وتركيب الغشاء من 29-ديسمبر-2026 إلى 21-يناير-2027، بفائض زمني بين −10 و−36 يوماً. ويقع أكبر فائض سالب (−46 يوماً) الآن على أوامر شراء لم تصدر بعد (دهان التخطيط، ولوحات التوزيع، وتمديدات القوى، وكاميرات المراقبة)، وتوريد الشبك المعدني للملاعب البادل، والمقاعد والمقاعد الخرسانية مسبقة الصب وسلال المهملات، والخرسانة المطبوعة، واختبار الأعمال الكهروميكانيكية لأعمال تنسيق الموقع. ويُتوقع الاختبار والتشغيل للمناطق الثلاث بين 16 فبراير و27-فبراير-2027.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المورّدة إلى الموقع من الإجمالي. المصدر: ملف التوريدات بتاريخ 26-أكتوبر-2026، وهو آخر ملف مرفوع، إذ لم يُرفق ملف توريدات جديد بتقرير هذا الأسبوع.

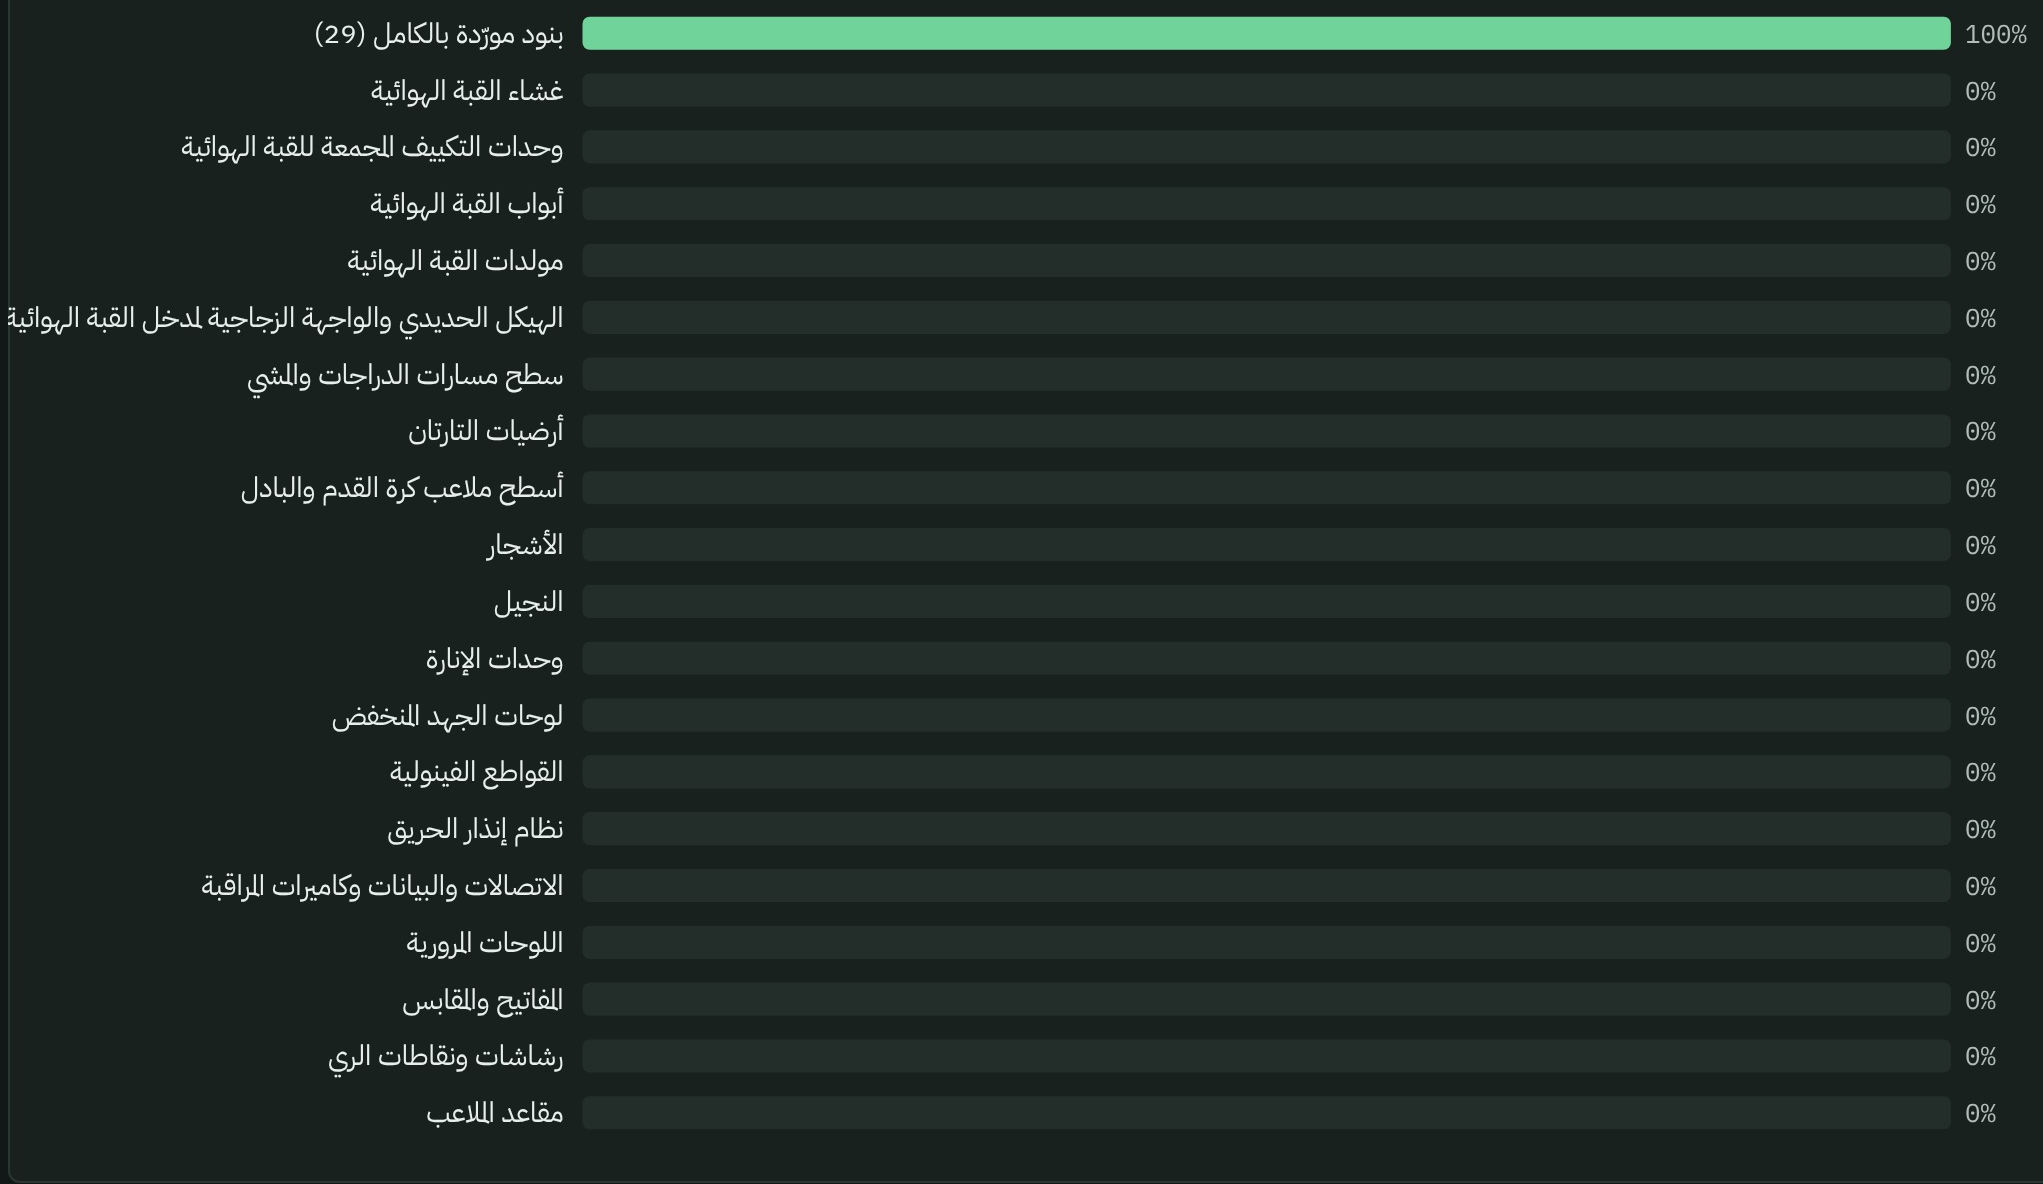

ملخص التوريدات في التقرير الأسبوعي لم يتغير عن الأسبوع الماضي: 119 مادة، صدر أمر الشراء لـ 116 منها ومتبقي 3، ووصلت 99 مادة إلى الموقع ومتبقي 20. وارتفعت نسبة إنجاز التوريدات الفعلية من 51.7% إلى 65.4% مقابل 84.0% مخططاً.

القبة الهوائية: لم يورَّد شيء بعد


حتى 26 أكتوبر صدرت أوامر الشراء ودُفعت الدفعات المقدمة للغشاء والمثبّتات ومقاطع L والإنارة والتهوية والمولدات ومفاتيح التحويل الآلي والأبواب ونظام الإطفاء واللوحات والمواد الكهربائية، والتوريد مجدول من 01 نوفمبر إلى 05-ديسمبر-2026. وكانت وحدات التكييف المجمعة (18 وحدة) في الاعتماد النهائي، والهيكل الحديدي والواجهة الزجاجية للمدخل قيد التصنيع. ويضع P6 الآن أول توريد للغشاء ابتداءً من 02-نوفمبر-2026.

التشجير وأسطح المسارات والملاعب

صدرت أوامر الشراء ودُفعت قيمة الأشجار (298) والنجيل (7,030 م²) وأرضيات التارتان (510 م²) وأسطح مسارات الدراجات والمشي (4,281 م²) وأسطح ملاعب كرة القدم والبادل، والتوريد مستحق بين 29 أكتوبر و30-نوفمبر-2026. ويجري الآن زرع الأشجار في واحة الأحساء. وكانت وحدات الإنارة (105) مدفوعة وجاهزة للتوريد، ولوحات الجهد المنخفض (9) قيد التصنيع.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمال والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower. وقيمة نوفمبر حتى تاريخ البيانات 2 نوفمبر.

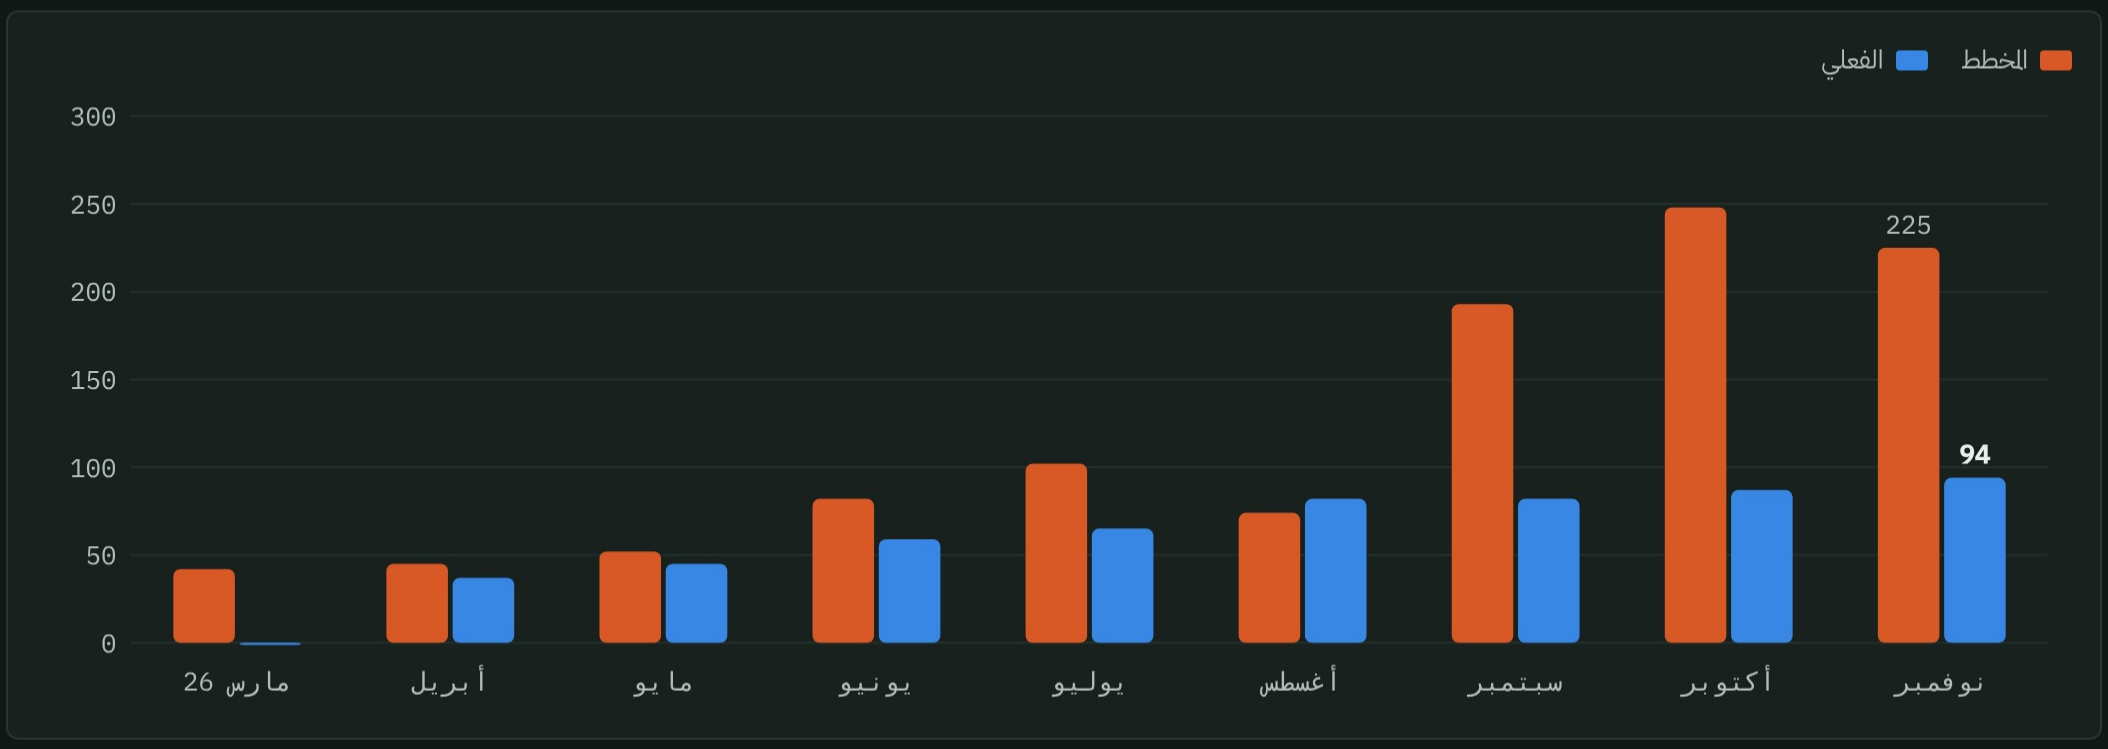

عدد العمالة في نوفمبر 94 مقابل 225 مخططاً (−58%): 75 عاملاً مقابل 206 مخططاً، و19 موظفاً كما هو مخطط. والمعدات في الموقع 12 مقابل 35 مخططة. وترتفع الخطة إلى 380 في ديسمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الملاعب	20,775,269
أعمال الموقع العام	5,722,500
المباني الخدمية	3,500,083
قيمة العقد (غير شاملة الضريبة)	**29,997,852**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	34,497,529
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال، من ورقتي Progress Summary وInvoice Log. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	6
القيمة الإجمالية	4,501,527
المعتمد من مدير المشروع - مدن (5 مستخلصات)	3,673,916
المدفوع (3 مستخلصات)	2,178,751
الخصومات والغرامات	59,000
الصافي شاملاً الضريبة	5,117,756
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	5,965,729

سجل المستخلصات لم يتغير عن الأسبوع الماضي. المفوتر 15.0% من قيمة العقد مقابل نسبة إنجاز فعلي 59.2%، وارتفعت قيمة طلبات الفحص المعتمدة إلى 19.9%. ولا توجد دفعة مقدمة أو محتجزات مسجلة.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.89

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	45,916
ساعات العمل هذا الأسبوع	1,296
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	33 / 110
التدقيقات الداخلية	5

الجودة التقييم 0.86

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة / المعلقة	983 / 973 / 10
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة / المعلقة	194 / 181 / 13
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة / المعلقة	29 / 27 / 2
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة / المعلقة	16 / 6 / 10
تقديمات المخططات التنفيذية (134 مخططة)	159
تقديمات اعتماد المواد (119 مخططة)	140

أعداد تراكمية من ورقة Quality-Stat. صدر هذا الأسبوع 31 طلب فحص و10 طلبات فحص مواد، وأُضيفت تعليمتا موقع. وجميع البنود المعلقة عمرها أقل من 10 أيام.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
توريد القبة الهوائية	المقاول	تأخر تصنيع وتوريد القبة الهوائية هو سبب التأخير المذكور في الملخص الأسبوعي. ويصنّف سجل المخاطر تأخر توريد هذا البند طويل التوريد بأنه مرتفع الاحتمال وشديد الأثر. ويجري توريد الغشاء وتركيبه بفائض زمني سالب.
تقديمات المخططات التنفيذية	المقاول	قائمة منذ 03-أبريل-2026. وقد مضى موعد الإغلاق المتوقع 29-أكتوبر-2026 ولم يُحدَّث السجل. ومتبقٍ مخططان تنفيذيان لم يُقدَّما.
التوريدات متأخرة عن الخطة	المقاول	التوريدات عند 65.4% مقابل 84.0% مخططاً (إنجاز فعلي). وعشرون مادة لم تصل إلى الموقع، وثلاثة أوامر شراء لم تصدر، ويُظهر P6 أوامر شراء دهان التخطيط ولوحات التوزيع وتمديدات القوى وكاميرات المراقبة على أكبر فائض سالب.
العمالة والمعدات	المقاول	75 عاملاً في الموقع مقابل 206 مخططاً لشهر نوفمبر، و12 معدة مقابل 35 مخططة، بينما تتطلب الخطة 361 عاملاً في ديسمبر.
التداخل بين التشطيبات والقبة الهوائية	المقاول	يربط ملف التوريدات الطبقة النهائية للمسارات والملاعب بتشطيب القبة الهوائية لتفادي أي تلف، وكانت هذه الأسطح مدفوعاً 60% من قيمتها دون توريد حتى 26 أكتوبر.

لم تُسجَّل مشكلات جديدة هذا الأسبوع. وتشمل المخاطر القائمة الأخرى في السجل الدخول إلى الموقع، والأماكن المغلقة، وتخزين المواد، وشهادات المعدات، والعمل على ارتفاع، والحرارة، وفصل الحركة المرورية.

ملاحظات على البيانات

- رقم الأسبوع: تذكر ورقة Milestones عبارة "Current Contract Weeks: 27 of 44"، وهو مرة أخرى رقم التقرير (WPR-27). فمن تسليم الموقع في 03-مارس-2026 إلى تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026 تمضي 244 يوماً، أي الأسبوع 34، بعد أسبوع من تقرير الأسبوع الماضي (الأسبوع 33).
- تعديل نسبة الإنجاز: أعطى تقرير الأسبوع الماضي 53.9% (225,576 ساعة عمل) بينما أعطى مستخرج P6 فيه 55.3% (231,540). ورقم هذا الأسبوع حتى تاريخه، 247,833 ساعة (59.2%)، يطابق مستخرج P6، والإنجاز الأسبوعي في التقرير 16,292 ساعة (3.9%) محسوب من 231,540. ومقارنة بـ 53.9% المعلنة في الأسبوع الماضي يبلغ التغير 5.3%. وتضيف ورقة Physical-Chart Data 15,467 ساعة فقط وتُظهر 57.6% لشهر نوفمبر، وهو ما لا يطابق الرقم الرئيسي 59.2%.
- تذكر ملفات ملخص مدن (Look Ahead، والأعمال المنفذة ونسب الإنجاز، والأعمال المنفذه خلال الإسبوع) وورقة Progress Summary نسبة مبنية على التكلفة على أنها نسبة الإنجاز الفعلي، ولم تُستخدم هذه الأرقام هنا.
- ما زال ملف الأعمال المنفذه خلال الإسبوع يحمل بيانات مشروع آخر: مدير المشروع عبد الله الشنيفي، والمقاول شركة الانجاز، والبدء 24-نوفمبر-2025، ونهاية العقد 23-مايو-2026، والقطاع الأوسط.
- لم يُرفع ملف التوريدات هذا الأسبوع، وسجل التوريدات وورقتا Procurement وInvoice Log في التقرير مطابقة لما في الأسبوع الماضي، لذا يُظهر مخطط التوريدات الموقف في 26-أكتوبر-2026.
- ورقة Major Quantities مطابقة لورقة الأسبوع الماضي في جميع البنود، لذا يُظهر عمود هذا الأسبوع 0 رغم الإبلاغ عن أعمال الإنترلوك وأعمدة الإنارة والأشجار والواجهات الزجاجية. وتتجاوز عدة بنود كمية جدول الكميات، وقيمة "Plan To Date" تساوي الكمية الكاملة لكل البنود.
- ما زالت أسماء المعالم في جدول ورقة Weekly Progress Report مُزاحة صفاً واحداً عن ورقة Milestones، فمعلم "Completion of Playground Area" هناك يحمل تواريخ التصميم الهندسي ومؤشَّر عليه كمنجز رغم أن P6 يتوقعه في 03-يناير-2027.
- صورتان من الصور الأسبوعية الست عرضهما 598 بكسل، أقل من الحد الأدنى 600 بكسل، فلم تُعرضا. ويضم مجلد الأسبوع أيضاً الملخص التنفيذي للأسبوع الماضي (WPR-26) إلى جانب ملخص هذا الأسبوع.
- تُظهر عدة خلايا ملخص في ورقتي DB وInvoice Log أخطاء !#REF.
