تطوير اضافي و استكمال شبكات في تبوك

Additional Development and Network Completion, Tabuk Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة أساس لتطوير وتشغيل المدن الصناعية	إيجيس (EGIS)	م. يزيد	04-Sep-2025	03-Sep-2027

النطاق: الطرق، وبحيرة تصريف السيول A، وشبكات السيول والصرف الصحي ومياه الشرب ومكافحة الحريق والري بالمياه المعالجة وإنارة الطرق والاتصالات والمراقبة التلفزيونية (CCTV) في ثلاث مناطق بالمدينة الصناعية بتبوك. قيمة العقد 140.5 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. بلغ الإنجاز 54.0% مقابل 37.8% مخططاً وفق الخطة المعدلة، أي أن المشروع متقدم بنسبة 16.2% (مؤشر الأداء الزمني 1.43). وأنجز هذا الأسبوع 2.1% مقابل 1.1% مخططاً، وهو أكبر إنجاز أسبوعي في آخر ثلاثة أسابيع.


نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
54.0% / 37.8% مخطط	+2.1% / +1.1% مخطط	58.2% · اليوم 424 من 729	36.2% · 50.9 مليون ريال
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.43 · +16.2%	▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.0%	▼ الانتهاء المتوقع 06-أكتوبر-2027	15 مستخلصاً، آخر فترة تنتهي في 29-أكتوبر-2026

متقدم كثيراً على الخطة المعدلة، لكن الانتهاء المتوقع لا يزال بعد تاريخ العقد بنحو خمسة أسابيع.

يتوقع كل من تحديث P6 (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026) والتقرير الأسبوعي التسليم في 06-أكتوبر-2027، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (03-سبتمبر-2027) بـ33 يوماً، ولانتهاء المشروع في P6 فائض زمني −28.4 يوماً. وانخفض عدد الأنشطة المفتوحة ذات الفائض السالب من 228 إلى 224، معظمها في أعمال الكهرباء (82) والمراقبة التلفزيونية (72) والاتصالات (38). ومقارنة بالخطة الأساسية الأصلية التي كانت تستهدف 64.2% بنهاية أكتوبر، المشروع متأخر.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data، التقرير الأسبوعي 02-نوفمبر-2026. وتسجل الورقة آخر قيمة فعلية في شهر تاريخ البيانات (نوفمبر).

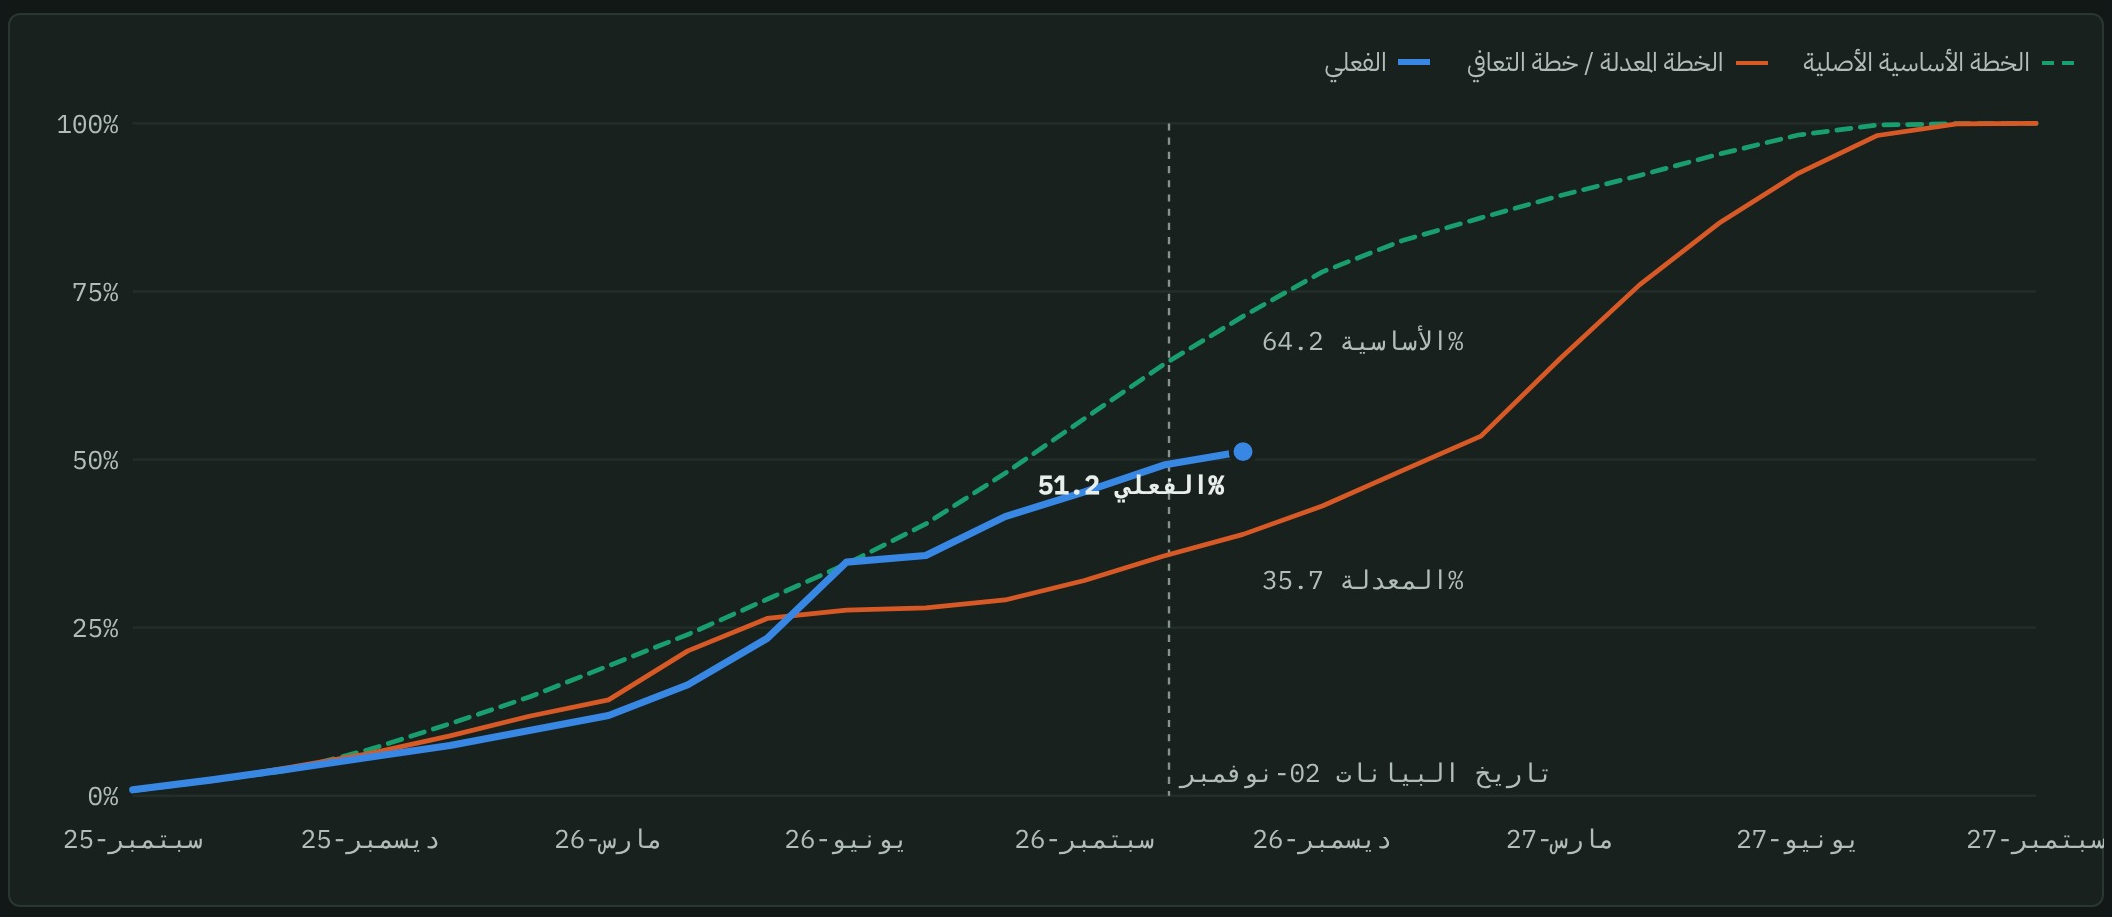

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
12-Oct-2026	34.6	49.9	+15.3	–	1.44
19-Oct-2026	35.2	50.7	+15.5	+0.8	1.44
26-Oct-2026	36.7	51.9	+15.2	+1.2	1.42
02-Nov-2026	**37.8**	**54.0**	**+16.2**	**+2.1**	**1.43**

من أوراق Progress في التقارير الأسبوعية بتاريخ 19 و26 أكتوبر و02 نوفمبر (صف 12 أكتوبر من عمود "الأسبوع الماضي" في تقرير 19 أكتوبر)، والأسابيع السابقة غير متاحة. يستخدم الجدول الأسبوعي 354,339 ساعة عمل مخططة، بينما تستخدم ورقة منحنى S عدد 373,967 ساعة وتُظهر إنجازاً فعلياً 51.2% في التاريخ نفسه.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	0.5%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
أعمال التنفيذ	98.0%	38.1%	54.7%	+16.6	1.43	▲ متقدم
المنطقة 1	21.1%	42.6%	61.9%	+19.3	1.45	▲ متقدم
المنطقة 2	25.3%	50.7%	75.5%	+24.8	1.49	▲ متقدم
المنطقة 3	51.6%	30.1%	41.5%	+11.4	1.38	▲ متقدم
الإغلاق والتسليم	1.6%	0.0%	0.0%	0.0	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**37.8%**	**54.0%**	**+16.2**	**1.43**	▲ متقدم

لا تحمل أعمال التصميم والتوريدات ساعات عمل في هذا القياس، لذا لا تظهر في الجدول. يضم تحديث P6 عدد 1,492 نشاطاً: 639 مكتملاً و195 قيد التنفيذ و658 لم يبدأ.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 02-نوفمبر-2026. ويمثل عمود "المنفذ هذا الأسبوع" الفرق عن تقرير 26-أكتوبر-2026. تعطي الورقة إجماليات المشروع فقط، دون توزيع حسب المنطقة ودون أرقام الردم.

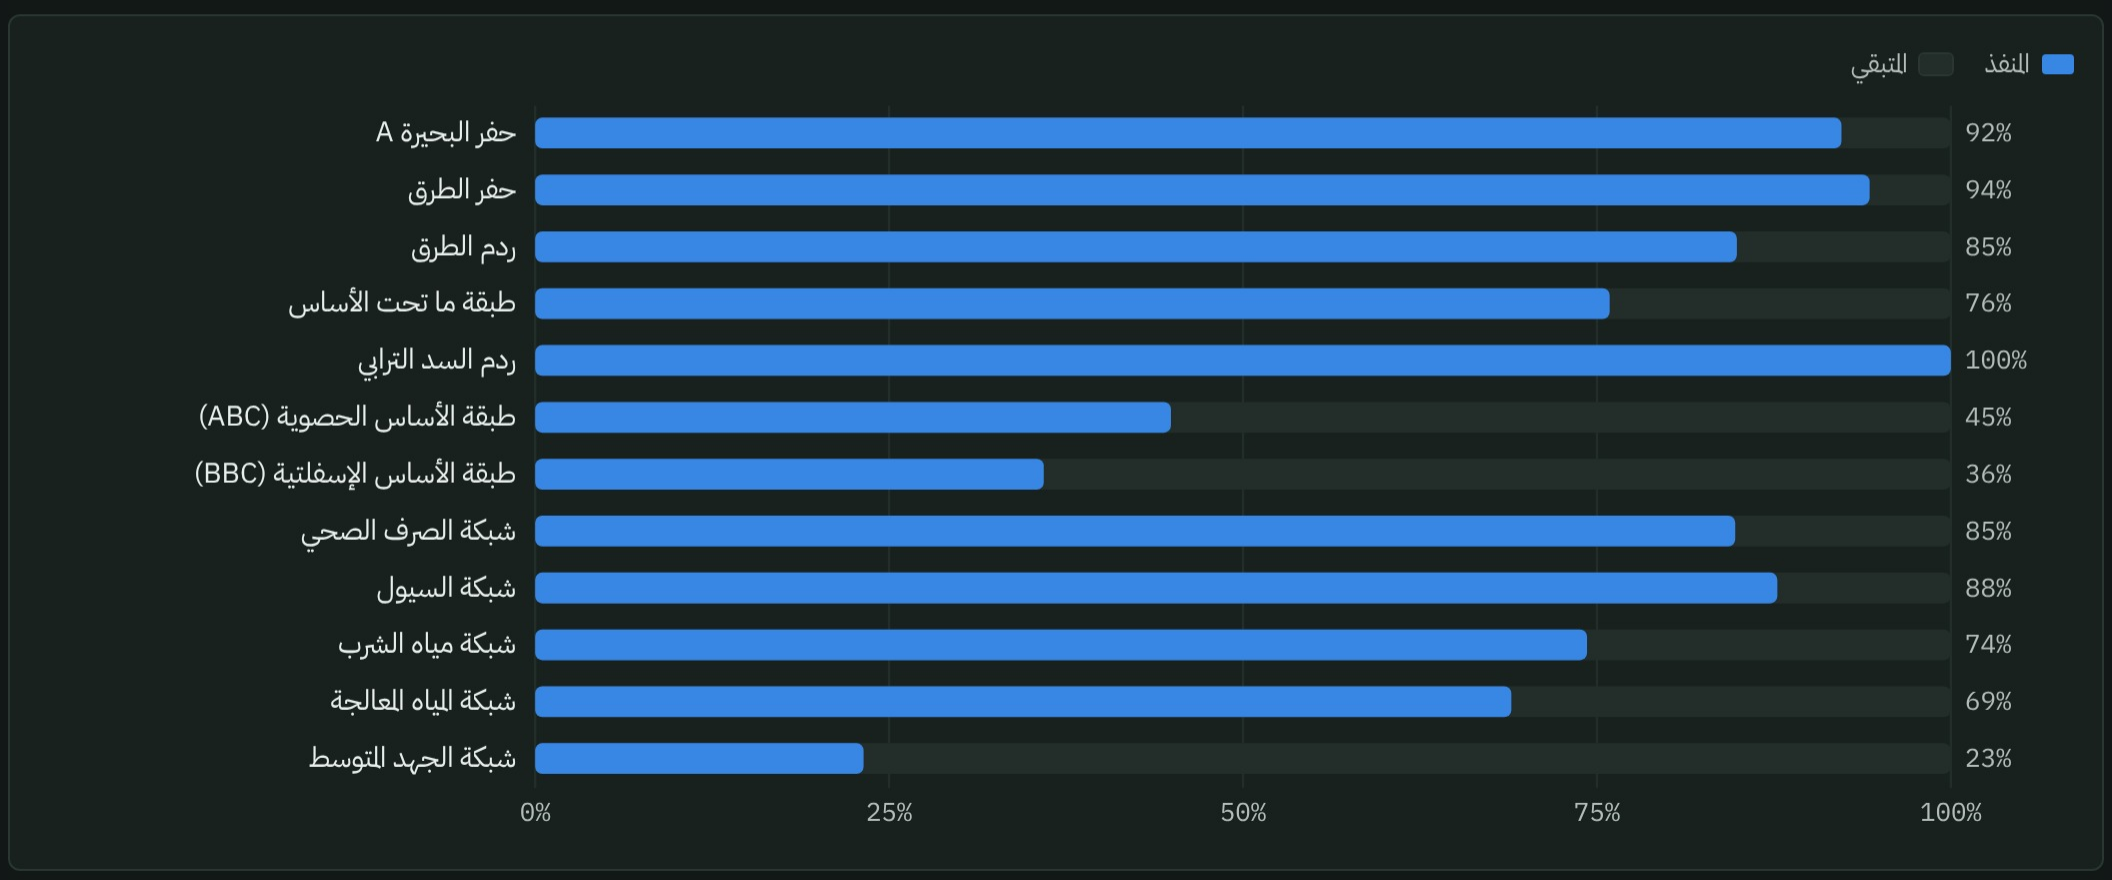

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
حفر البحيرة A	جميع المناطق	م³	321,070	296,255	0	24,815	92.3%	–
حفر الطرق	جميع المناطق	م³	99,925	94,190	715+	5,735	94.3%	–
ردم الطرق	جميع المناطق	م³	107,100	90,910	4,155+	16,190	84.9%	–
طبقة ما تحت الأساس	جميع المناطق	م³	72,730	55,200	300+	17,530	75.9%	–
ردم السد الترابي	جميع المناطق	م³	3,865	3,865	0	0	100.0%	–
طبقة الأساس الحصوية (ABC)	جميع المناطق	م³	48,485	21,774	871+	26,711	44.9%	–
طبقة الأساس الإسفلتية (BBC)	جميع المناطق	م³	27,310	9,811	1,303+	17,499	35.9%	–
شبكة الصرف الصحي	جميع المناطق	م.ط	8,370	7,095	0	1,275	84.8%	–
شبكة السيول	جميع المناطق	م.ط	15,638	13,721	74+	1,917	87.7%	–
شبكة مياه الشرب	جميع المناطق	م.ط	13,221	9,823	311+	3,398	74.3%	–
شبكة المياه المعالجة	جميع المناطق	م.ط	12,223	8,428	0	3,795	69.0%	–
شبكة الجهد المتوسط	جميع المناطق	م.ط	23,700	5,498	500+	18,202	23.2%	–

الشبكات الرطبة متقدمة

نُفذ 85% من شبكة الصرف الصحي و88% من السيول و74% من مياه الشرب و69% من المياه المعالجة. وأُضيف هذا الأسبوع 311 م من مواسير مياه الشرب و74 م من مواسير السيول، ولم تتقدم شبكتا الصرف الصحي والمياه المعالجة.

طبقات الطرق والجهد المتوسط متأخرة

طبقة الأساس الحصوية عند 45% (871+ م³) وطبقة الأساس الإسفلتية عند 36% (1,303+ م³). وتقدمت شبكة الجهد المتوسط من 21% إلى 23% (500+ م)، ولا يزال ربطها بالمحطة مشكلة قائمة.

المعالم الرئيسية

الخطة الأساسية والتوقع من ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي، وتوقع P6 والفائض الكلي من تحديث P6 (تاريخ البيانات 02-نوفمبر-2026). بالنسبة لانتهاء الشبكات، الخطة الأساسية هي خطة P6 الأساسية من متتبع التقدم، ولا يعطي التقرير الأسبوعي توقعاً لها.


المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	04-Sep-2025	04-Sep-2025	04-Sep-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التقديمات الأولية	06-Dec-2025	11-Dec-2026 (+370 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال المنطقة 1	09-Feb-2027	03-Oct-2027 (+236 يوماً)	02-Jun-2027	+80.3	؟ يتعارض مع P6
اكتمال المنطقة 2	02-Aug-2027	12-Sep-2027 (+41 يوماً)	22-Jun-2027	+38.2	؟ يتعارض مع P6
اكتمال المنطقة 3	02-Aug-2027	28-Sep-2027 (+57 يوماً)	15-Jun-2027	+69.7	؟ يتعارض مع P6
شبكة الصرف الصحي	14-Aug-2027	–	14-Mar-2027	+149.6	● يوجد فائض زمني
شبكة مياه الشرب	21-Aug-2027	–	21-Jun-2027	+64.7	● يوجد فائض زمني
شبكة المياه المعالجة	21-Jul-2027	–	10-Jun-2027	+73.4	● يوجد فائض زمني
شبكة السيول	14-Aug-2027	–	24-Jul-2027	+36.9	● يوجد فائض زمني
شبكة الاتصالات	16-Aug-2027	–	28-Aug-2027	+6.4	● يوجد فائض زمني
شبكة المراقبة التلفزيونية (CCTV)	03-Sep-2027	–	02-Oct-2027	−24.6	▼ متأخر
أعمال الطرق	02-Sep-2027	–	30-Sep-2027	−23.4	▼ متأخر
الأعمال الكهربائية	03-Sep-2027	–	03-Oct-2027	−25.9	▼ متأخر
اكتمال توريد جميع المواد	03-Aug-2027	30-Sep-2027 (+58 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	10-Aug-2027	02-Oct-2027 (+53 يوماً)	–	–	▼ متأخر
تسليم المشروع	03-Sep-2027	06-Oct-2027 (+33 يوماً)	06-Oct-2027	−28.4	▼ متأخر

يختلف التقرير الأسبوعي وP6 على تواريخ اكتمال المناطق.

يتوقع التقرير الأسبوعي انتهاء المناطق 1 و2 و3 بين 12-سبتمبر-2027 و03-أكتوبر-2027، بينما يُنهيها تحديث P6 بين 02-يونيو-2027 و22-يونيو-2027 بفائض موجب. ويحدد كلاهما تسليم المشروع في 06-أكتوبر-2027. والبنود المتأخرة في P6 هي أعمال الطرق والكهرباء والمراقبة التلفزيونية، وأصبح للاتصالات فائض موجب.

توريد المواد الرئيسية

نسبة اكتمال التوريدات لكل مادة. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 02-نوفمبر-2026.

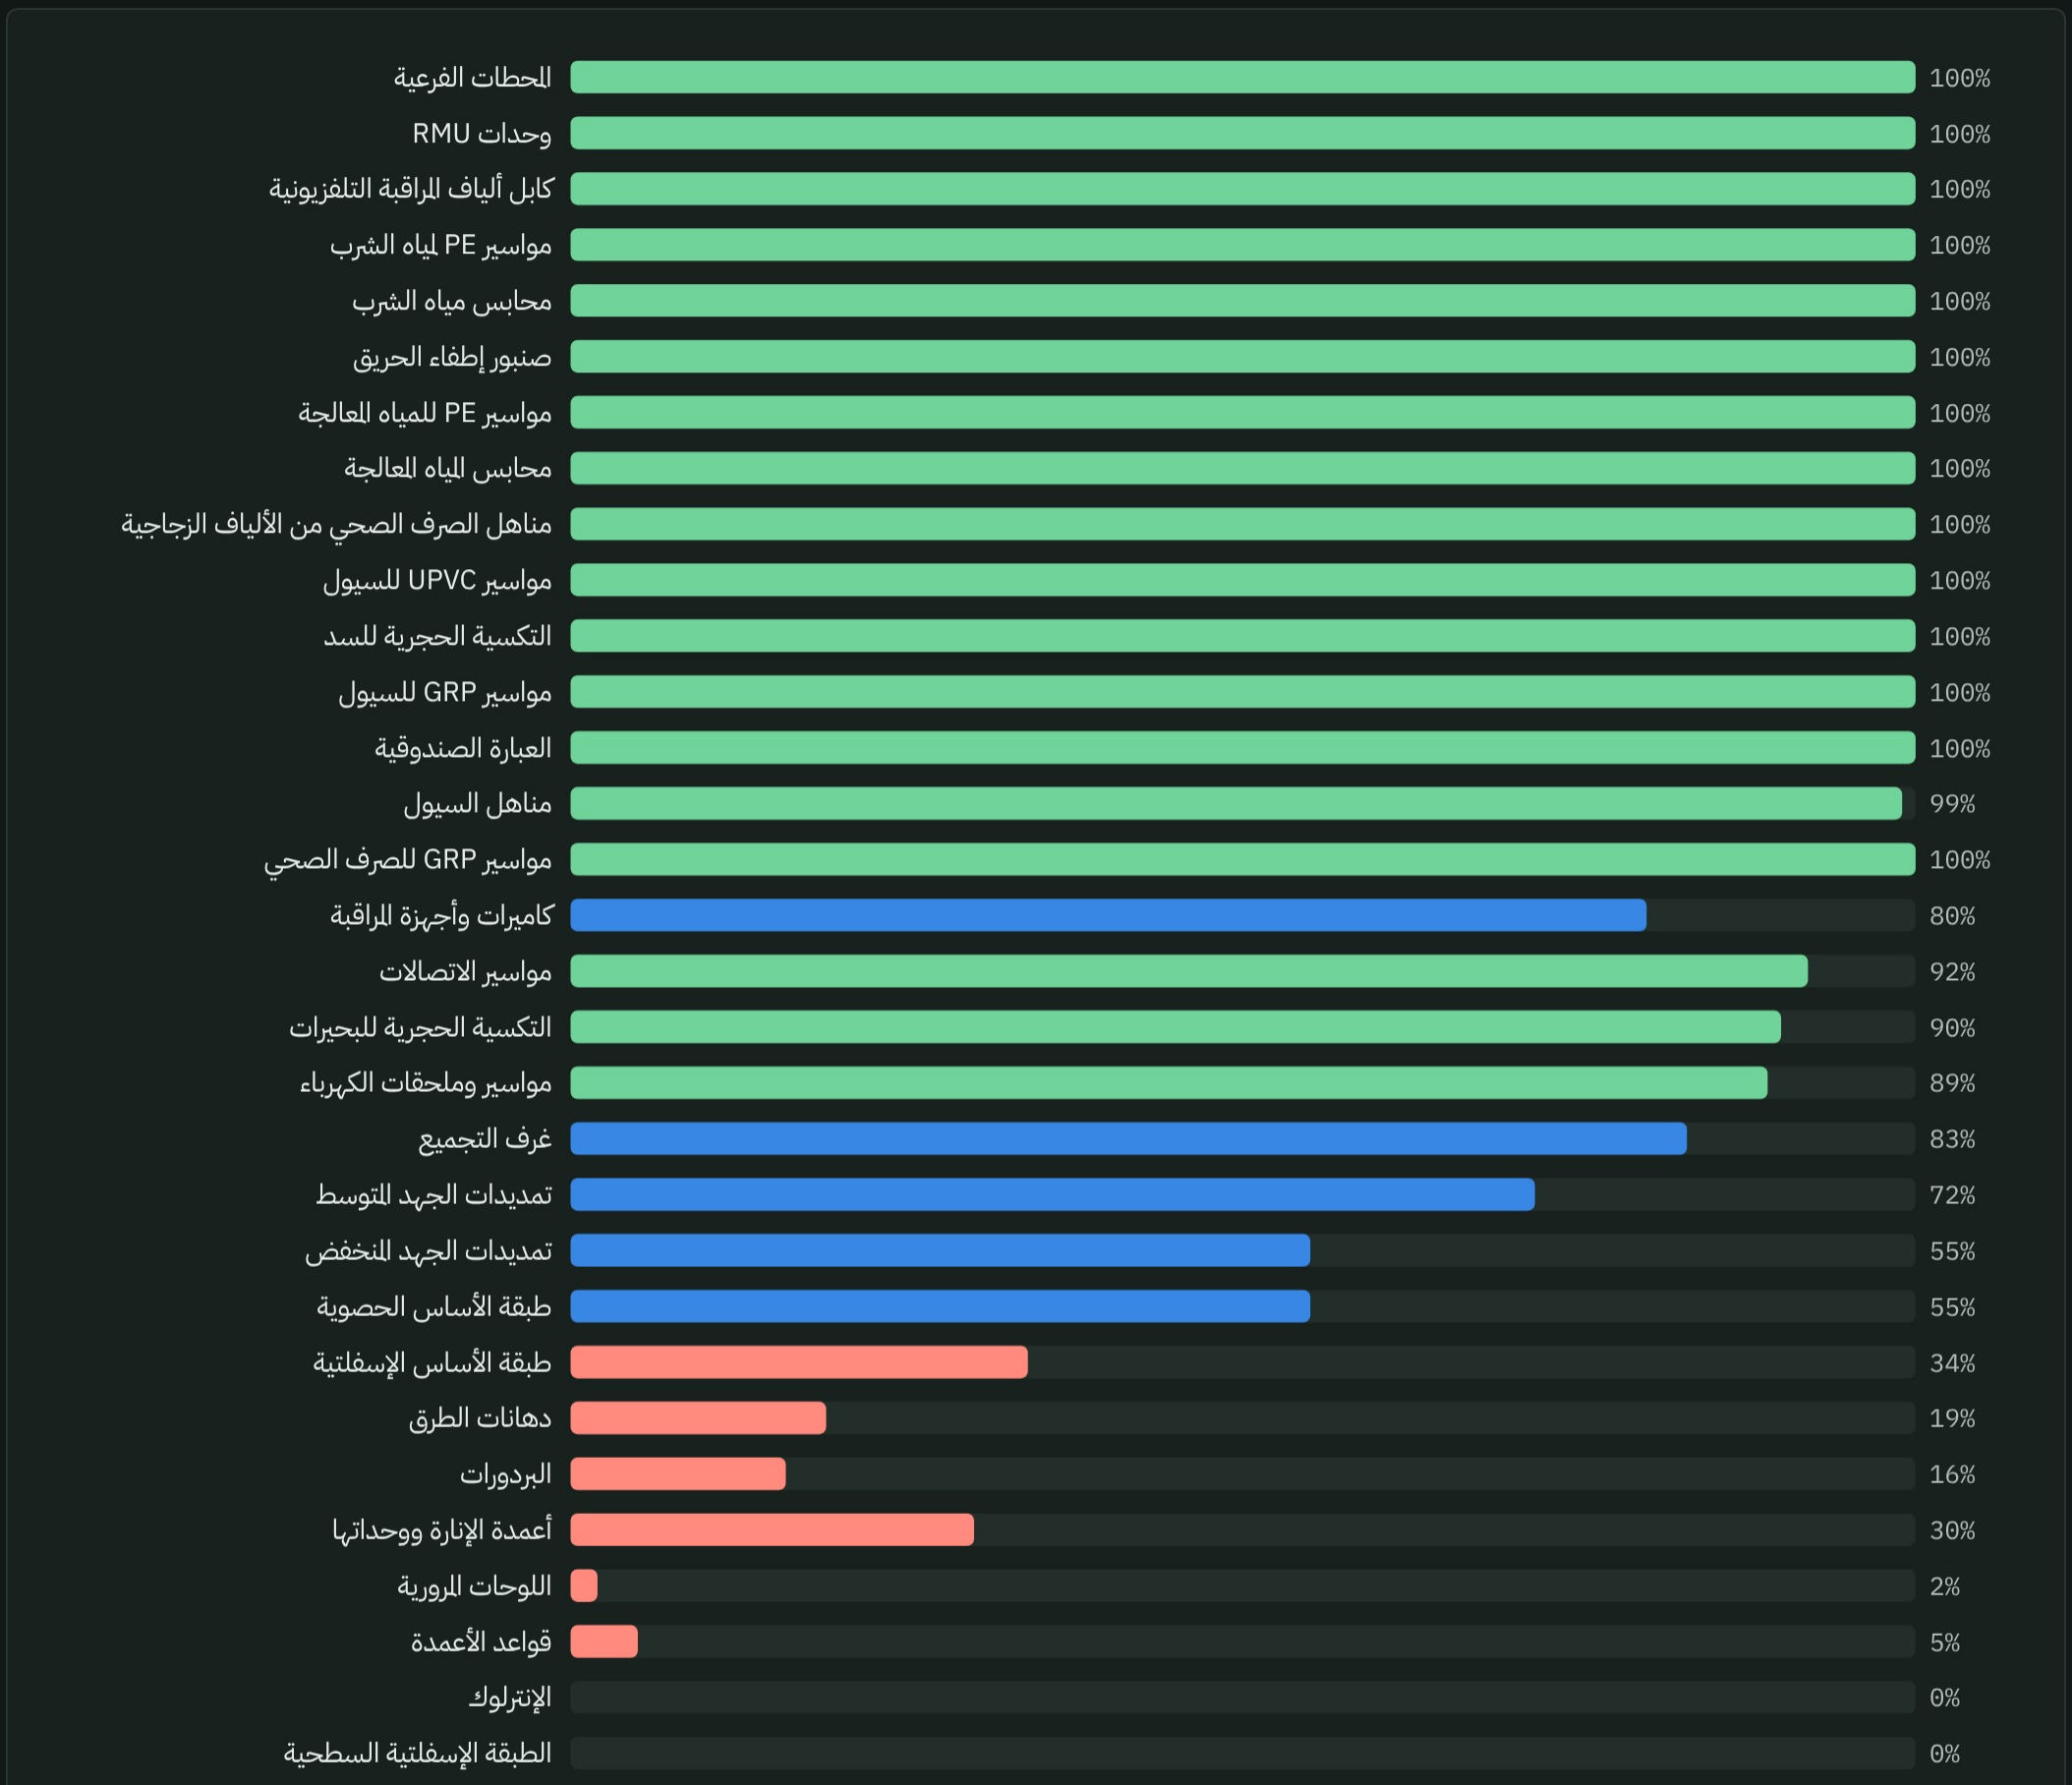

لم يُورَّد الإنترلوك والطبقة السطحية بعد، والإنارة عند 30%


صدرت أوامر الشراء للإنترلوك (62,075 م²) والطبقة الإسفلتية السطحية دون أي توريد. وارتفع توريد أعمدة الإنارة ووحداتها من 8% إلى 30% من 957، وقواعد الأعمدة من 1% إلى 5%. والبردورات عند 16% واللوحات المرورية عند 2%.

تمديدات الكهرباء موزّدة جزئياً

تمديدات الجهد المتوسط عند 72% من 115,400 م وتمديدات الجهد المنخفض عند 55%. والمحطات الفرعية ووحدات RMU موزّدة بالكامل. واكتمل هذا الأسبوع توريد مواسير GRP للصرف الصحي، وبلغ توريد كاميرات المراقبة 80%، وبقية مواد الشبكات الرطبة مكتملة أو شبه مكتملة.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (يدوية وغير يدوية)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

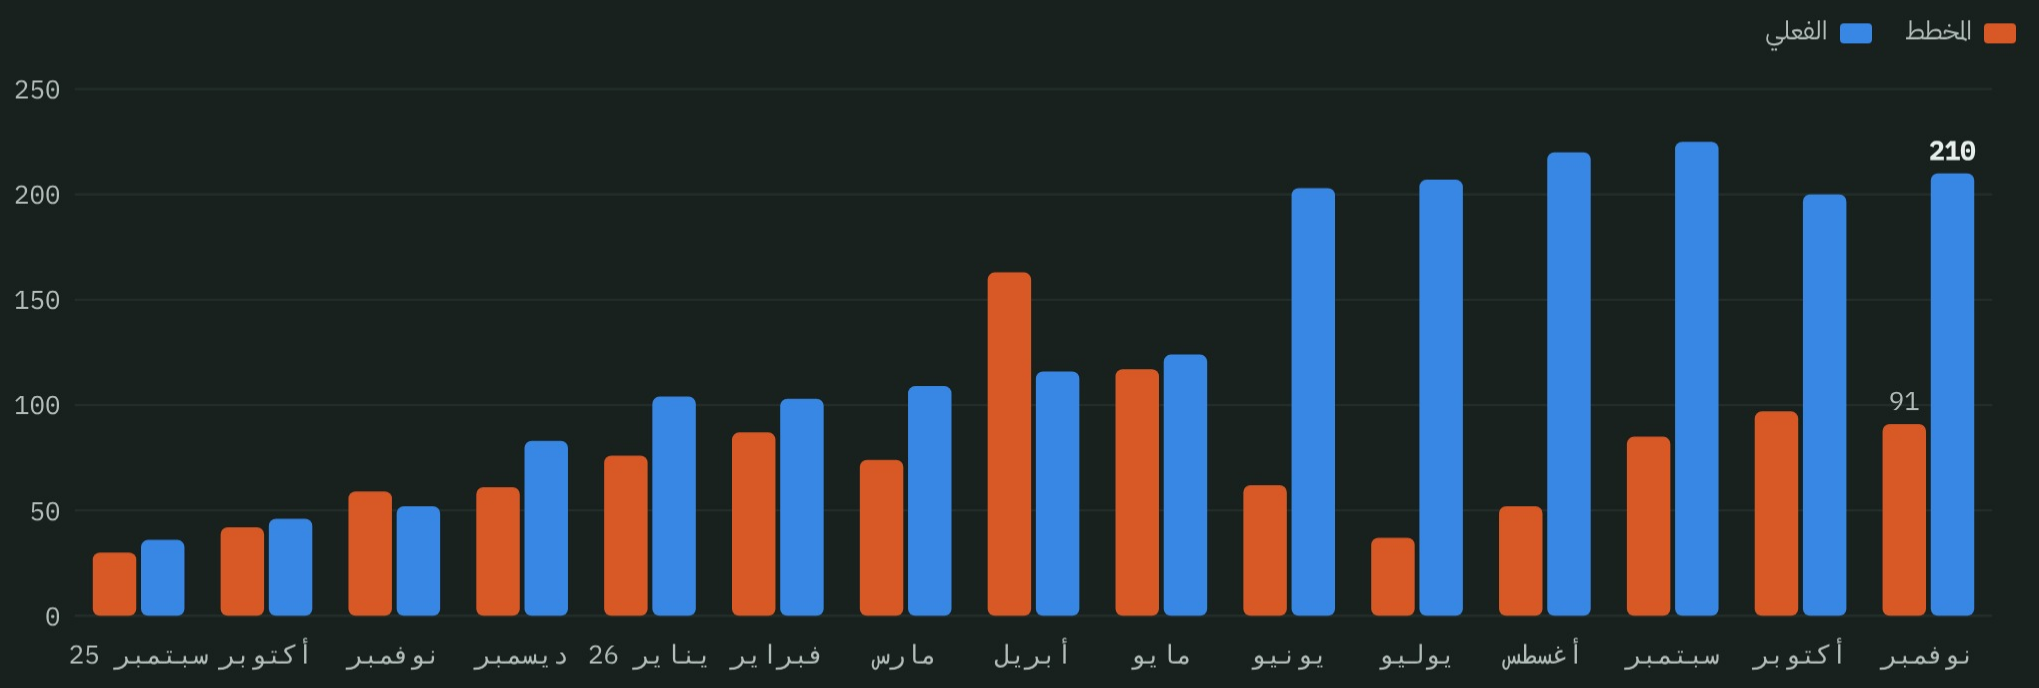

عدد العمالة في نوفمبر 210 (35 غير يدوية و175 يدوية) مقابل 91 مخططاً، بارتفاع من 200 في أكتوبر. وترتفع الخطة إلى ذروة 229 في مارس 2027. المعدات في الموقع في نوفمبر: 63 مقابل 29 مخططاً.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

الطرق	55,700,828
شبكة تصريف السيول	42,542,241
الكهرباء	21,956,853
شبكة مياه الشرب	7,176,559
شبكة المياه المعالجة	6,656,378
شبكة الصرف الصحي	6,435,003
قيمة العقد (بدون الضريبة)	**140,467,862**
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال، من ملخص جدول الكميات في التقرير الأسبوعي. مجموع البنود يساوي قيمة العقد. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات في السجل	15
القيمة الإجمالية المقدمة	50,860,088
المعتمد من مدير المشروع (13 مستخلصاً)	43,497,867
المدفوع شاملاً الضريبة (13 مستخلصاً)	50,080,548
الخصومات والغرامات	110,000
الدفعة المقدمة (10%)	14,046,786
المحتجزات	0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	56,302,460

المفوتر 36.2% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 54.0%. قُدّم هذا الأسبوع المستخلص 15 (4,647,428 ريالاً بتاريخ 29-أكتوبر-2026)، والمستخلصان 14 و15 بانتظار اعتماد مدير المشروع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.95

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	391,334
ساعات العمل هذا الأسبوع	10,050
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار الممتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	8 / 36

الجودة التقييم 0.93

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة	7,605 / 138
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	249 / 1
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	12 / 12
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	20 / 20
تقديمات المخططات التنفيذية	428
اعتمادات المواد المعتمدة	48 / 52

تراكمي حتى 02-نوفمبر-2026. سجّلت تدقيقات الاستشاري الأسبوعية في 29–30 أكتوبر 2026 تقييم جودة 0.97 وسلامة 0.95. وصدر هذا الأسبوع تقرير عدم مطابقة جديد وأُغلق.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
ربط الجهد المتوسط بالمحطة	مدن	قائمة منذ 15-يونيو-2026. بدء ربط شبكة الجهد المتوسط بالمحطة بانتظار رد المحطة، والموعد المستهدف الآن 10-نوفمبر-2026.
ترقية المخططات التنفيذية إلى كود A	المقاول	قائمة منذ 29-يونيو-2026. يجري تقديم المخططات لترقيتها إلى كود A، والموعد المستهدف الآن 15-نوفمبر-2026.
زيادة مناهل الاتصالات	المقاول	قائمة منذ 05-أكتوبر-2026. زاد عدد مناهل شبكة الاتصالات، وبانتظار المخطط التنفيذي، والموعد المستهدف الآن 10-نوفمبر-2026.
الحفر العميق	المقاول	خطر سلامة قائم: انهيار جوانب الحفر. وُضعت حواجز ولوحات تحذيرية وتُبعد المعدات عن حواف الحفر.

أُغلقت في سجل المشكلات بتاريخ 29-أكتوبر-2026 مشكلة سياج شركة Shinko الذي كان يعيق الأعمال الكهربائية (إزالة السياج جارية). ولا تزال التحديات المذكورة في ملخص مدن لهذا الأسبوع هي اعتماد ترقية المخططات إلى كود A وربط الجهد المتوسط بالمحطة.

ملاحظات على البيانات

- يظهر التقدم الفعلي بقيمتين: ملخص التقرير الأسبوعي وورقة Progress يعطيان 54.01% (191,388 من 354,339 ساعة عمل مخططة)، بينما تعطي ورقة Physical-Chart Data نسبة 51.18% (من 373,967). يعتمد الرقم الرئيسي على ملخص التقرير نفسه.
- يصنّف ملف ملخص مدن الأسبوعي ومتتبع التقدم في P6 وشهادات الإنجاز التقدمَ الموزون بالتكلفة على أنه "فعلي" و"مخطط". يعتمد هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي (بعدد ساعات العمل المخططة) فقط.
- يختلف رقم المشروع بين الملفات: TAB1-02-003 في التقرير الأسبوعي، وTAB1-01-009 في ملف ملخص مدن وورقة التوريدات القديمة، ومن TAB1-02-005 إلى TAB1-02-008 في سجل المخاطر.
- أسبوع التقرير: تذكر ورقة Milestones أسبوع العقد 61 من 109، وتسمّي تدقيقات الاستشاري يومي 29–30 أكتوبر 2026 بالأسبوع 61. وحساب الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع يعطي 60. يعتمد التقرير الأسبوع المذكور 61.
- تختلف معالم المناطق بثلاث طرق: الخطة الأساسية في التقرير الأسبوعي (المنطقة 1: 09-فبراير-2027)، وخطة P6 الأساسية في متتبع التقدم (المنطقة 1: 05-يونيو-2027)، والتوقعات في التقرير الأسبوعي (المنطقة 1: 03-أكتوبر-2027) وفي P6 (المنطقة 1: 02-يونيو-2027)؛ انظر قسم المعالم الرئيسية.
- تُظهر إحصاءات السلامة الآن 391,334 ساعة عمل تراكمية، أي بزيادة 10,050 ساعة (ساعات هذا الأسبوع) فقط على 381,284 الواردة في التقريرين السابقين، فيبدو أن ساعات أسبوع واحد ناقصة من الإجمالي التراكمي. كما يُظهر جدول الملخص 6,360 ساعة آمنة هذا الأسبوع مقابل 10,050 في ورقة السلامة.
- لا يطابق جدول "الوارد في الموقع" (28/35 غير يدوية و149/384 يدوية) ورقة القوى العاملة لشهر نوفمبر (28/35 و63/175). كما بقي العدد التراكمي الفعلي للمعدات عند 269 منذ مارس 2026.
- يحتوي الملف على ورقتي توريدات، ويعتمد التقرير ورقة "Procurement" وليس النسخة الأقدم "Procurement (2)". وبعض البنود بلا كمية أو نسبة توريد.
- لا تزال جميع بنود سجل المخاطر مصنفة "مفتوحة"، بما فيها التي أُغلقت معالجتها. وتستمر المشكلات القائمة في تأجيل مواعيدها المستهدفة (ربط الجهد المتوسط: 30 أكتوبر، ثم 03 نوفمبر، والآن 10-نوفمبر-2026).
- لا تُعرض صور للموقع: الصور الخمس في التقرير الأسبوعي لهذا الأسبوع بعرض 329 إلى 529 بكسل، أقل من الحد الأدنى 600 بكسل، ولا تحتوي ملفات PDF على صور.
