تطوير الطرق لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية)

Road Development for the Support Services Area, Second Industrial City in Makkah (Al-Akayshiyah)

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	25-Jun-2026	24-Aug-2027

النطاق: أعمال الطرق وشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول لمنطقة الخدمات المساندة بالمدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة (العكيشية). قيمة العقد 33.04 مليون ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ومدته 14 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

ملخص تقدم المشروع

يقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. في 2026-نوفمبر-03 بلغت نسبة الإنجاز 53.3% مقابل 39.2% مخطط، أي أن المشروع متقدم بنسبة 14.1% عن الخطة. وأنجز هذا الأسبوع 5.0% مقابل 3.6% مخطط، وهو أعلى إنجاز أسبوعي في التقارير الثلاثة الأخيرة.

نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
53.3% / 39.2% مخطط	**+5.0%** / +3.6% مخطط	**30.8%** · اليوم 131 من 425	**20.4%** · 6.75 مليون ريال
▲ مؤشر الأداء 1.36 · +14.1%	▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 1.4%	▼ انتهاء P6 في 2027-أكتوبر-28	3 مستخلصات، جميعها مدفوعة؛ آخر فترة تنتهي في 2026-سبتمبر-27

التقدم أعلى من المخطط بكثير، لكن تاريخ الانتهاء المتوقع تأخر أسبوعًا آخر: التأخير الآن 65 يومًا.

يحدد تحديث P6 (UP 16، تاريخ البيانات 2026-نوفمبر-03) إنجاز المشروع في 2027-أكتوبر-28، أي بعد 65 يومًا من تاريخ انتهاء العقد 2027-أغسطس-24، بفائض كلي −55 يومًا (−49 في الأسبوع السابق). ويعطي التقرير الأسبوعي التوقع نفسه. ولا توجد أوامر شراء لمواد الرصف حتى الآن، ونقلت قائمة الأنشطة المتأخرة في البدء أمر شراء طبقة الأساس الحصوية مرة أخرى إلى 03-2026-نوفمبر.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من عرض المتابعة (Tracking Sheet) المرفوع مع التقرير الأسبوعي بتاريخ 2026-نوفمبر-03، مع تعليقاتها في الشريحة. خمس منها بختم 2026-نوفمبر-01 وواحدة بختم 2026-نوفمبر-02، مع الوقت والارتفاع (دون إحداثيات GPS). اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



أعمال القطع، الطريق المحلي 17

ختم 2026-نوفمبر-01، 06:35، الارتفاع 180.2 م.



أعمال القطع، الطريق المحلي 11

ختم 2026-نوفمبر-01، 06:55، الارتفاع 184.0 م.



الحفر لمواسير UPVC، الطريق المحلي 28

ختم 2026-نوفمبر-01، 11:26، الارتفاع 172.0 م.



اختبار الكثافة الحقلية لقاعدة غرفة التجميع، الطريق المحلي 28

ختم 2026-نوفمبر-01، 10:25.



أعمال المناهل، الطريق المحلي 28

ختم 2026-نوفمبر-01، 10:45، الارتفاع 178.5 م.




تركيب البردورات، الطريق المحلي 30

ختم 2026-نوفمبر-02، 10:33، الارتفاع 167.9 م.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، بقيم نهاية كل شهر؛ وينتهي خط الفعلي في 31-أكتوبر-2026. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

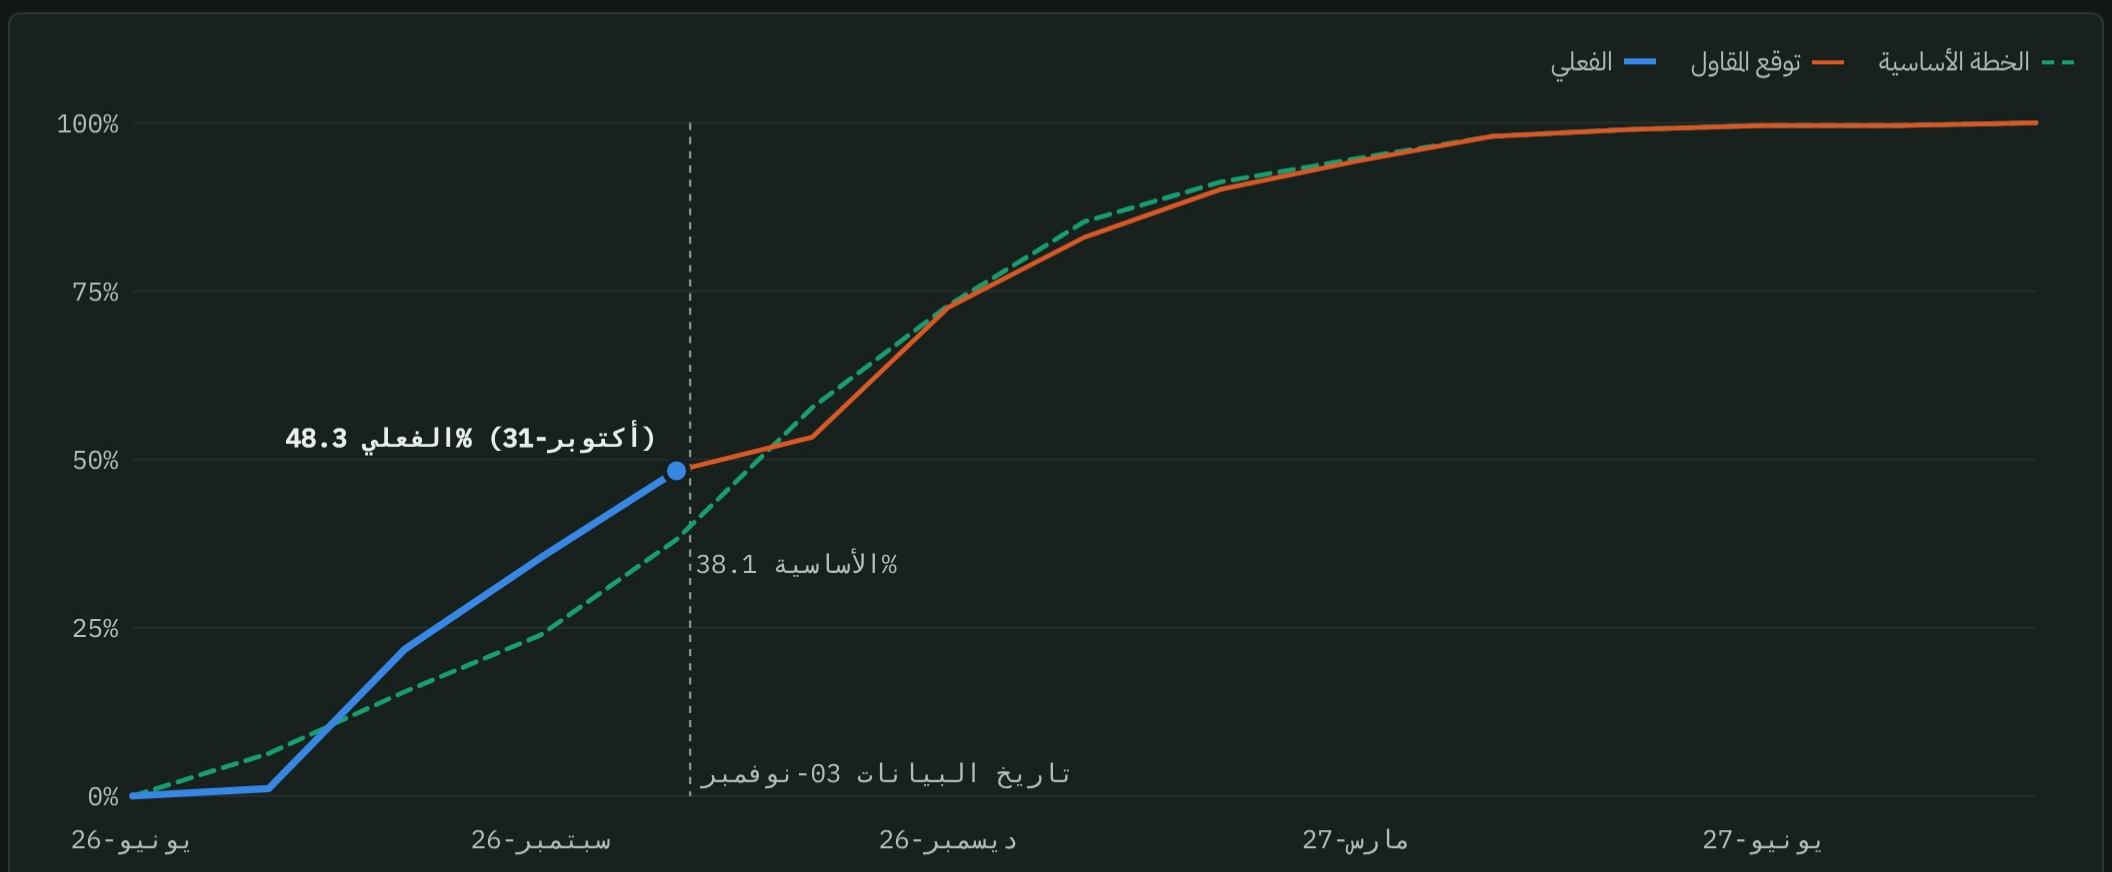

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026	28.5	41.0	+12.4%	—	1.44
20-Oct-2026	32.6	45.2	+12.6%	+4.3	1.39
27-Oct-2026	35.7	48.3	+12.6%	+3.0	1.35
03-Nov-2026	**39.2**	**53.3**	**+14.1%**	**+5.0**	**1.36**

الصفوف مأخوذة من التقارير الأسبوعية من رقم 17 إلى رقم 19. صف 2026-أكتوبر-13 هو قيمة "CM Last Week" الواردة في التقرير رقم 17، ولم تُرفع الأسابيع السابقة.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة (218,590 ساعة إجمالًا). المصدر: ورقة Weekly Progress Report وتحديث P6.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز والحشد	3.6%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	2.7%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	2.2%	90.3%	59.8%	−30.4%	0.66	▼ متأخر
أعمال الطرق	54.3%	38.0%	53.0%	+15.0%	1.39	▲ متقدم
تصريف مياه الأمطار والسيول	35.6%	28.9%	46.7%	+17.8%	1.62	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	1.1%	0.0%	25.0%	+25.0%	–	▲ بدأ مبكرًا
التسليم والإغلاق	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	–	لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**39.2%**	**53.3%**	**+14.1%**	**1.36**	▲ متقدم

يضم تحديث P6 (UP 16)، تاريخ البيانات 2026-نوفمبر-03) 381 نشاطًا: 160 مكتملًا و56 قيد التنفيذ و165 لم تبدأ. تاريخ الانتهاء المجدول 2027-أكتوبر-28 بفائض كلي −55 يومًا. تغيرت أنشطة المسار الحرج من 166 إلى 163 هذا الأسبوع، وتسجل ورقة البرنامج الزمني 33 نشاطًا متأخرًا في البدء.

نطاق العمل: الكميات

إجمالي النطاق والكمية المنفذة للبنود الجارية، من ورقة الكميات الرئيسية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 03-2026-نوفمبر. عمود "المنفذ هذا الأسبوع" هو الكمية التراكمية لهذا الأسبوع مطروحًا منها كمية تقرير 27-2026-أكتوبر.

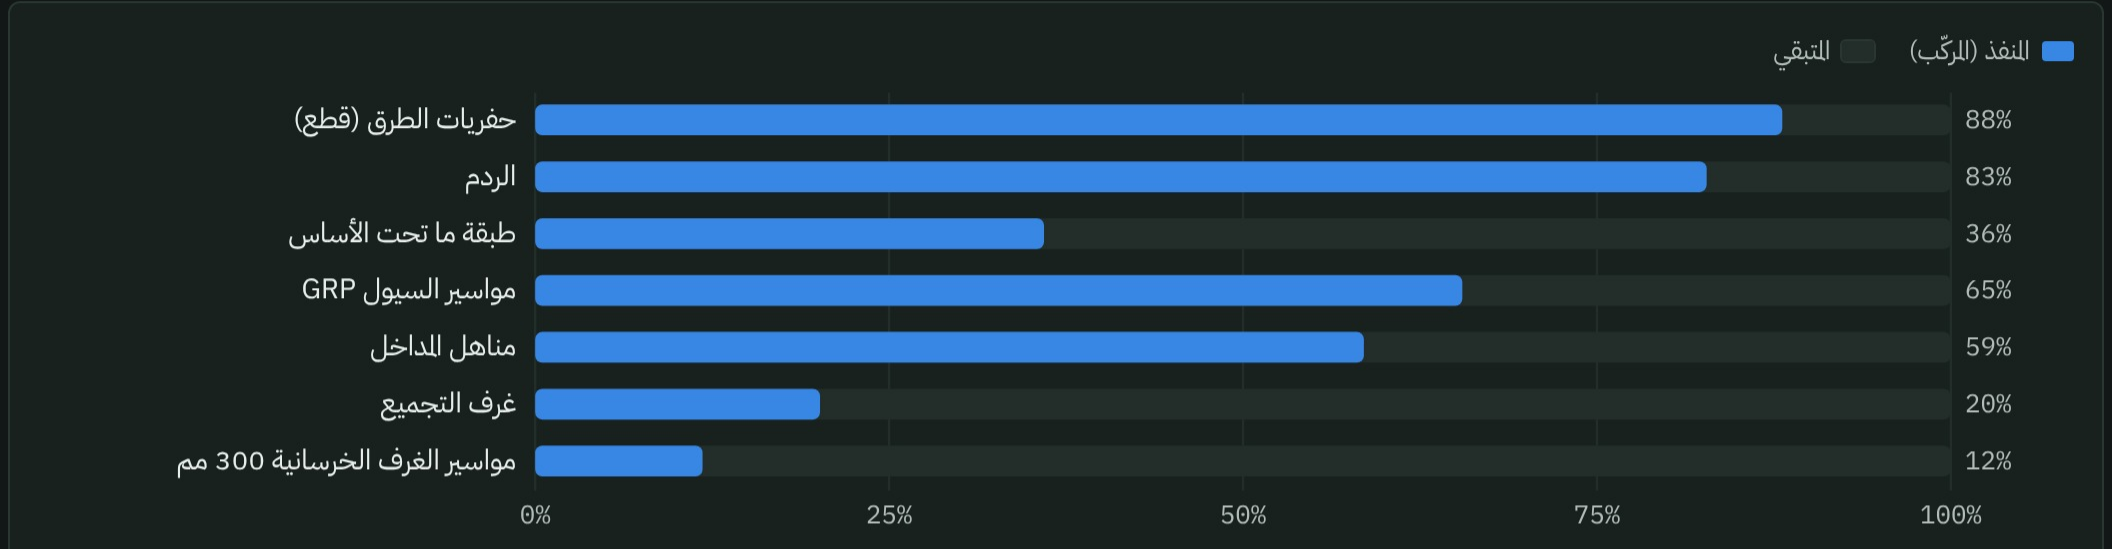

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
حفريات الطرق (قطع)	جميع الطرق	م³	252,115	222,090	0	30,025	88.1%	–
الردم	جميع الطرق	م³	221,841	183,569	0	38,272	82.7%	–
طبقة ما تحت الأساس	جميع الطرق	م³	39,250	14,108	6,686+	25,142	35.9%	–
مواسير السيول GRP	جميع الطرق	م.ط	5,855	3,834	413.5+	2,021	65.5%	–
مناهل المداخل	جميع الطرق	عدد	82	48	10+	34	58.5%	–
غرف التجميع	جميع الطرق	عدد	164	33	18+	131	20.1%	–
مواسير الغرف الخرسانية 300 مم	جميع الطرق	م.ط	5,410	639.7	464.7+	4,770	11.8%	–

تقدم طبقة ما تحت الأساس وتصريف السيول هذا الأسبوع

تضاعفت طبقة ما تحت الأساس تقريبًا إلى 14,108 م³ (36% من 39,250 م³)، معظمها في الطريق المحلي 11، مقابل 3,580 م³ مخطط حتى تاريخه. ولم يتغير القطع (222,090 م³) والردم (183,569 م³) مرة أخرى، وما زالا متقدمين كثيرًا عن المخطط البالغ 170,228 م³ و149,787 م³.

لم تبدأ بعد

طبقة الأساس الحصوية، وطبقتا الأساس والسطح الإسفلتيتان، والإنترلوك، والعلامات الأرضية، واللوحات المرورية كلها عند 0%. والبردورات أيضًا عند 0% في الكميات، رغم أن صورة في ملف المتابعة تُظهر تركيب البردورات في الطريق المحلي 30. وتضيف قائمة الأعمال الأسبوعية 230 م من مواسير UPVC غير الواردة في ورقة الكميات الرئيسية.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث P6 (UP 16) تواريخ التوقع نفسها. يعرض التقرير الأسبوعي التأخير بالأيام التقويمية، ويعرض عمود P6 الفائض الكلي.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	25-Jun-2026	25-Jun-2026	25-Jun-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم البرنامج الزمني الأساسي	12-Jul-2026	12-Jul-2026	12-Jul-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
إتمام التجهيز والحشد	23-Jul-2026	15-Aug-2026 (+23 يومًا)	15-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخرًا
اعتماد المخططات والمواد	23-Aug-2026	19-Sep-2026 (+27 يومًا)	19-Sep-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخرًا
إنجاز تصريف مياه الأمطار والسيول	24-Feb-2027	24-Apr-2027 (+59 يومًا)	24-Apr-2027	−32	▼ متأخر
إنجاز أعمال الطرق	24-Apr-2027	29-Jun-2027 (+66 يومًا)	29-Jun-2027	−38	▼ متأخر
إنجاز المشروع	24-Aug-2027	28-Oct-2027 (+65 يومًا)	28-Oct-2027	−55	▼ متأخر

تأخرت معالم التنفيذ الثلاثة 7 أيام أخرى هذا الأسبوع.

انتقل إنجاز تصريف السيول من أبريل-17 إلى 2027-أبريل-24، وأعمال الطرق من يونيو-22 إلى 2027-يونيو-29، وإنجاز المشروع من أكتوبر-21 إلى 2027-أكتوبر-28، وهو التأخير الأسبوعي الثالث على التوالي بمقدار 7 أيام. ويشمل الفائض السالب جميع الطرق: الطريق المحلي 28 عند −55 يومًا، و30 عند −47، و17 عند −46، و11 عند −44، و29 عند −41؛ والتوريدات عند −7 أيام.

توريد المواد الرئيسية

نسبة إنجاز التوريدات لكل مادة. المصدر: سجل التوريدات، التقرير الأسبوعي بتاريخ 2026-نوفمبر-03 (دون تغيير عن الأسبوع السابق).



مواد الرصف: لا توجد أوامر شراء حتى الآن


لا توجد أوامر شراء لطبقة الأساس الحصوية والأساس الإسفلتي والبردورات مسبقة الصب والإنترلوك والعلامات الأرضية، رغم مرور تواريخ الطلب المطلوبة (من أغسطس-29 إلى 17-سبتمبر-2026). ونقلت قائمة الأنشطة المتأخرة في البدء أمر شراء طبقة الأساس الحصوية من أكتوبر-27 إلى 2026-نوفمبر-03، وأمر شراء الأساس الإسفلتي من نوفمبر-02 إلى 09-نوفمبر-2026. وتلزم طبقة الأساس الحصوية في الموقع بحلول 2026-نوفمبر-15.

مواد تصريف السيول

اكتملت توريدات مواسير GRP (5,855 م) ومناهل المداخل (82) واللوحات المرورية (171). وما زالت غرف التجميع عند 110 من 164 (67%)، ونُقل التوريد الثالث من نوفمبر-05 إلى 2026-نوفمبر-12.

القوى العاملة

متوسط عدد العاملين الشهري في الموقع (عمالة وموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة القوى العاملة؛ وقيمة نوفمبر حتى تاريخه.

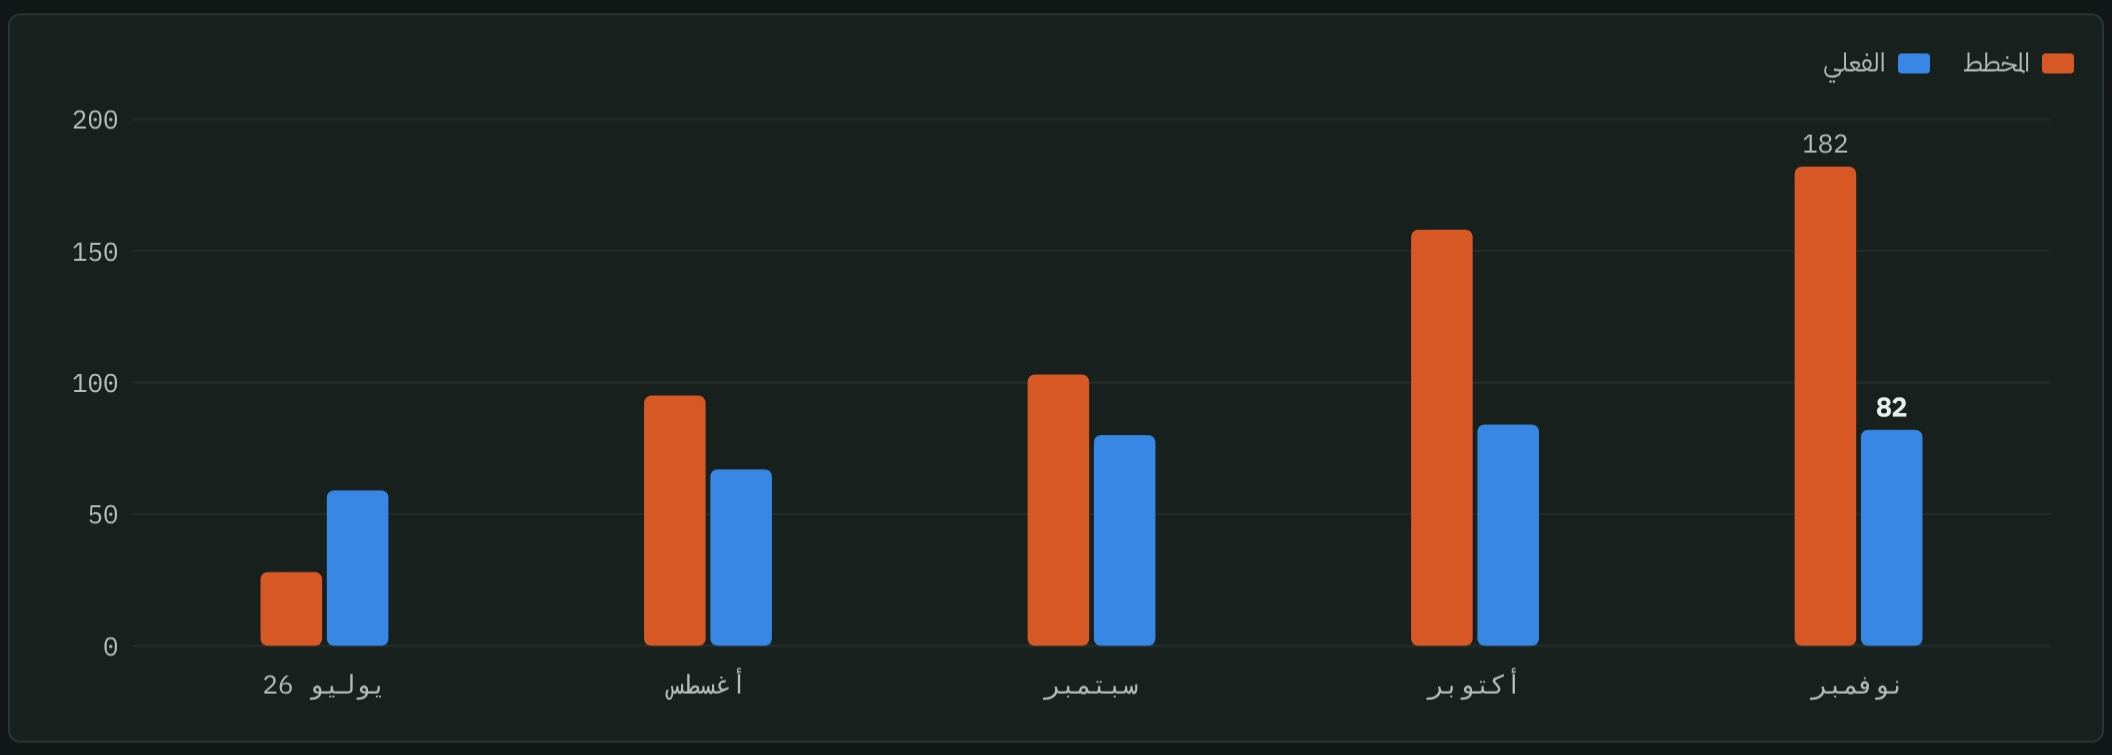

عدد العاملين في نوفمبر حتى الآن 82 مقابل 182 مخطط (−55%): 67 عاملًا مقابل 169 مخطط، و15 موظفًا مقابل 13. المعدات في الموقع 61 مقابل 91 مخطط. وأُغلق شهر أكتوبر عند 84 مقابل 158.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الطرق	19,411,954
تصريف مياه الأمطار والسيول	13,628,050
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**33,040,004**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	37,996,005
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال السعودي. تمثل أعمال الطرق 58.8% من جدول الكميات وتصريف مياه الأمطار والسيول 41.2%. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	3
القيمة الإجمالية	6,754,935
الخصومات والغرامات	2,000
الصافي شاملاً الضريبة	7,770,175
المدفوع (3 مستخلصات)	7,770,175
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	10,495,811

تبلغ المستخلصات 20.4% من قيمة العقد مقابل تقدم فعلي 53.3%. المستخلصات الثلاثة مدفوعة بالكامل، ولم يُقدَّم مستخلص عن الأعمال المنفذة بعد 2026-سبتمبر-27. لا توجد دفعة مقدمة ولا محتجزات.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.89

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	42,941
ساعات العمل هذا الأسبوع	2,976
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	1
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	4 / 20

الجودة التقييم 0.90

طلبات الفحص الصادرة (تراكمي)	296
طلبات الفحص المغلقة / المعلقة	254 / 42
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	42 / 42
تقارير عدم المطابقة الصادرة	0
تعليمات الموقع (مغلقة)	1
المخططات التنفيذية المعتمدة	22 / 23
اعتمادات المواد	40 / 42

تفتيش الاستشاري للجودة والسلامة بتاريخ 2026-نوفمبر-03. صدر هذا الأسبوع 44 طلب فحص.

المشكلات والمخاطر القائمة

الخطر	المسؤول	التفاصيل
السقوط في الحفريات	المقاول	تربة غير مستقرة وغياب الحواجز. حواجز ولوحات تحذيرية ومشرف عند الحفريات. التقييم مرتفع (H20، وH16 بعد المعالجة).
إدارة الحركة المرورية	المقاول	حوادث مركبات بسبب قصور تحويلات المرور. لوحات تحويل وحواجز ومنظمو حركة. التقييم مرتفع (H16).
كفاءة المشغلين	المقاول	حوادث بسبب نقص تدريب المشغلين والإشراف عليهم. تدريب وتقييم للكفاءة وإشراف. التقييم مرتفع (H16).
انسكاب الزيوت	المقاول	تلوث التربة بسبب تسربات المعدات أو سوء التعامل مع الزيوت. خطة استجابة للانسكاب وصيانة واحتواء. التقييم متوسط (M9).

لم يتغير سجل المخاطر عن الأسبوع السابق. وسجل المشكلات ولوحة أهم المشكلات في التقرير الأسبوعي فارغان، وخانة التحديات في ملف المتابعة فارغة.

ملاحظات على البيانات

- تصف الملفات الملخصة (ملفا الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز، وملف المتابعة) نسبة مبنية على التكلفة بأنها التقدم "الفعلي". يعتمد هذا التقرير على التقدم الفعلي بساعات العمل فقط.
- تعطي ورقة Weekly Progress Report نسبة 53.59% منجزة لأنها تحتسب ساعات الاختبار والتشغيل البالغة 600 ساعة مرتين. ويعطي تحديث P6 وورقة Physical-Chart Data 116,534 ساعة عمل، أي 53.31%، وهي ما يعتمده هذا التقرير.
- تُظهر لوحة التقدم الفعلي الأسبوعي 7.16% مخطط و10.36% منجز هذا الأسبوع لأنها تجمع الصفوف مرتين؛ والقيم الصحيحة 3.58% و5.04%.
- تستخدم ورقة Progress الآن ميزانية 218,290 ساعة عمل (39.3% و53.4%)، بينما تستخدم الورقة الرئيسية وP6 218,590 ساعة.
- تُظهر أعمال الاختبار والتشغيل 600 ساعة عمل منجزة (25%) واختبار شبكة السيول مكتملًا بنسبة 50%، رغم أن الاختبارات مخطط لها أن تبدأ في 2027-فبراير-25.
- يُظهر ملف نسب الإنجاز وملف الأعمال المنفذة تقدم هذا الأسبوع مرة أخرى بإشارتين متعاكستين. ويحمل اسم ملف الأعمال المنفذة تاريخ 2026-10-03، وما زال يذكر عقدًا من 2025-نوفمبر-24 إلى 2026-مايو-23.
- اسم مدير المشروع في مدن مكتوب "الجليفي" في ملف نسب الإنجاز و"الشنيفي" في ملف الأعمال المنفذة.
- رقم الأسبوع: يذكر التقرير أسبوع العقد 19 من 61 (ورقة المعالم). وعدد الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع حتى تاريخ البيانات 18.
- لم تتغير كميات القطع والردم حتى تاريخه في ورقة الكميات الرئيسية للأسبوع الثاني، بينما تذكر قائمة الأعمال مرة أخرى 4,260 م³ قطعًا في الطريق المحلي 17.
- تختلف قائمة الأعمال عن ورقة الكميات الرئيسية في أعمال هذا الأسبوع: مواسير GRP 644 م مقابل 414 م، وغرف التجميع 13 مقابل 18. ولا ترد مواسير UPVC البالغة 230 م في ورقة الكميات الرئيسية.
- تُظهر صورة في ملف المتابعة أعمال تركيب البردورات في الطريق المحلي 30، بينما كمية البردورات 0 في ورقة الكميات الرئيسية ولا يوجد لها أمر شراء.
- تسجل ورقة البرنامج الزمني 31 نشاطًا متأخرًا في البدء في الأسبوع السابق و33 هذا الأسبوع، بينما ذكر تقرير الأسبوع السابق 35. وما زالت قائمة الأنشطة المتأخرة في البدء تحمل عنوان المشروع MKH2-02-003 وتاريخه.
- تذكر ورقة Progress Summary 2,763 م من مواسير تصريف السيول مقابل 3,834 م من مواسير GRP في ورقة الكميات الرئيسية، وما زالت تذكر 156 غرفة تجميع مقابل 164.
- يصل التوقع في ورقة Physical-Chart Data إلى 100% في 2027-أغسطس-31، بينما ينتهي P6 في 2027-أكتوبر-28.
- تاريخ اعتماد البرنامج الزمني الأساسي 2025-يوليو-13، أي قبل ترسية العقد في 2026-مايو-11.
- تسرد ورقة الكميات الرئيسية عدة بنود مرتين بإجماليات مختلفة، وتتضمن بنودًا كهربائية ليست ضمن نطاق هذا المشروع.
- تُظهر لوحة ملخص القوى العاملة 28 مخطط و94 فعلي، بينما تعطي ورقة القوى العاملة 182 مخطط و82 فعلي لشهر نوفمبر.
- يُظهر ملخص المستخلصات 0 مستخلصات مقدمة، بينما يسرد سجل المستخلصات 3 مستخلصات. والتغييرات المحتملة 0 في الملخص و200,000 ريال في سجل المستخلصات.
- يصنف سجل المخاطر المخاطر الأربع للمشروع على أنها مغلقة بينما حالة معالجتها مفتوحة، ويتضمن أيضًا صفوفًا للمشروع MKH2-02-003.
- تُظهر عدة لوحات ملخصة في ملف التقرير الأسبوعي أخطاء #REF!.
- صور الموقع مأخوذة من عرض المتابعة (بعرض 1,200 إلى 1,296 بكسل). أما الصور الأربع المضمنة في ملف التقرير فعرضها أقل من 600 بكسل ولم تُستخدم.

أُعدّ في 2026-نوفمبر-04 من التقرير الأسبوعي رقم 19 (تاريخ البيانات 2026-نوفمبر-03)، مع التقرير رقم 18 للأسبوع السابق.
