تطوير البنية التحتية بالمدينة الصناعية الأولى بجدة (1كم2)

Infrastructure Development for Industrial City 1 in Jeddah

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	م. عبدالله الجليفي	19-Nov-2025	18-Nov-2027

النطاق: أعمال الطرق وشبكات السيول والصرف الصحي ومياه الشرب والمياه المعالجة، والأعمال الكهربائية، والسور والبوابات، وجسر، وأعمال تنسيق المواقع. قيمة العقد 86.8 مليون ريال، ومدته 24 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي بعدد ساعات العمل المخططة. بنسبة إنجاز 75.2% مقابل 49.1% مخططاً، المشروع متقدم بنسبة 26.1% (مؤشر الأداء الزمني 1.53). وحقق هذا الأسبوع 1.77% مقابل 1.10% مخططاً، أي أكثر من ضعف ما حققه الأسبوع الماضي (0.77%). ومع ذلك يتوقع الجدول الزمني الآن الانتهاء بعد تاريخ العقد بـ198 يوماً، أي بعد توقع الأسبوع الماضي بأسبوع آخر.

نسبة الإنجاز الفعلي
75.2% / 49.1% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.53 +26.1%

التقدم هذا الأسبوع
+1.77% / +1.10% مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.67%

المدة المنقضية من العقد
47.9% · اليوم 349 من 729
▼ الانتهاء المتوقع 03-يونيو-2028

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
56.5% · 49.1 مليون ريال
8 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 29-أكتوبر-2026

متقدم كثيراً في الإنجاز، لكن الانتهاء المتوقع متأخر ستة أشهر.

يتوقع كل من التقرير الأسبوعي وتحديث P6 الانتهاء في 03-يونيو-2028، أي بعد تاريخ انتهاء العقد (18-نوفمبر-2027) بـ198 يوماً، بفائض زمني كلي −169 يوماً (−163 الأسبوع الماضي). وتأخر كل معلم مفتوح سبعة أيام أخرى هذا الأسبوع، وهو التأخر الأسبوعي الثالث على التوالي. وبند الطرق والجهد المتوسط، وهو المتأخر عن الخطة (73.5% مقابل 100% دون تغيير منذ ثلاثة أسابيع)، يعتمد على شبكة الجهد المتوسط التي تنتظر الاتفاقية بين مدن والشركة السعودية للكهرباء، ولم تصدر بعد أوامر شراء تمديدات الجهد المتوسط ووحدات RMU ومحطات الإنارة.


صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من ورقة الصور الأسبوعية في التقرير الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026، وتحمل ختم الكاميرا من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026 حيث يظهر الختم. تجري أعمال الطبقة الإسفلتية السطحية وتمديدات الاتصالات ومواسير الري والبردورات وقواعد اللوحات. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



مواسير الاتصالات، الطريق المحلي L01

مواسير ممدودة على طول الخندق. مختومة 02-نوفمبر-2026، 06:49.

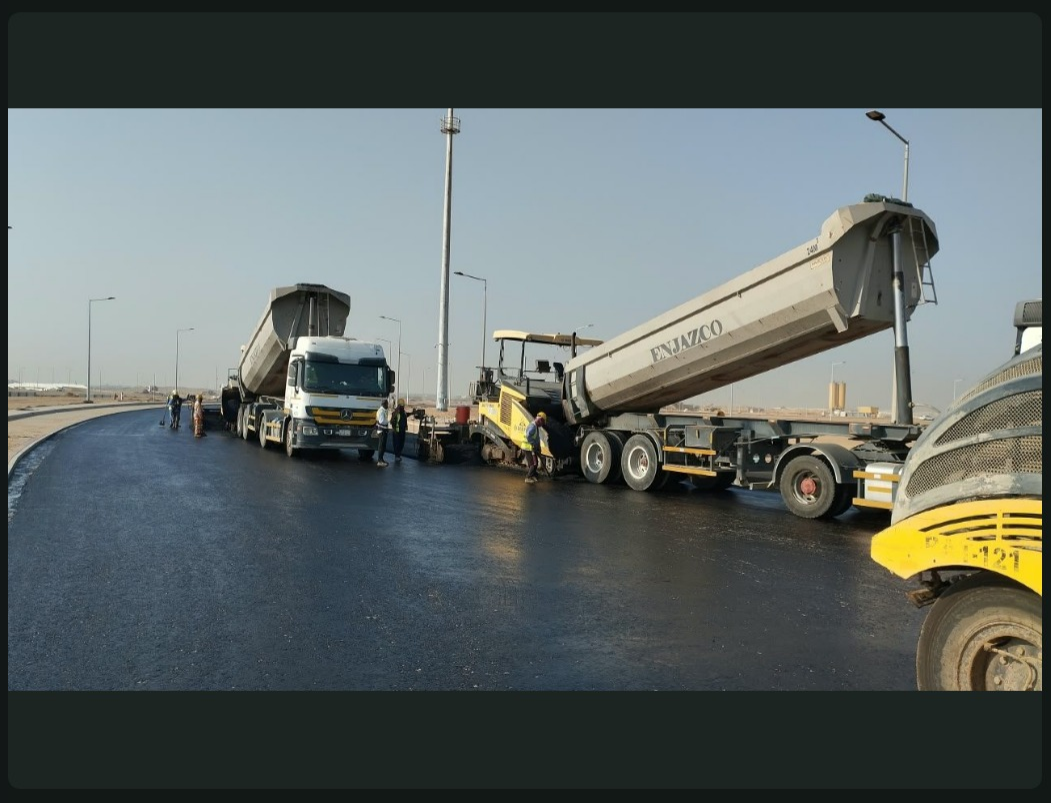

الطبقة الإسفلتية السطحية

شاحنات قلابة تغذي الفرّادة. بدون ختم تاريخ.



مواسير الري

مواسير الري ممدودة في الخندق لأعمال تنسيق المواقع. بدون ختم تاريخ.




أعمال الطبقة الإسفلتية السطحية

الفرّادة والطاقم على الطبقة السطحية. مختومة 02-نوفمبر-2026، 07:45.



أعمال البردورات

ماكينة البردورات والطاقم على حافة الطريق. مختومة 29-أكتوبر-2026، 07:25.

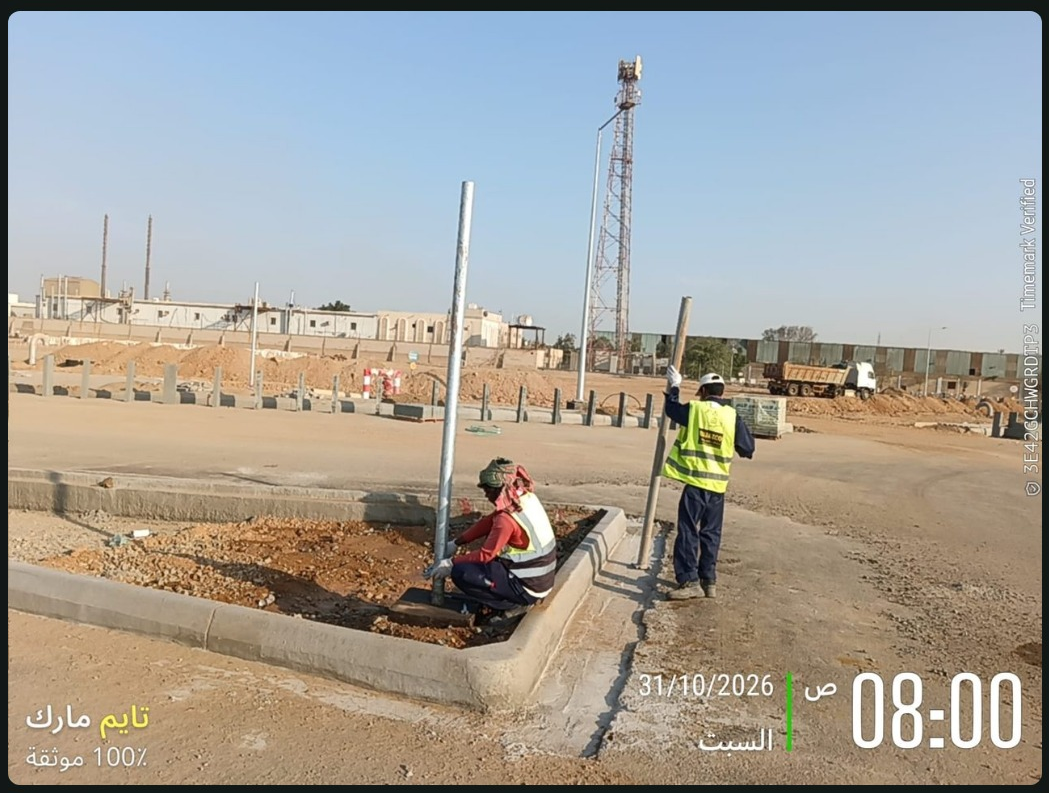


قواعد اللوحات

عمود اللوحة مثبت في قاعدته. مختومة 31-أكتوبر-2026، 08:00.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data. الخطة المعدلة في الورقة مطابقة للخطة الأساسية، لذا رُسمت الخطة الأساسية فقط.

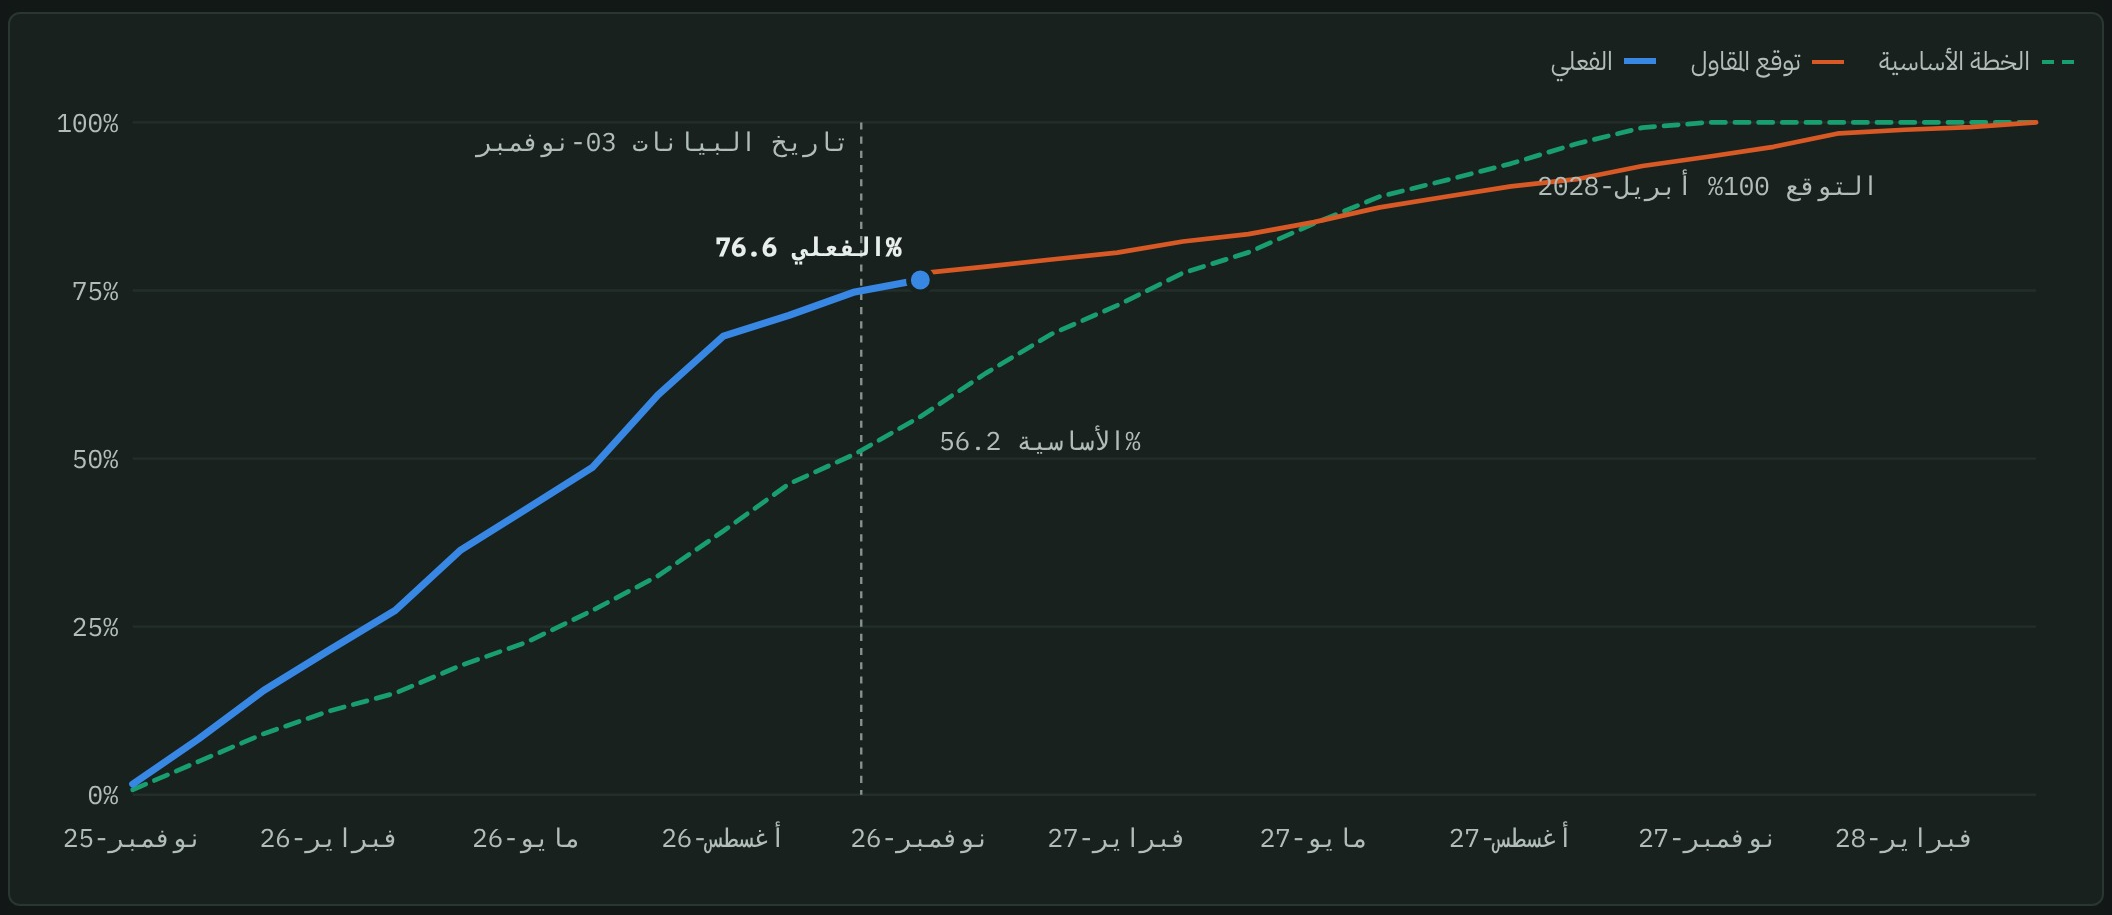

الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
20-Oct-2026	46.99	72.61	+25.63	—	1.55
27-Oct-2026	47.99	73.38	+25.40	+0.77	1.53
03-Nov-2026	**49.08**	**75.16**	**+26.07**	**+1.77**	**1.53**

صفا 27 أكتوبر و3 نوفمبر مأخوذان من التقريرين الأسبوعيين بهذين التاريخين، والصف الأول من عمود "الأسبوع الماضي" في تقرير 27 أكتوبر ولا يُذكر المنجز فيه. وأحدث قيمة فعلية في المنحنى (76.6%) مأخوذة من بيانات P6 وهي أعلى من 75.2% في لوحة التقرير، انظر ملاحظات على البيانات.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. وتظهر المراحل الفرعية للتنفيذ تحت بند التنفيذ.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	2.8%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	4.7%	100.0%	98.8%	-1.2%	0.99	▼ متأخر قليلاً
التوريدات	11.5%	43.5%	78.9%	+35.4%	1.81	▲ متقدم
التنفيذ	76.3%	47.9%	74.9%	+26.9%	1.56	▲ متقدم
· أعمال الإزالة	1.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· الطرق والجهد المتوسط	14.0%	100.0%	73.5%	-26.5%	0.73	▼ متأخر
· الشبكات العميقة	7.6%	100.0%	95.9%	-4.1%	0.96	▼ متأخر قليلاً
· الشبكات السطحية	27.8%	28.1%	80.5%	+52.4%	2.87	▲ متقدم
· الجسر	2.0%	57.7%	87.1%	+29.4%	1.51	▲ متقدم
· خارج حدود المشروع (خطوط الربط)	2.8%	55.4%	99.7%	+44.3%	1.80	▲ متقدم
· تشطيبات الطرق	9.2%	0.0%	78.7%	+78.7%	–	▲ متقدم
· السور والبوابات	6.1%	57.1%	58.2%	+1.1%	1.02	▲ في المسار

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
· الدوار وتنسيق المواقع	5.8%	0.0%	15.1%	+15.1%	–	▲ متقدم
الاختبار والتشغيل	2.8%	0.0%	53.1%	+53.1%	–	▲ متقدم
إغلاق المشروع	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**49.1%**	**75.2%**	**+26.1%**	**1.53**	▲ متقدم

تذكر إحصائيات تحديث P6 (تاريخ البيانات 03-نوفمبر-2026) عدد 1,905 أنشطة: 1,339 مكتملاً و187 قيد التنفيذ و379 لم يبدأ. ومن الأنشطة الجارية الـ187 هناك 71 متقدمة و116 متأخرة. وانخفضت أنشطة المسار الحرج من 448 إلى 432، بينما ارتفعت الأنشطة المتعثرة البدء من 105 إلى 116. وبدأت أعمال تنسيق المواقع هذا الأسبوع قبل موعدها المخطط.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية لبنود جدول الكميات الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 03-نوفمبر-2026. ويُظهر عمود "المنفذ هذا الأسبوع" الفرق عن تقرير 27-أكتوبر-2026. ولا يقسم التقرير الكميات حسب المنطقة ولا يذكر كميات الردم.

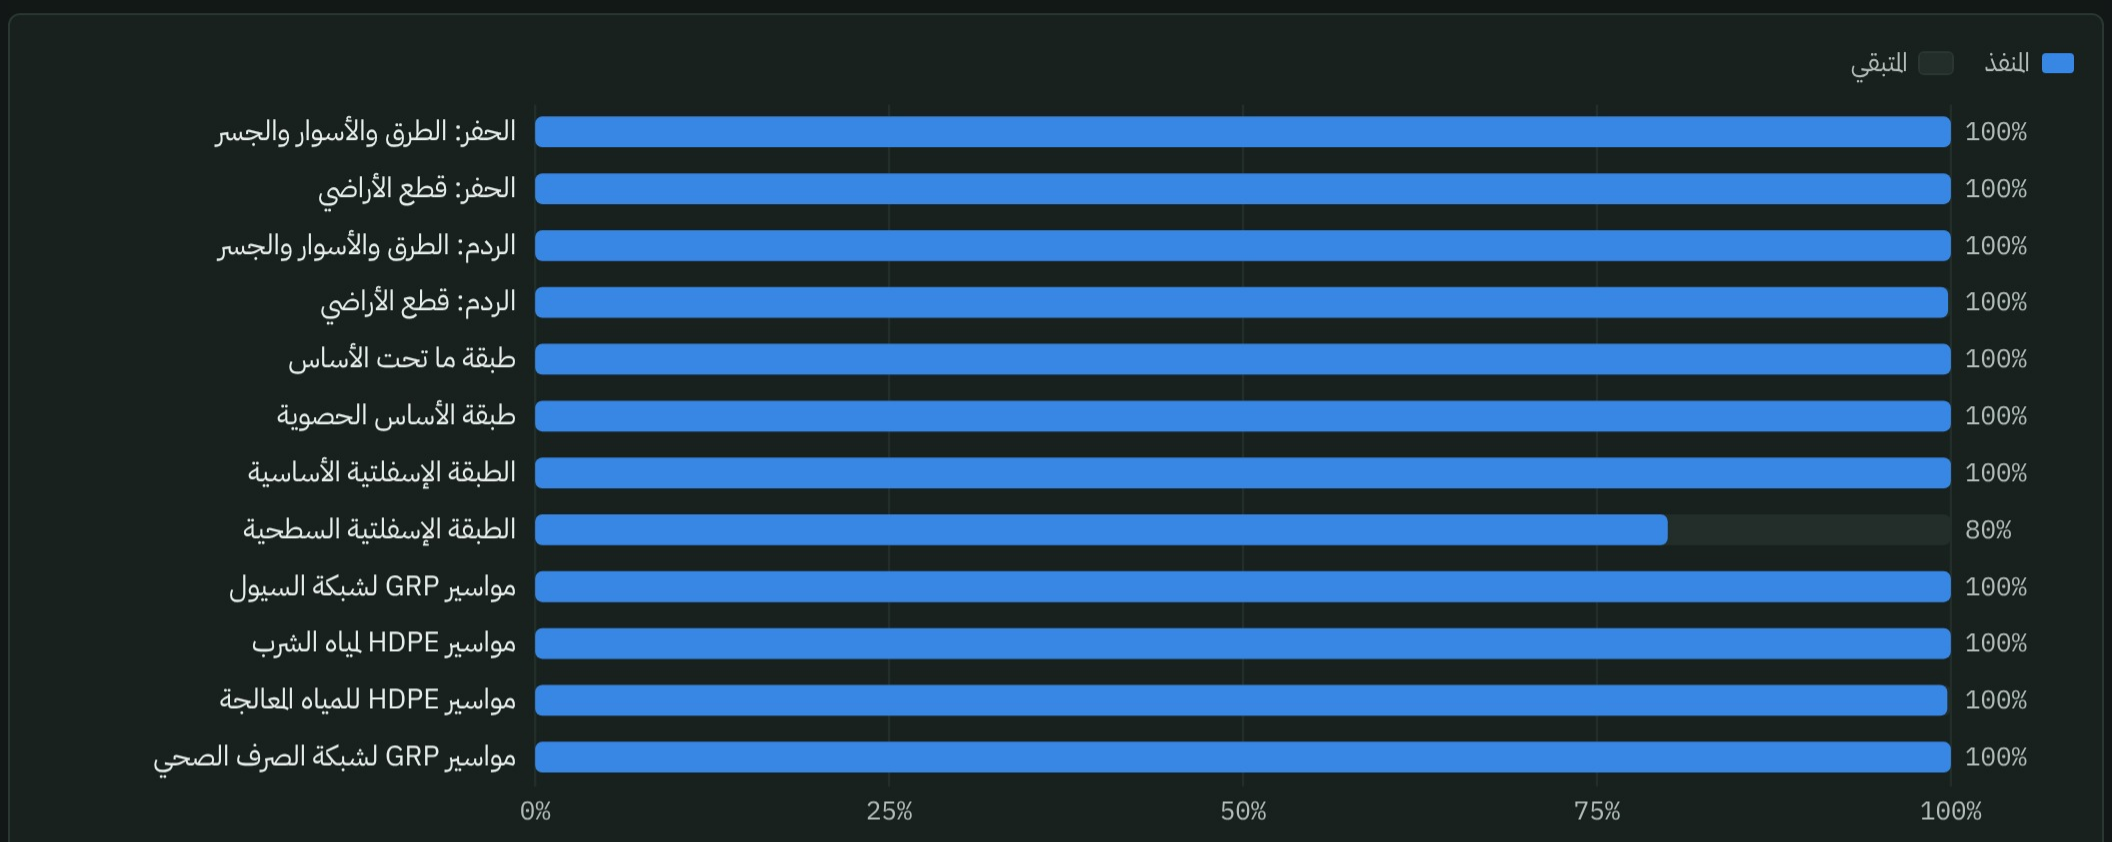

بند النطاق	المنطقة	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	الردم
الحفر: الطرق والأسوار والجسر	الكل	م³	116,177	116,177	0	0	100.0%	–
الحفر: قطع الأراضي	الكل	م³	123,555	123,555	0	0	100.0%	–
الردم: الطرق والأسوار والجسر	الكل	م³	80,920	80,920	0	0	100.0%	–
الردم: قطع الأراضي	الكل	م³	94,645	94,456	0	189.3	99.8%	–
طبقة ما تحت الأساس	الكل	م³	34,694	34,694	0	0	100.0%	–
طبقة الأساس الحصوية	الكل	م³	23,129	23,129	0	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية الأساسية	الكل	م³	8,290	8,290	0	0	100.0%	–
الطبقة الإسفلتية السطحية	الكل	م³	5,920	4,736	710.4+	1,184	80.0%	–
مواسير GRP لشبكة السيول	الكل	م.ط	5,650	5,650	0	0	100.0%	–
مواسير HDPE لمياه الشرب	الكل	م.ط	12,075	12,075	0	0.3	100.0%	–
مواسير HDPE للمياه المعالجة	الكل	م.ط	8,722	8,700	0	22	99.7%	–
مواسير GRP لشبكة الصرف الصحي	الكل	م.ط	6,244	6,244	0	0	100.0%	–

الطبقة الإسفلتية السطحية هي البند الوحيد الذي تقدّم

نُفّذ 710.4 م³ هذا الأسبوع ليصل الإجمالي إلى 4,736 من 5,920 م³ (80.0%). وبقية بنود الأعمال الترابية وطبقات الأساس والمواسير دون تغيير، وهي مكتملة أو متبقٍ منها أقل من 0.3%.

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية والتوقعات من ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي، والتوقعات والفائض الكلي من بيانات P6 في الملف نفسه.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	19-Nov-2025	19-Nov-2025	19-Nov-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
الجدول الزمني الأساسي	18-Dec-2025	18-Dec-2025	18-Dec-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	18-Dec-2025	04-Mar-2026	04-Mar-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
اعتماد المخططات التنفيذية وطرق التنفيذ والمواد	19-Jan-2026	21-Nov-2026	21-Nov-2026	−67	▼ متأخر
إصدار جميع أوامر الشراء	19-Jan-2026	15-Nov-2026	15-Nov-2026	−61	▼ متأخر
اكتمال الطرق والجهد المتوسط	17-Sep-2026	01-Feb-2027	03-Jul-2027	−104	▼ متأخر
اكتمال الشبكات العميقة	18-Nov-2026	03-Jul-2027	01-Feb-2027	42	؟ يتعارض مع P6
اكتمال الشبكات السطحية	18-Mar-2027	17-Oct-2027	17-Oct-2027	−46	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال	18-Nov-2027	03-Jun-2028	03-Jun-2028	−169	▼ متأخر

المصدران يتبادلان تاريخَي معلمين.

يتوقع التقرير الأسبوعي اكتمال الطرق والجهد المتوسط في 01-فبراير-2027 والشبكات العميقة في 03-يوليو-2027، بينما تعطي بيانات P6 التاريخين نفسيهما بالعكس. وتتفق بقية التوقعات. وتأخر كل توقع مفتوح سبعة أيام عن تقرير 27 أكتوبر، فأصبح معلما الاعتمادات وأوامر الشراء (14 نوفمبر و08 نوفمبر الأسبوع الماضي) مستحقين في 21 نوفمبر و15-نوفمبر-2026.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية الموّردة إلى الموقع من كمية جدول الكميات المعدلة. المصدر: ورقة Material Monitoring، التقرير الأسبوعي 03-نوفمبر-2026.



مواد الجهد المتوسط: لم يُطلب شيء


لم تُورَّد تمديدات الجهد المتوسط (14,500 م) ووحدات (4) RMU ومحطات الإنارة الفرعية (4) والعدادات (4) ونهايات التمديدات (64). ويُظهر سجل التوريدات أن أوامر تمديدات الجهد المتوسط والمحطات متوقفة حتى إنهاء اتفاقية الكهرباء بين مدن والشركة السعودية للكهرباء، والتوريد متوقع الآن في 30-نوفمبر-2026.

بنود تشطيب الطرق

الطبقة الإسفلتية السطحية: ورّد 4,736 من 5,920 م³ (80% بعد أن كانت 68%). ولم تُورَّد بعد علامات الطريق (3,780 م²) ودهان اللياسة (4,062 م²). وإجمالاً صدر 108 من 113 أمر شراء، ووصلت 105 من 113 مادة إلى الموقع.

القوى العاملة

عدد العمالة المباشرة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

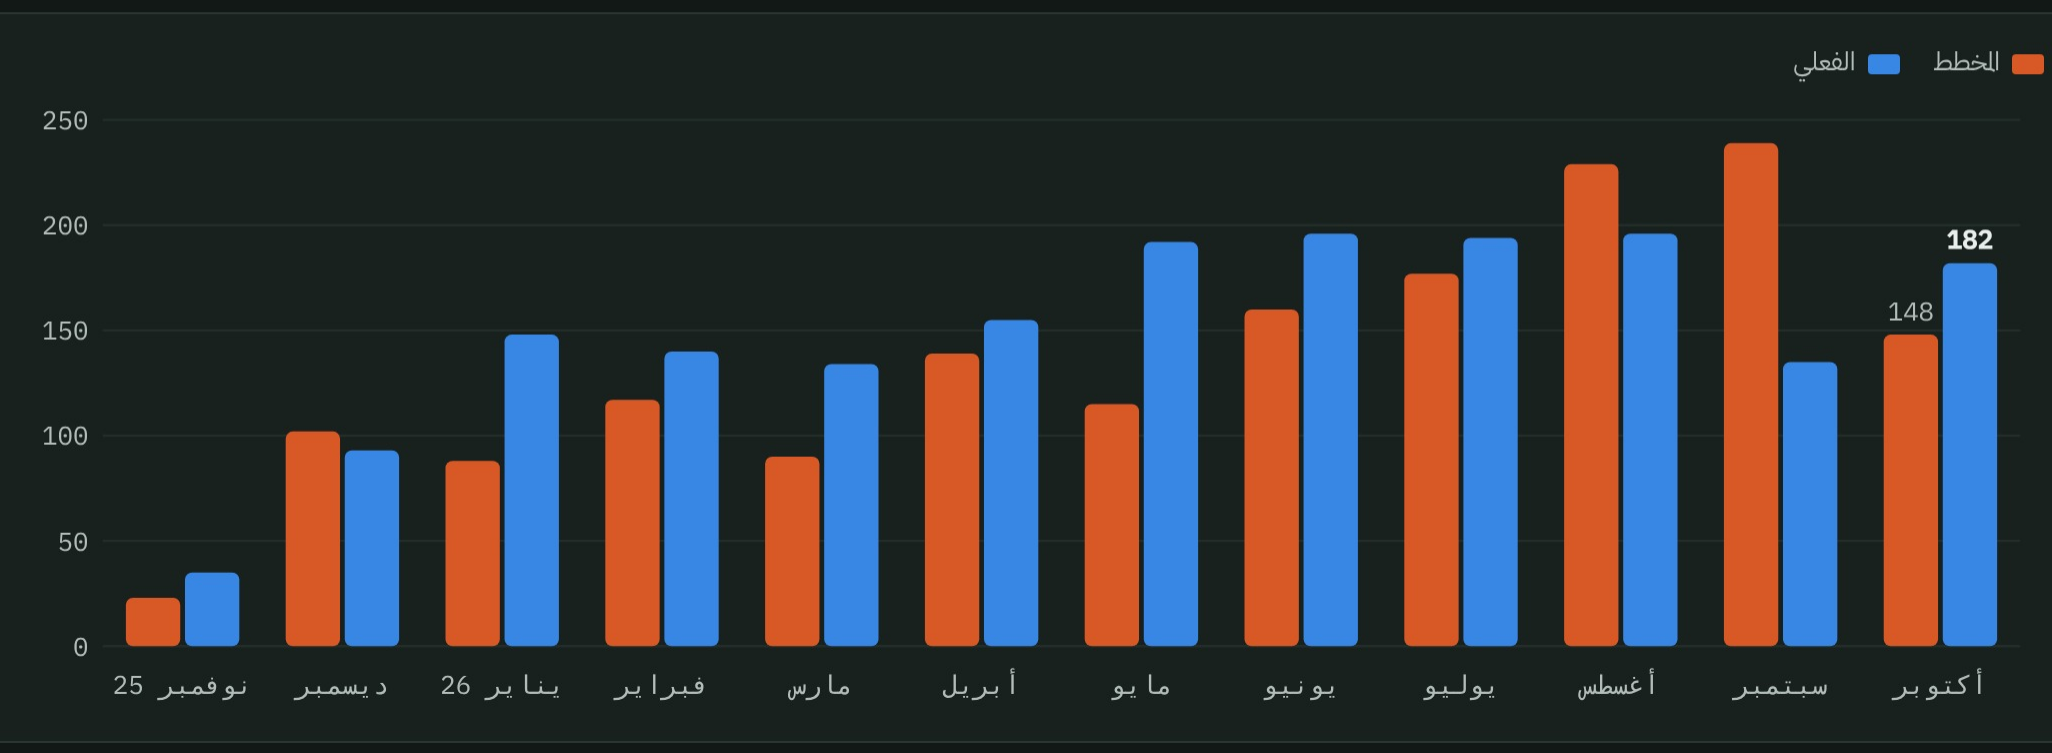

عدد العمالة المباشرة في أكتوبر 182 مقابل 148 مخططاً (+23%)، ولم يُذكر عدد نوفمبر بعد. والموظفون غير المباشرين 48 مقابل 22 مخططاً. والمعدات في الموقع 75 مقابل 60 مخططاً. وترتفع الخطة إلى 187 عاملاً في نوفمبر.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	86,782,345
قيمة العقد المعدلة	86,782,345
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	86,782,345
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة (ورقة CCO).

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	8
القيمة الإجمالية	49,066,274
المعتمد من مدير المشروع (7، شامل الضريبة)	51,579,627
المدفوع (7، شامل الضريبة)	51,579,627
المحتجزات / الخصومات	0 / 36,000
الدفعة المقدمة	0

المفوتر الإجمالي 56.5% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 75.2%. دُفع المستخلص 7 في 25-أكتوبر-2026. واعتمد الاستشاري المستخلص 8 (الفترة حتى 29-أكتوبر-2026، 4,882,589 شامل الضريبة بعد خصم 36,000) في 31-أكتوبر-2026، وهو بانتظار اعتماد مدير المشروع.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.73

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	483,442
ساعات العمل هذا الأسبوع	3,072
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية (تراكمي)	92 / 65

تفتيش السلامة من مدن 03-نوفمبر-2026: 7 بنود جيدة، و13 بحاجة إلى تحسين، و3 بنود راسبة (إدارة مخلفات الموقع، والتواصل واجتماعات السلامة، وجولات قيادة المشروع الميدانية).

الجودة التقييم 0.86

طلبات الفحص الميداني الصادرة / المغلقة	5,549 / 5,481
طلبات الفحص لدى الاستشاري	47
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	105 / 105
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	17 / 16
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	21 / 21
المخططات التنفيذية المعلقة	3

تقييم الجودة من الاستشاري 0.86 هذا الأسبوع، والمتوسط 0.83 لجميع عمليات التدقيق.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
اتفاقية الجهد المتوسط بين مدن والشركة السعودية للكهرباء	المسؤول	مفتوحة منذ 15-ديسمبر-2025، وكان الإغلاق المستهدف 30-ديسمبر-2025. تتابع مدن مع الشركة السعودية للكهرباء توفير مصدر الكهرباء، وينتظر المقاول الرد على الخطاب رقم 2818 بتاريخ 13-يناير-2026.
مواد الجهد المتوسط متوقفة	المالك / المقاول	تنتظر أوامر شراء تمديدات الجهد المتوسط ووحدات RMU ومحطات الإنارة الفرعية الاتفاقية. وأمر شراء وحدات RMU موسوم "متأخر"، وكان مطلوباً في الموقع بحلول 20-أكتوبر-2026 ولم يصدر بعد.
الانتهاء المتوقع	المقاول	يتوقع الجدول الزمني الانتهاء في 03-يونيو-2028 بفائض −169 يوماً، أي بعد تاريخ العقد بـ198 يوماً، رغم أن الإنجاز الفعلي متقدم على الخطة بنسبة 26.1%. وتأخر التوقع سبعة أيام في كل من التقارير الثلاثة الأخيرة.

المشكلتان الأخريان في السجل مغلقتان: تصاريح خطوط الربط من الشركة السعودية للكهرباء وSTC وشركة المياه الوطنية (أُغلقت 10-فبراير-2026)، وتأهيل موردي الشد اللاحق والركائز وفواصل التمدد.

ملاحظات على البيانات

أُعدّ من ملفات الأسبوع المرفوعة بتاريخ 03-نوفمبر-2026 (W06)، مع ملفات 27-أكتوبر-2026 (W05) لحساب تغيرات هذا الأسبوع.

- رقم الأسبوع: يذكر التقرير الأسبوع 49.86 (عدد الأسابيع الكاملة منذ تسليم الموقع: 49)، ومرجع الملف WPR-050.
- يختلف الإنجاز الفعلي بين الأوراق: تُظهر لوحة التقرير 75.2% (537,033 من 714,561 ساعة عمل)، بينما تُظهر بيانات P6 وورقة Physical-Chart Data نسبة 76.6% (547,132 ساعة عمل).
- يصف ملف الأعمال المنفذة خلال الأسبوع وورقتا Look Ahead والخلاصة التقدمَ المبني على التكلفة بأنه "الفعلي"، بينما يعتمد هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي بساعات العمل فقط. كما يذكر ملف الأعمال المنفذة رمز المشروع JDH3-03-011 وقيمة عقد 86,742,345 وانتهاءً متوقعاً في 30-نوفمبر-2026، وكذلك ورقة Look Ahead، أما لوحة التقرير وP6 فتتوقعان 03-يونيو-2028.
- مدير المشروع - مدن: م. عبدالله الجليفي في ورقة المعلومات العامة، وم. رضا المنشاوي في ورقة Look Ahead وملف الأعمال المنفذة خلال الأسبوع.
- المعالم: ما زال P6 والتقرير الأسبوعي يتبادلان تاريخَي الطرق والجهد المتوسط والشبكات العميقة، ويُظهر عمود "الخطة الأساسية" في لوحة التقرير تواريخ الخطة الأحدث.
- القوى العاملة: أصبح جدول الملخص معنوناً بشهر نوفمبر لكنه ما زال يعرض أرقام أكتوبر (148 مخططاً و182 فعلياً)، بينما خطة نوفمبر 187. وتذكر ورقة السلامة 3,072 ساعة عمل لهذا الأسبوع، أي ثلث الـ9,216 ساعة المذكورة في كل من الأسبوعين السابقين.
- ورقة Material Monitoring: تغيرت الكمية المعدلة لأعمدة الإنارة والكشافات من 404 إلى 443 (مورّدة بالكامل)، وعادت الكمية المركّبة لبند تمديدات الجهد المنخفض (6,115 م) من 230 م إلى 6,115 م.
- لم يتغير محتوى سجل التوريدات للأسبوع الثالث على التوالي.
- يتضمن المستخلص 8 خصماً بقيمة 36,000 يظهر أيضاً كغرامات في لوحة التقرير، ولم يُذكر سببه.
- مواسير HDPE: لا تسمّي ورقة Major Quantities الشبكة، واستُنتج أنها مياه الشرب والمياه المعالجة من الكميات، وتختلف الكميات المركّبة عن ورقة Material Monitoring.
- يبقى التراكمي الفعلي للمعدات عند 564 منذ يوليو رغم استمرار الأعداد الشهرية. وتُظهر عدة خلايا في لوحة التقرير أخطاء #REF!.

أُعدّ في 04-نوفمبر-2026 من التقرير الأسبوعي للأسبوع المنتهي في 03-نوفمبر-2026 (W06)، مع تقرير 27-أكتوبر-2026 (W05) لحساب تغيرات هذا الأسبوع.
