مبادرة الحرفيين (الصناعات منخفضة العمليات التصنيعية بنجران)

Construction of Industrial Units for Artisans in Najran

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة لبنات البناء	إيجيس (EGIS)	م. أحمد قطبي	03-Mar-2026	02-Jan-2027

النطاق: وحدة الصناعات منخفضة العمليات (RBF) ومسجد خارجي وغرفة مضخات وخزان مياه GRP، مع أعمال الموقع والخرسانة والمباني والتشطيبات والمنشآت المعدنية سابقة التصميم، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية بما فيها مكافحة الحريق وإنذار الحريق والطاقة الشمسية.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. يُظهر التقرير الآن اكتمال المشروع بنسبة 100% مقابل 85.3% مخطط، أي أنه متقدم على الخطة الأساسية بنسبة 14.7% (مؤشر الأداء الزمني 1.172).
بلغ تقدم هذا الأسبوع 1.5% مقابل 2.9% مخطط للأسبوع، واكتملت به أعمال الإغلاق والأعمال الكهربائية المتبقية.


نسبة الإنجاز الفعلي	التقدم هذا الأسبوع	المدة المنقضية من العقد	المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
100% / 85.3% مخطط	+1.5% / +2.9% مخطط	78.0% · اليوم 238 من 305	83.1% · 7.94 مليون ريال
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.172 · +14.7%	● اكتملت النسبة المتبقية 1.5% هذا الأسبوع	● أُبلغ عن الاكتمال في 27-أكتوبر-2026	6 مستخلصات، جميعها مدفوعة؛ آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

أُبلغ عن اكتمال المشروع قبل الموعد التعاقدي بـ 67 يوماً، لكن ذلك يحتاج إلى تحقق.

يُعلِّم التقرير الأسبوعي جميع الأعمال، بما فيها الاختبار والتشغيل والإغلاق، مكتملة في 27-أكتوبر-2026، وجميع أنشطة الجدول الزمني البالغة 1,462 نشاطاً منتهية. غير أن ورقة Testing لا تزال تخطط للاختبار والتشغيل من 09-ديسمبر-2026 إلى 19-ديسمبر-2026 دون تواريخ فعلية، ولا تزال ورقة Procurement تُدرج 22 من 108 بنود غير مورّدة، ولا يزال مخطط الموقع يُظهر الطبقة الإسفلتية السطحية لم تبدأ. ينبغي أن يؤكد الاستشاري الاكتمال قبل الاستلام الابتدائي.

صور الموقع هذا الأسبوع

صورتان من الصور الثلاث في ورقة "Weekly Photos" في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026 (أعمال غرفة المضخات)، مختومتان بتاريخ 27-أكتوبر-2026، منطقة نجران. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.

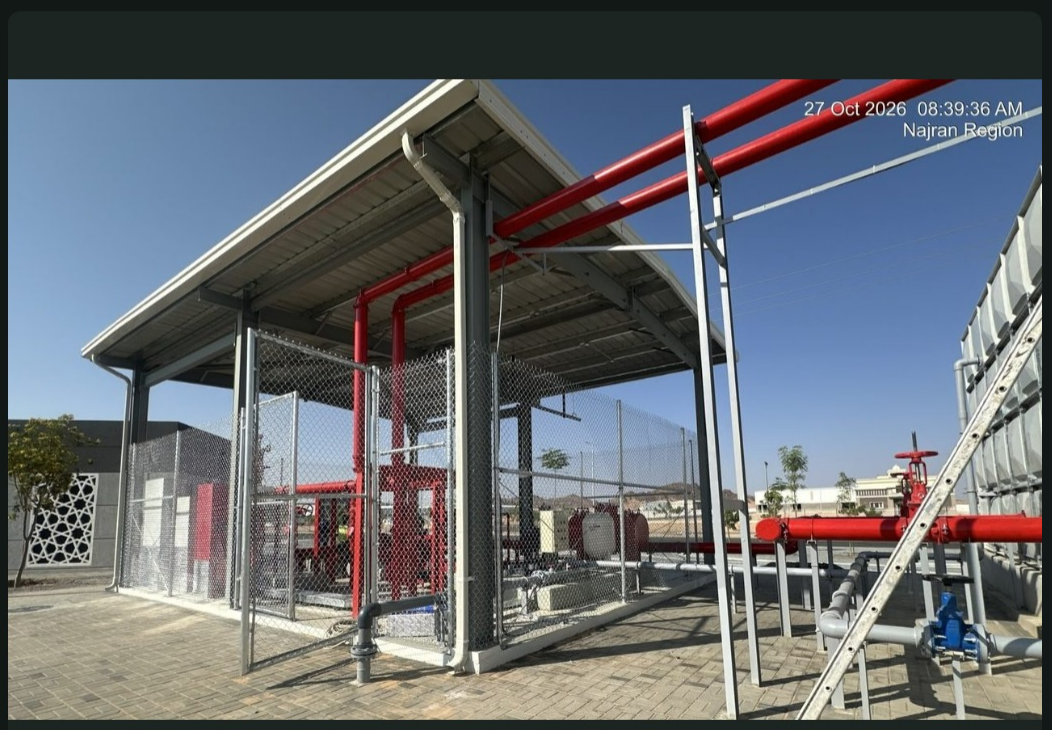

مظلة مضخات الحريق

مواسير مكافحة الحريق وغرفة المضخات المسيّجة بجانب خزان GRP. مختومة بتاريخ 27-أكتوبر-2026، 08:39.




غرفة المضخات وخزان المياه GRP

غرفة المضخات بسياجها الشبكي والإنترلوك حولها. مختومة بتاريخ 27-أكتوبر-2026، 08:40.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً؛ قيمة أكتوبر حتى 27-أكتوبر-2026. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

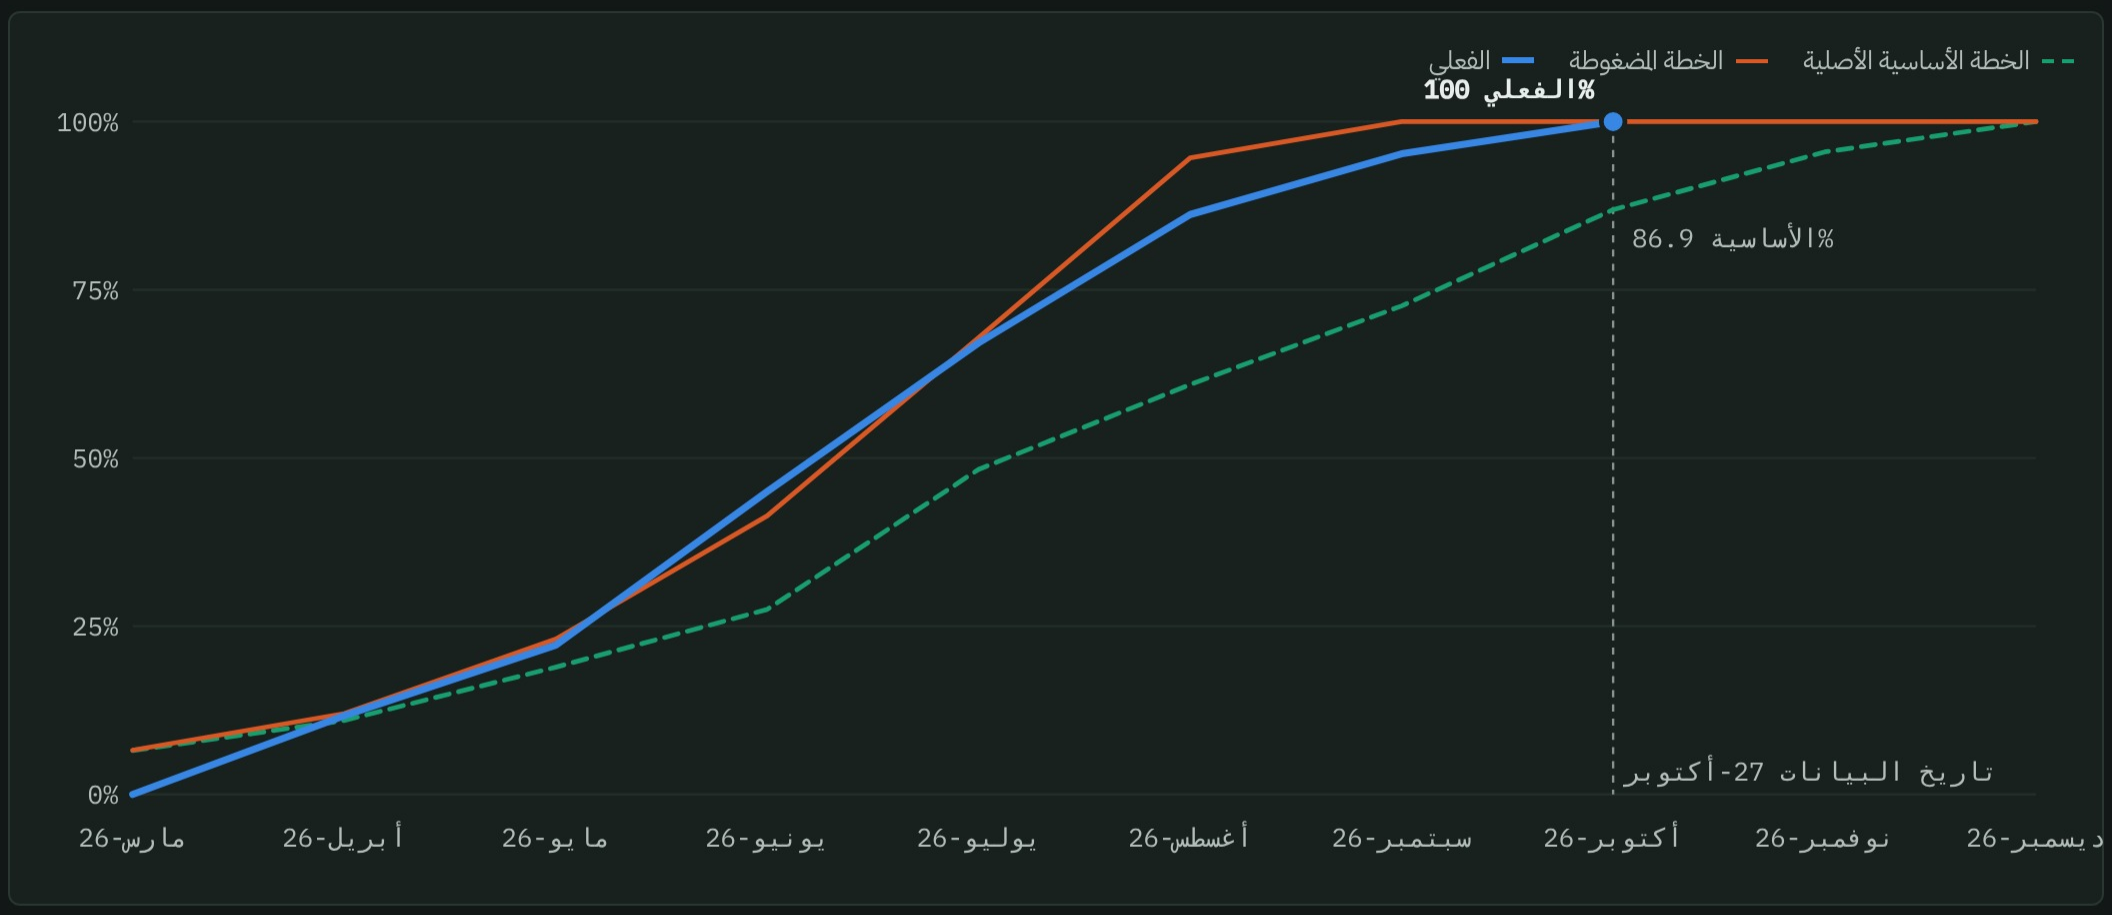

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
21-Oct-2026	82.4	98.5	+16.1	+2.0	1.195
27-Oct-2026	**85.3**	**100.0**	**+14.7**	**+1.5**	**1.172**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقريرين الأسبوعيين بتاريخ 21-أكتوبر-2026 و27-أكتوبر-2026؛ لم تُرفع الأسابيع السابقة. المنجز هذا الأسبوع (1.5% مقابل 2.9% مخطط) يطابق الزيادة من 98.5% إلى 100%.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقتا Weekly Progress Report وProgress.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	4.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	4.0%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التوريدات	12.0%	99.9%	100.0%	+0.1%	1.00	✓ مكتمل
التنفيذ	**76.3%**	**85.6%**	**100.0%**	**+14.4%**	**1.17**	✓ مكتمل
· أعمال الموقع	4.7%	71.5%	100.0%	+28.5%	1.40	✓ مكتمل
· الخرسانة	17.4%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· أعمال المباني	2.2%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· الأعمال المعدنية	0.6%	47.8%	100.0%	+52.2%	2.09	✓ مكتمل
· العزل الحراري والمائي	2.7%	95.6%	100.0%	+4.4%	1.05	✓ مكتمل
· الأبواب والنوافذ	3.6%	78.7%	100.0%	+21.3%	1.27	✓ مكتمل
· التشطيبات	5.0%	36.3%	100.0%	+63.7%	2.76	✓ مكتمل
· الأعمال الخاصة	0.6%	0.0%	100.0%	+100.0%	–	✓ مكتمل
· المنشآت المعدنية سابقة التصميم	8.1%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
· الأعمال الميكانيكية	13.1%	89.5%	100.0%	+10.5%	1.12	✓ مكتمل

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
٠ الأعمال الكهربائية	18.3%	82.3%	100.0%	+17.7%	1.22	✓ مكتمل
الإغلاق	3.7%	0.0%	100.0%	+100.0%	–	✓ مكتمل
الإجمالي	100%	**85.3%**	**100.0%**	**+14.7%**	**1.172**	✓ مكتمل

تُظهر حالة جدول P6 في التقرير اكتمال جميع الأنشطة البالغة 1,462 نشاطاً (الأسبوع الماضي: 1,430 مكتملاً و17 قيد التنفيذ و15 لم تبدأ).

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة لكل بند رئيسي، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 27-أكتوبر-2026. "المنفذ هذا الأسبوع" هو التغير منذ تقرير 21-أكتوبر-2026؛ ولم تتغير أي كمية منفذة هذا الأسبوع.



بند النطاق	بند جدول الكميات	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
مواد الردم	2.1.6	م³	2,615	2,615	0	0	100.0%
طبقة ما تحت الأساس	2.2.4	م³	1,300	1,300	0	0	100.0%
طبقة الأساس الحصوية	2.2.3	م³	867	867	0	0	100.0%
الطبقة الإسفلتية الأساسية	2.2.2	م³	304	304	0	0	100.0%
الطبقة الإسفلتية السطحية	2.2.1	م³	217	217	0	0	100.0%
الإنترلوك	2.2.7.1	م²	1,326	1,326	0	0	100.0%
البردورات	2.3.8	م.ط	1,294	1,294	0	0	100.0%
الخرسانة المسلحة	3.2	م³	449	449	0	0	100.0%
بلاطة أرضية خرسانية بسماكة 150 مم	3.3	م³	307	307	0	0	100.0%
ألواح الخرسانة الخلوية	3.4	م²	55	55	0	0	100.0%
البلوك الخرساني	4.1	م²	444	444	0	0	100.0%
مواسير مكافحة الحريق HDPE	15.1.2.1 · 200 mm	م.ط	48	48	0	0	100.0%
	15.1.2.2 · 150 mm	م.ط	200	200	0	0	100.0%

بند النطاق	بند جدول الكميات	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
	in 8 · 15.4.1.1	م.ط	15	15	0	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**263**	**263**	**0**	**0**	**100.0%**
مواسير تغذية المياه HDPE	mm 100 · 15.2.2.1	م.ط	20	20	0	0	100.0%
	mm 90 · 15.2.2.2	م.ط	235	235	0	0	100.0%
	mm 63 · 15.2.2.3	م.ط	8	8	0	0	100.0%
	mm 50 · 15.2.2.4	م.ط	40	40	0	0	100.0%
	mm 63 · 15.5.1.1	م.ط	40	40	0	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**343**	**343**	**0**	**0**	**100.0%**
مواسير الصرف الصحي uPVC	mm 110 · 15.3.2.1	م.ط	105	105	0	0	100.0%
	mm 160 · 15.3.2.2	م.ط	75	75	0	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**180**	**180**	**0**	**0**	**100.0%**
مواسير الصرف والتصريف للمباني uPVC	in 4 · 15.6.1.1	م.ط	168	168	0	0	100.0%
	in 3 · 15.6.1.2	م.ط	30	30	0	0	100.0%
	in 2 · 15.6.1.3	م.ط	132	132	0	0	100.0%
	in 1 · 15.6.1.4	م.ط	180	180	0	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**510**	**510**	**0**	**0**	**100.0%**
تمديدات الجهد المنخفض	4C×185 mm² · 16.6.1	م.ط	120	120	0	0	100.0%
	4C×120 mm² · 16.6.2	م.ط	75	75	0	0	100.0%
	الإجمالي	م.ط	**195**	**195**	**0**	**0**	**100.0%**

حالة الأسفلت متعارضة بين الأوراق

تُظهر ورقة Major Quantities طبقتي الأسفلت والإنترلوك منفذة بالكامل، لكن ورقة Procurement تُدرج طبقتي الأسفلت "جاهزة للتوريد"، ومخطط الموقع في ورقة Project Summary يُظهر الطبقة السطحية "لم تبدأ".

المعالم الرئيسية

تواريخ الخطة الأساسية وآخر خطة والتاريخ المتوقع أو الفعلي من ورقة Milestones. التغيير هو عدد الأيام المذكور في الورقة.

المعلم	الخطة الأساسية	آخر خطة	المتوقع / الفعلي	التغيير (أيام)	الحالة
ترسية العقد	25-Jan-2026	25-Jan-2026	25-Jan-2026	0	✓ منجز
توقيع العقد	12-Feb-2026	12-Feb-2026	12-Feb-2026	0	✓ منجز
تسليم الموقع	03-Mar-2026	03-Mar-2026	03-Mar-2026	0	✓ منجز
اكتمال التجهيز	31-Mar-2025	31-Mar-2025	31-Mar-2025	0	✓ منجز
مسح الوضع القائم والتقارير النهائية	31-Mar-2025	31-Mar-2025	31-Mar-2025	0	✓ منجز
توريد المواد طويلة الأجل	27-Oct-2026	27-Oct-2026	27-Oct-2026	0	✓ منجز
توريد المواد قصيرة الأجل	29-Oct-2026	05-Sep-2026	05-Sep-2026	0	✓ منجز
جميع أعمال المستودع	29-Nov-2026	03-Oct-2026	03-Oct-2026	0	✓ منجز
المسجد الخارجي (المصلى)	05-Dec-2026	30-Sep-2026	30-Sep-2026	0	✓ منجز
خزان المياه GRP وغرفة المضخات	24-Aug-2026	19-Oct-2026	19-Oct-2026	0	✓ منجز، بعد الخطة الأساسية بـ 56 يوماً
جميع الأعمال الخارجية	25-Nov-2026	19-Oct-2026	19-Oct-2026	0	✓ منجز

المعلم	الخطة الأساسية	آخر خطة	المتوقع / الفعلي	التغيير (أيام)	الحالة
جميع الأعمال شاملة الاختبار والتشغيل والإغلاق (الاستلام الابتدائي)	02-Jan-2027	27-Oct-2026	27-Oct-2026	0	؟ منجز، يحتاج إلى تحقق
إخلاء الموقع	02-Jan-2027	27-Oct-2026	27-Oct-2026	0	✓ منجز

جميع المعالم مُعلَّمة الآن كمنجزة.

سُجِّل هذا الأسبوع إنجاز خزان المياه GRP وغرفة المضخات والأعمال الخارجية في 19-أكتوبر-2026، وإنجاز جميع الأعمال وإخلاء الموقع في 27-أكتوبر-2026. وانتهى خزان GRP وغرفة المضخات بعد خطته الأساسية بـ 56 يوماً رغم أن عمود التغيير يُظهر 0. ويشمل إنجاز جميع الأعمال الاختبار والتشغيل، الذي لا تزال ورقة Testing تُظهره مخططاً في ديسمبر 2026 دون تواريخ فعلية.

توريد المواد الرئيسية

نسبة بنود المواد المورّدة إلى الموقع حسب التخصص. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 27-أكتوبر-2026 (86 من 108 بنود مورّدة، دون تغيير عن الأسبوع الماضي).



التشطيبات: 5 من 11 بنداً مورّدة


بلاط الجرانيت وشرائح الرخام والوزرة الخشبية "جاهزة للتوريد"؛ وحبيبات الرخام والقواطع الفينولية "جاهزة لدى المقاول"؛ والسجاد "متوفر محلياً".

بنود أخرى لم تورَّد بعد

طبقتا الأسفلت ودهان الطرق (جاهزة للتوريد)، ومراوح التكييف والدكت والناشرات والشبكات (جاهزة لدى المقاول)، وعزل سطح السقف (التوريد جارٍ)، وكسوة الألمنيوم، والسياج الحديدي المجلفن وبوابته، ورشاشات المياه، وسطح كوريان، ولوحات دورات المياه والمسجد وشعارات مدن.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمالة والموظفون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

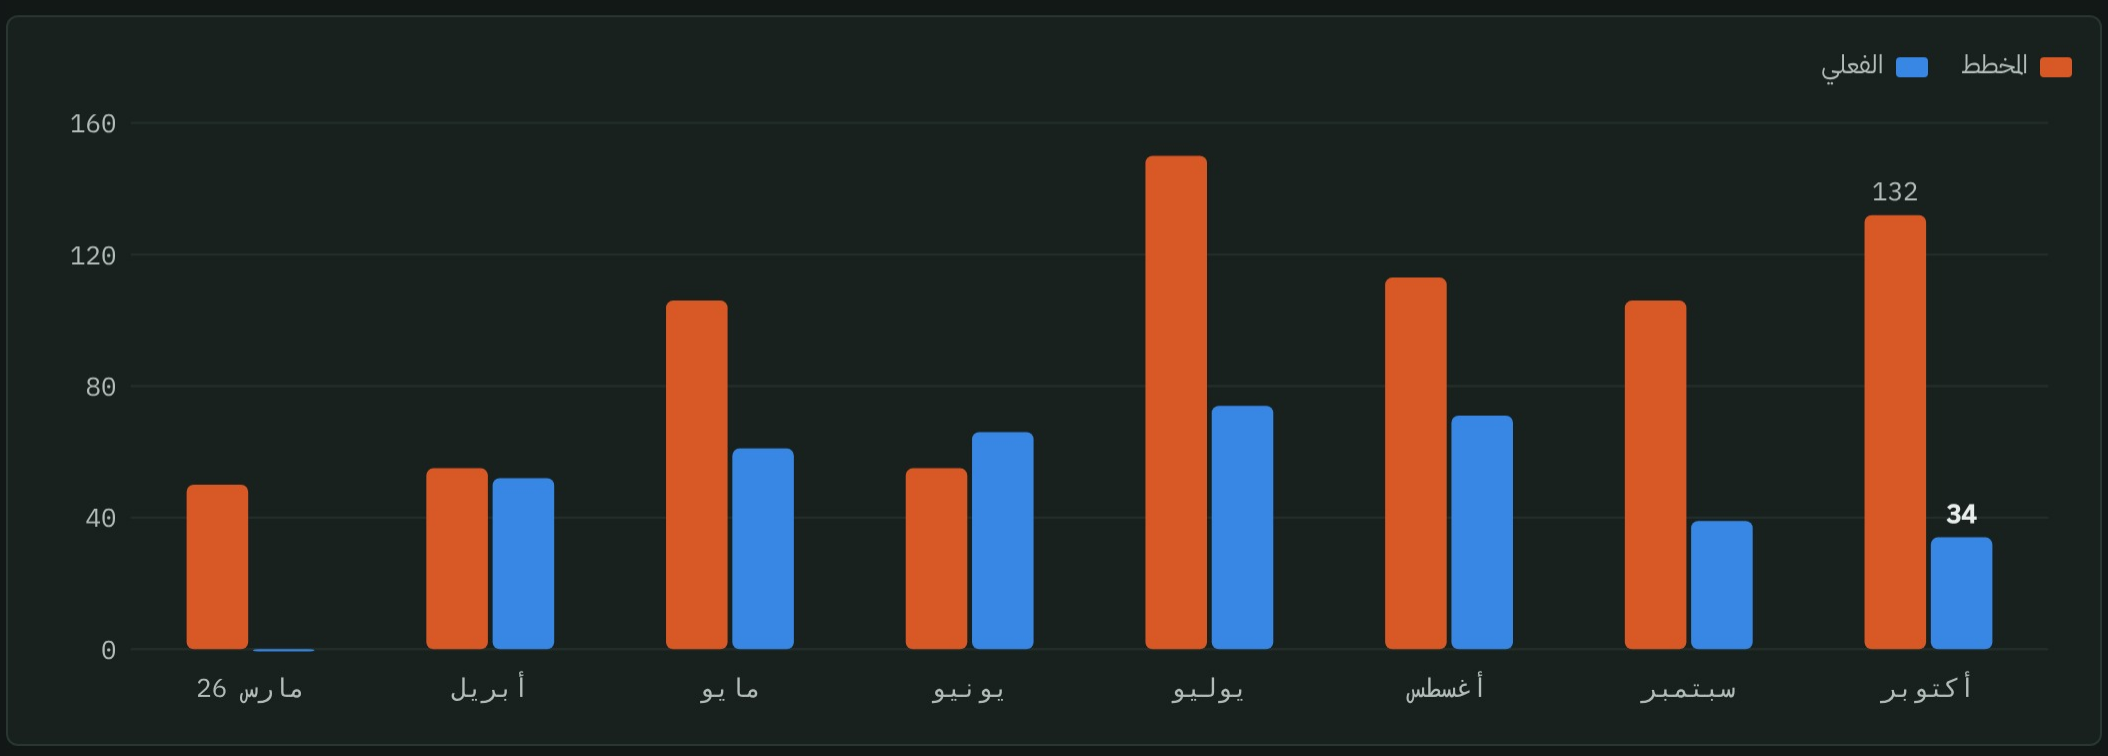

عدد العمالة في أكتوبر 34 (13 موظفاً و21 عاملاً) مقابل 132 مخطط (أقل بنسبة 74%). المعدات في الموقع 8 مقابل 34 مخططة. أرقام القوى العاملة مماثلة للأسبوع الماضي.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	9,554,134
قيمة العقد المعدلة	9,554,134
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	10,987,254
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير فارغ.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة / المعتمدة من مدير المشروع	6 / 6
القيمة الإجمالية	7,935,744
المستخلصات المدفوعة	6
القيمة المدفوعة	7,935,744
المحتجزات	0
الخصومات والغرامات	-20,000
الصافي شاملاً الضريبة	9,106,107
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	9,623,075

المفوتر 83.1% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 100%؛ ولم يُفوتر بعد 1,618,390 ريال من قيمة العقد. دُفع المستخلصان 5 و6 في 20-أكتوبر-2026 و27-أكتوبر-2026.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.83

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	85,094
ساعات العمل هذا الأسبوع	1,104
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	2
حوادث وشيكة (منذ بداية العام)	9
حوادث الحريق	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	41 / 29

من ورقة HSE-Stat؛ تختلف لوحة الملخص، انظر ملاحظات على البيانات.

الجودة التقييم 0.89

طلبات الفحص الميداني الصادرة / المغلقة	407 / 407
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	64 / 64
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	17 / 17
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	18 / 18
المخططات التنفيذية المعتمدة	93 / 93
اعتمادات المواد	95 / 95
قيمة طلبات الفحص لهذه الفترة (ريال)	290,865

فترة طلبات الفحص: 19-أكتوبر-2026 إلى 25-أكتوبر-2026.

ملاحظات على البيانات

- يُعلِّم التقرير جميع الأعمال مكتملة في 27-أكتوبر-2026، لكن ورقة Testing لا تزال تخطط للاختبار والتشغيل من 09-ديسمبر-2026 إلى 19-ديسمبر-2026 دون أي تواريخ فعلية.
- المعالم: للتجهيز ومسح الوضع القائم تواريخ أساسية 31-مارس-2025، أي قبل ترسية العقد في 25-يناير-2026. وتذكر لوحة الملخص آخر خطة لتوريد المواد طويلة الأجل 03-أكتوبر-2026 بينما تذكر ورقة Milestones 27-أكتوبر-2026. ويُظهر عمود التغيير 0 يوم لجميع المعالم، رغم أن التواريخ الفعلية تتراوح بين 66 يوماً قبل الخطة الأساسية و56 يوماً بعدها.
- منحنى S: تقسم ورقة Physical-Chart Data ساعات العمل المكتسبة على 241,519.85 (إجمالي الخطة المضغوطة) من أبريل إلى سبتمبر، وعلى 224,320 لشهر أكتوبر. يستخدم هذا التقرير 224,320، وهي الميزانية في ورقة Progress، لكل الأشهر؛ وبنسب الورقة نفسها يكون سبتمبر 88.4% بدلاً من 95.2%.
- قيم هذا الأسبوع مستخرجة بمقارنة هذا التقرير بتقرير 21-أكتوبر-2026 (Weekly Report #29). ولم تُرفع التقارير الأسبوعية الأقدم.
- الأسفلت: تُظهر ورقتا Major Quantities وLookahead الطبقتين الأساسية والسطحية منفذتين بنسبة 100%، لكن ورقة Procurement تُدرجهما "جاهزة للتوريد" ومخطط ورقة Project Summary يُظهر الطبقة السطحية "لم تبدأ". خانات المخطط حتى تاريخه فارغة وعمود الانحراف يُظهر الكمية كاملة.
- التوريدات: تُظهر ورقة Procurement توريد 86 من 108 بنود، بينما تُظهر لوحة الملخص 95 من 95 مادة في الموقع. ولا يزال رأس الورقة يذكر "حتى 26-يوليو-2026". التشطيبات والأعمال الخاصة مُبلغ عنها مكتملة 100% رغم عدم توريد 6 من 11 بنداً للتشطيبات و2 من 3 بنود للأعمال الخاصة.

- القوى العاملة: العدد الفعلي للموظفين في أكتوبر 13 في الجدول الشهري، و16 في ملخص ورقة Manpower، و14 في لوحة التقرير الأسبوعي. ولم تتغير ورقتا Manpower وProcurement وأعداد حوادث السلامة عن الأسبوع الماضي.
- يذكر ملخص طلبات الفحص للفترة من 19-أكتوبر-2026 إلى 25-أكتوبر-2026 (290,865 ريال) تركيب السجاد (51.6) والوزرة الخشبية (38.2) والسياج الحديدي المجلفن (36) وبوابة السياج (1)، بينما لا تزال ورقة Procurement تُدرجها غير مورّدة.
- الصحة والسلامة: تُظهر لوحة التقرير الأسبوعي حالة إسعافات أولية واحدة وحادثين وشيكين وحادث حريق واحد؛ بينما تُظهر ورقة HSE-Stat حالتي إسعافات أولية و9 حوادث وشيكة منذ بداية العام (0 تراكمي) ولا حوادث حريق.
- تحتوي الورقتان المخفيتان PV-PH وPV على بيانات القيمة المخططة لمشروع آخر (HAL1-05-1، محطة الدفاع المدني بمدينة حائل الصناعية، 2024–2025). ولم تُستخدما.
- يُظهر سجل المستخلصات قيمة عقد معدلة 21,100,000 وتكلفة متوقعة عند الإنجاز 20,900,000 وتغييرات محتملة 200,000 بجانب قيمة العقد 9,554,134. يستخدم المستخلص 1 وورقة Lookahead رقم المشروع NJR1-01-007، وتذكر ورقة Lookahead محمد الحربي مديراً للمشروع.
- توزع ورقة Project Summary قيمة العقد على المكونات بشكل مختلف عن ورقة Progress (مثلاً أعمال الموقع 1,067,430 مقابل 682,299)، رغم أن الإجمالي في كلتيهما 9,554,134. كما تعرض نسبة تقدم مخططة مبنية على التكلفة؛ ويستخدم هذا التقرير نسبة الإنجاز الفعلي (بساعات العمل) فقط.
- سجل المشكلات وسجل المخاطر فارغان، لذا حُذف قسم المشكلات والمخاطر. تقييم الجودة الأسبوعي 0.8878 في كل أسبوع منذ أبريل. تُظهر عدة خلايا في الملخص الخطأ #REF!.
- مدة العقد: تذكر ورقة Milestones الآن "Current Contract Weeks: 34 of 34" (الأسبوع الماضي "33 of 44")، وتواريخ الإنجاز المعدل والملتزم به والمتوقع جميعها 27-أكتوبر-2026، بينما لا يزال تاريخ الإنجاز الأصلي 02-يناير-2027. يستخدم هذا التقرير أسبوع العقد 34 المذكور في الورقة (الملف هو "Weekly Report #30") ويُبقي 02-يناير-2027 تاريخاً لانتهاء العقد.
