مبادرة الملاعب بالمنطقة الوسطى (حائل, واحة القصيم, تبوك)

Playgrounds Initiative: Qassim Oasis, Hail and Tabuk Industrial City

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنشاء المتقدم للمقاولات	إيجيس (Egis)	بدر الرويضان	17-Feb-2026	16-Dec-2026

النطاق: ملاعب في ثلاثة مواقع (واحة القصيم وحائل والمدينة الصناعية بتبوك) تشمل الأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية وتنسيق المواقع وأعمال الموقع العامة، ومنها قباب هوائية في القصيم وتبوك ومبنى دورات مياه في كل موقع.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (التقرير الأسبوعي، جدول التقدم الفعلي). في 01-نوفمبر-2026 بلغ الإنجاز 80.06% مقابل 85.46% مخطط، أي أن المشروع متأخر بنسبة 5.40% (مؤشر الأداء الزمني 0.94). وحقق هذا الأسبوع 2.42% مقابل 2.20% مخطط، فضاقت الفجوة قليلاً.

نسبة الإنجاز الفعلي
80.06% / 85.46%
مخطط
▼ مؤشر الأداء الزمني 0.94 متأخر بنسبة 5.40%

التقدم هذا الأسبوع
+2.42% / +2.20%
مخطط
▲ أعلى من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.22%

المدة المنقضية من العقد
85.1% · اليوم 257 من 302
▼ انتهاء P6: 23-فبراير-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
9.4% · 3.36 مليون ريال
مستخلصان، آخر فترة تنتهي في 30-سبتمبر-2026

الجدول الزمني يُنهي المشروع الآن بعد تاريخ العقد بـ69 يوماً.

يتوقع تحديث P6 (تاريخ البيانات 30-أكتوبر-2026) والتقرير الأسبوعي التسليم في 23-فبراير-2027 مقابل تاريخ انتهاء العقد 16-ديسمبر-2026، بفائض زمني −58.8 يوماً، وكان التوقع الأسبوع الماضي 14-فبراير-2027. لدى 169 من أصل 301 نشاط مفتوح فائض سالب، وتعثر بدء 37 نشاطاً. والقباب الهوائية هي الأكثر تأخراً: القصيم 39.96% مقابل 83.02% مخطط، وتبوك 35.13% مقابل 78.32%، دون أي تقدم هذا الأسبوع.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من التقرير الأسبوعي بتاريخ 01-نوفمبر-2026، وتحمل ختم 28 و29 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. تستمر أعمال البردورات والري والسياج والتارتان والكسوة وتشطيبات دورات المياه. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



تركيب البردورات

بردورات مركّبة حول منطقة تنسيق. بلا ختم تاريخ.



الخط الرئيسي للري، تبوك

الخط الرئيسي ممدود في الخندق. ختم 29-أكتوبر-2026، 08:06، المدينة الصناعية بتبوك.



قوائم السياج الشبكي، منطقة كرة القدم

قوائم مركّبة للسياج الشبكي. بلا ختم تاريخ.



طبقة التارتان، حائل

طبقة التارتان مفروشة. ختم GPS بتاريخ 29-أكتوبر-2026، 09:58، حائل.



كسوة الجدران بالحجر، القصيم

الكسوة على مبنى دورات المياه. ختم GPS بتاريخ 29-أكتوبر-2026، 14:31، بريدة.




سطح الكوريان

سطح بمغاسل مركّب. بلا ختم تاريخ.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data في التقرير الأسبوعي.

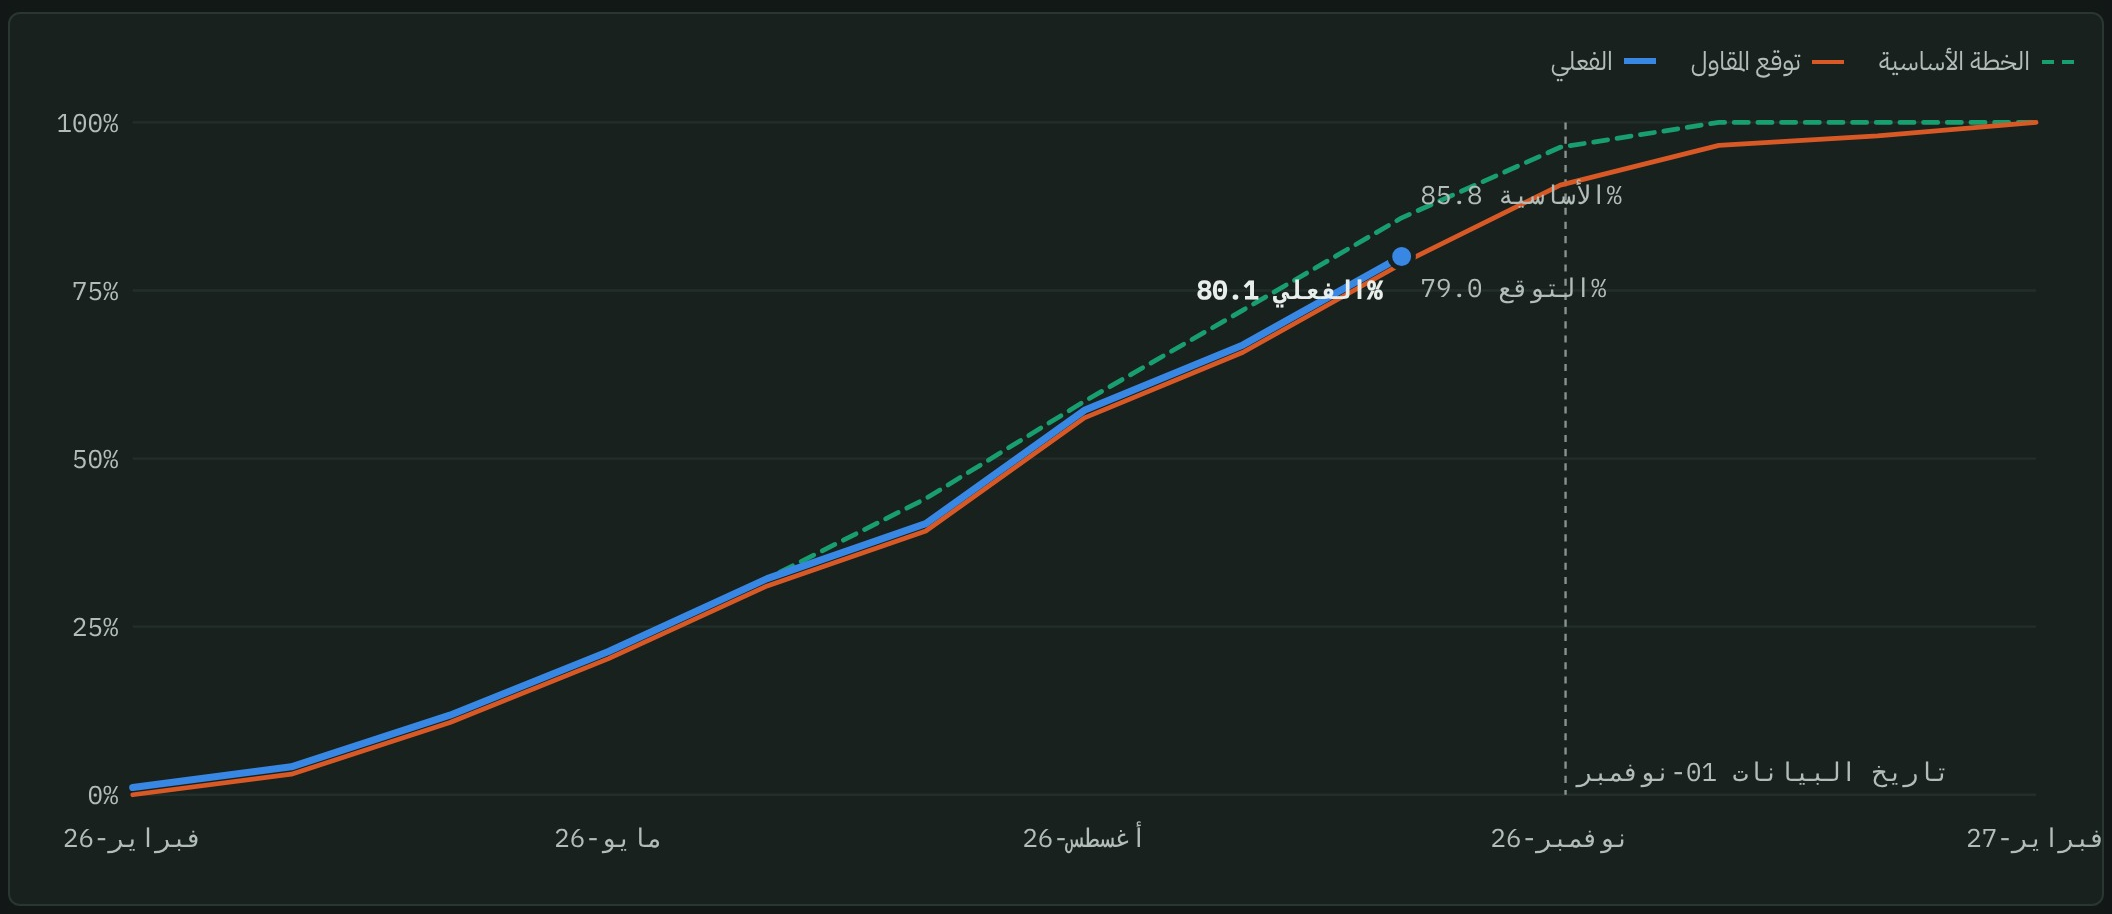

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
18-Oct-2026	80.25	74.79	-5.46	–	0.93
25-Oct-2026	83.26	77.64	-5.62	+2.85	0.93
01-Nov-2026	**85.46**	**80.06**	**-5.40**	**+2.42**	**0.94**

نسبة الإنجاز الفعلي من التقارير الأسبوعية بتاريخ 18 و25 أكتوبر و01 نوفمبر 2026، وهي التقارير الأسبوعية الوحيدة المرفوعة حتى الآن. تبلغ الخطة الأساسية الشهرية في المنحنى 85.82% بنهاية أكتوبر و96.29% بنهاية نوفمبر.

التقدم حسب المرحلة


التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة (التقرير الأسبوعي، ورقة Progress). لا يحمل التصميم الهندسي والتوريدات ساعات عمل في التقرير، لذا لا يُعرضان.

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
معلم المشروع (وقت الإدارة)	**30.0%**	**84.05%**	**84.07%**	**+0.02%**	**1.00**	▲ متقدم
التنفيذ	**66.6%**	**90.38%**	**81.45%**	**-8.93%**	**0.90**	▼ متأخر
واحة القصيم	24.3%	88.77%	81.14%	-7.63%	0.91	▼ متأخر
حائل	17.9%	94.78%	83.41%	-11.36%	0.88	▼ متأخر
تبوك	24.3%	88.75%	80.30%	-8.45%	0.90	▼ متأخر
الإغلاق	**3.5%**	**2.92%**	**18.67%**	**+15.75%**	**6.40**	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**85.46%**	**80.06%**	**-5.40%**	**0.94**	▼ متأخر

داخل التنفيذ، القباب الهوائية هي الأكثر تأخراً: القصيم 446 من 1,116 ساعة عمل منجزة مقابل 926.5 مخططة، وتبوك 392 مقابل 874، ولم تُنجز أي ساعات فيهما هذا الأسبوع. ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 30-أكتوبر-2026) عدد 1,929 نشاطاً: 1,628 مكتملاً و234 قيد التنفيذ و67 لم يبدأ.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والمنفذة والمتبقية للبنود الرئيسية للمواقع الثلاثة معاً، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 01-نوفمبر-2026. يُظهر العمود الأخير الكمية المخططة حتى تاريخه. ويُقارن عمود "المنفذ هذا الأسبوع" بتقرير 25-أكتوبر-2026.

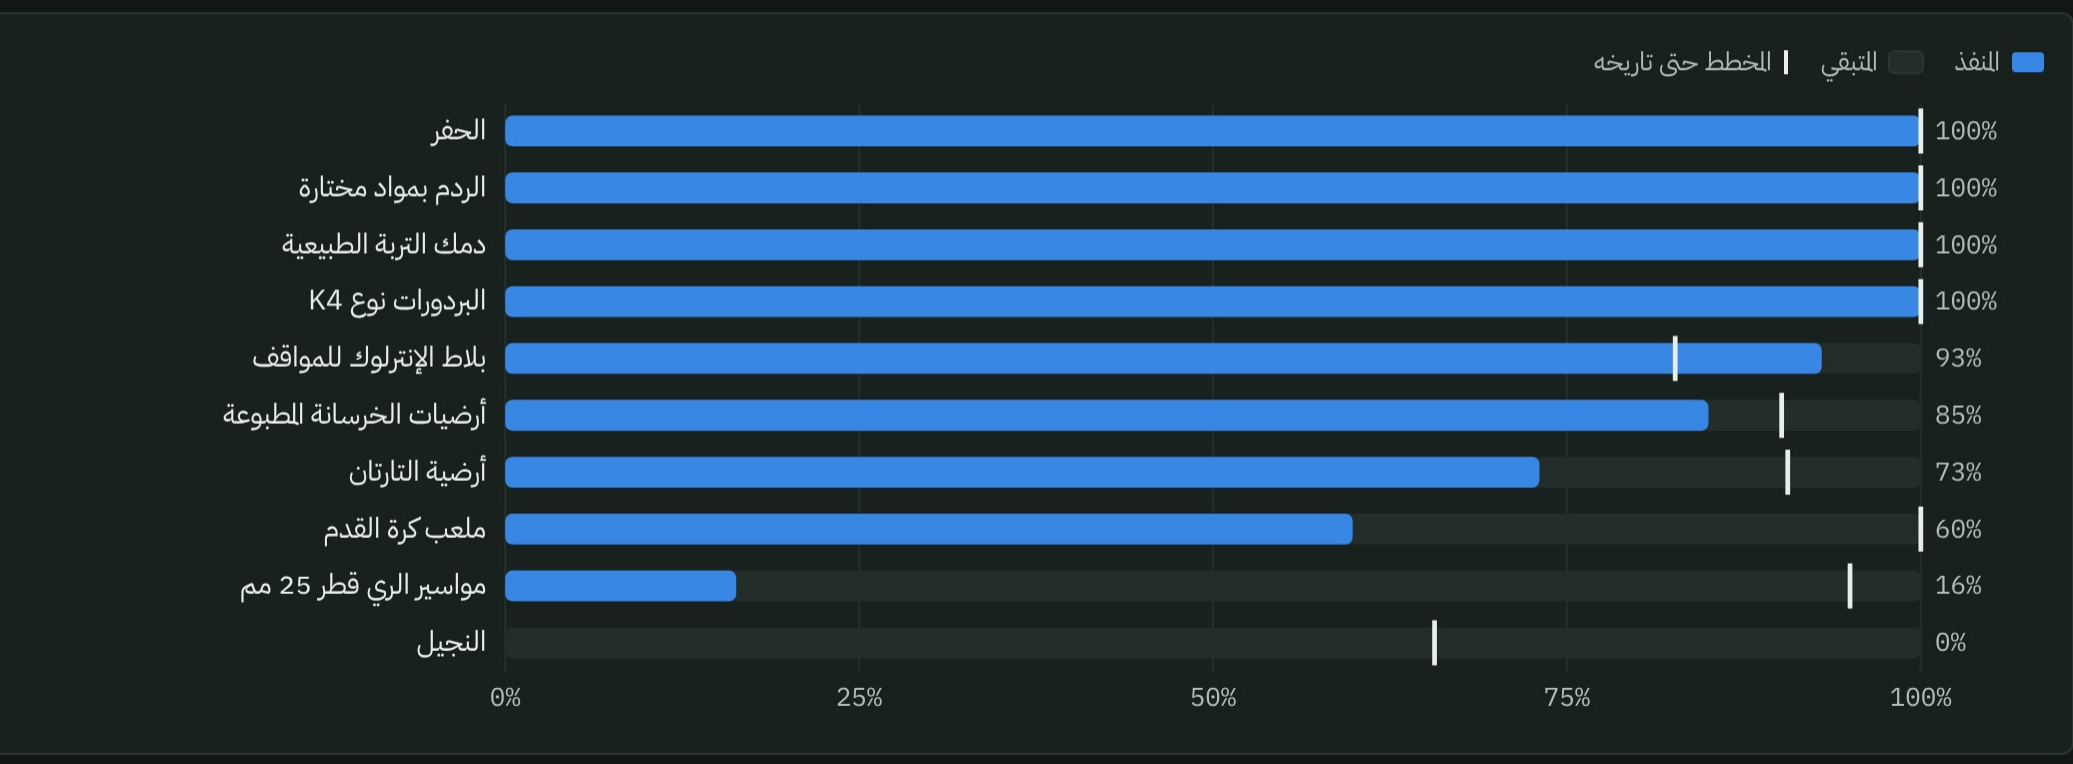

بند النطاق	المواقع	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ	المخطط %
الحفر	الكل	م³	29,400	29,400	0	0	100.0%	100.0%
الردم بمواد مختارة	الكل	م³	29,400	29,400	0	0	100.0%	100.0%
دمك التربة الطبيعية	الكل	م²	33,300	33,300	0	0	100.0%	100.0%
البردورات نوع K4	الكل	م.ط	27,100	27,100	0	0	100.0%	100.0%
بلاط الإنترلوك للمواقف	الكل	م²	7,140	6,640	0	499.8	93.0%	82.7%
أرضيات الخرسانة المطبوعة	الكل	م²	7,800	6,630	0	1,170	85.0%	90.2%
أرضية التارتان	الكل	م²	10,950	8,000	0	2,950	73.1%	90.6%
ملعب كرة القدم	الكل	م²	7,350	4,400	0	2,950	59.9%	100.0%
مواسير الري قطر 25 مم	الكل	م	11,100	1,812	0	9,288	16.3%	95.0%
النجيل	الكل	م²	19,100	0	0	19,100	0.0%	65.6%

المنجز المُبلغ عنه هذا الأسبوع

طبقة التارتان، وكسوة الجدران بالحجر، وأسطح الكوريان، وأعمال الري، والبردورات، وقوائم السياج الشبكي لمنطقة كرة القدم (الملخص التنفيذي الأسبوعي). الأسبوع القادم: التارتان، وسحب الكابلات لمنطقة دورات المياه، والري، والبردورات، والسياج، وقواعد أعمدة الإنارة.

النجيل ومواسير الري والملاعب متأخرة

النجيل عند 0 من 12,539 م² مخططة حتى تاريخه، ومواسير الري قطر 25 مم عند 1,812 من 10,545 م، وملعب كرة القدم عند 4,400 من 7,350 م²، وأرضية التارتان عند 8,000 من 9,921 م². ولم تتغير أي من الكميات الرئيسية للأسبوع الثاني على التوالي رغم الإبلاغ عن أعمال في التارتان والري والبردورات.

المعالم الرئيسية

تختلف بعض تواريخ ورقة المعالم في التقرير الأسبوعي عن تحديث P6. يُعرض كلاهما لحسم الفرق مع المقاول. الفائض من تحديث P6 بتاريخ بيانات 30-أكتوبر-2026.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	17-Feb-2026	17-Feb-2026	17-Feb-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	18-Mar-2026	14-Apr-2026	–	–	✓ منجز متأخراً
اكتمال التصميم الهندسي	16-Aug-2026	03-Nov-2026 (+79 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال التوريدات	27-Aug-2026	05-Nov-2026 (+70 يوماً)	–	–	▼ متأخر
اكتمال مبنى دورات المياه	28-Oct-2026	–	12-Nov-2026	+8.2	▼ معرّض للتأخير

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
اكتمال أعمال الملاعب	07-Dec-2026	–	10-Dec-2026	+5.7	▼ معرّض للتأخير
اكتمال التنفيذ	14-Dec-2026	06-Feb-2026 (0 يوم كما ورد)	06-Feb-2027	–	؟ يتعارض مع P6
اكتمال أعمال تنسيق المواقع	16-Dec-2026	–	10-Jan-2027	−20.2	▼ متأخر
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للتسليم الابتدائي	16-Dec-2026	18-Feb-2027 (+64 يوماً)	23-Feb-2027	−58.8	▼ متأخر
اكتمال التسريح	16-Dec-2026	22-Feb-2027 (+68 يوماً)	–	–	▼ متأخر
تسليم المشروع	16-Dec-2026	23-Feb-2027 (+69 يوماً)	23-Feb-2027	−58.8	▼ متأخر

يذكر التقرير الأسبوعي "اكتمال التنفيذ" في 06-فبراير-2026، وهو تاريخ مضى.

يُنهي P6 مرحلة التنفيذ في 03-فبراير-2027 في القصيم و20-ديسمبر-2026 في حائل و06-فبراير-2027 في تبوك، لذا فالمقصود على الأرجح 06-فبراير-2027. وانتقل توقع التسليم هذا الأسبوع من 14-فبراير-2027 إلى 23-فبراير-2027. ومن المعالم التعاقدية، لا يحتفظ بفائض موجب سوى مبنى دورات المياه (+8.2 يوماً) وأعمال الملاعب (+5.7 يوماً).

توريد المواد الرئيسية

نسبة الإنجاز الفعلي لأنشطة "التوريد إلى الموقع" المفتوحة الأقل تقدماً (تحديث P6، تاريخ البيانات 30-أكتوبر-2026). جميع أنشطة التوريد المفتوحة الأخرى عند 90–95%.



مواد القبة الهوائية: 80% موزّدة


في كل من القصيم وتبوك، بفائض −58.8 و−55.0 يوماً، وفائض القصيم يساوي فائض إنجاز المشروع. ولا يزال سجل التوريدات يُظهر أمر شراء القبة الهوائية "قيد الإجراء" بمدة توريد 150 يوماً.

أوامر الشراء والمواد في الموقع

يضم ملخص التوريدات في التقرير الأسبوعي 57 مادة: صدر 33 أمر شراء، ويتبقى 25، و8 مواد في الموقع. الجزء المتبقي من الحائط الستائري عند 70% في القصيم وتبوك و80% في حائل.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (يدوية وغير يدوية)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower في التقرير الأسبوعي.

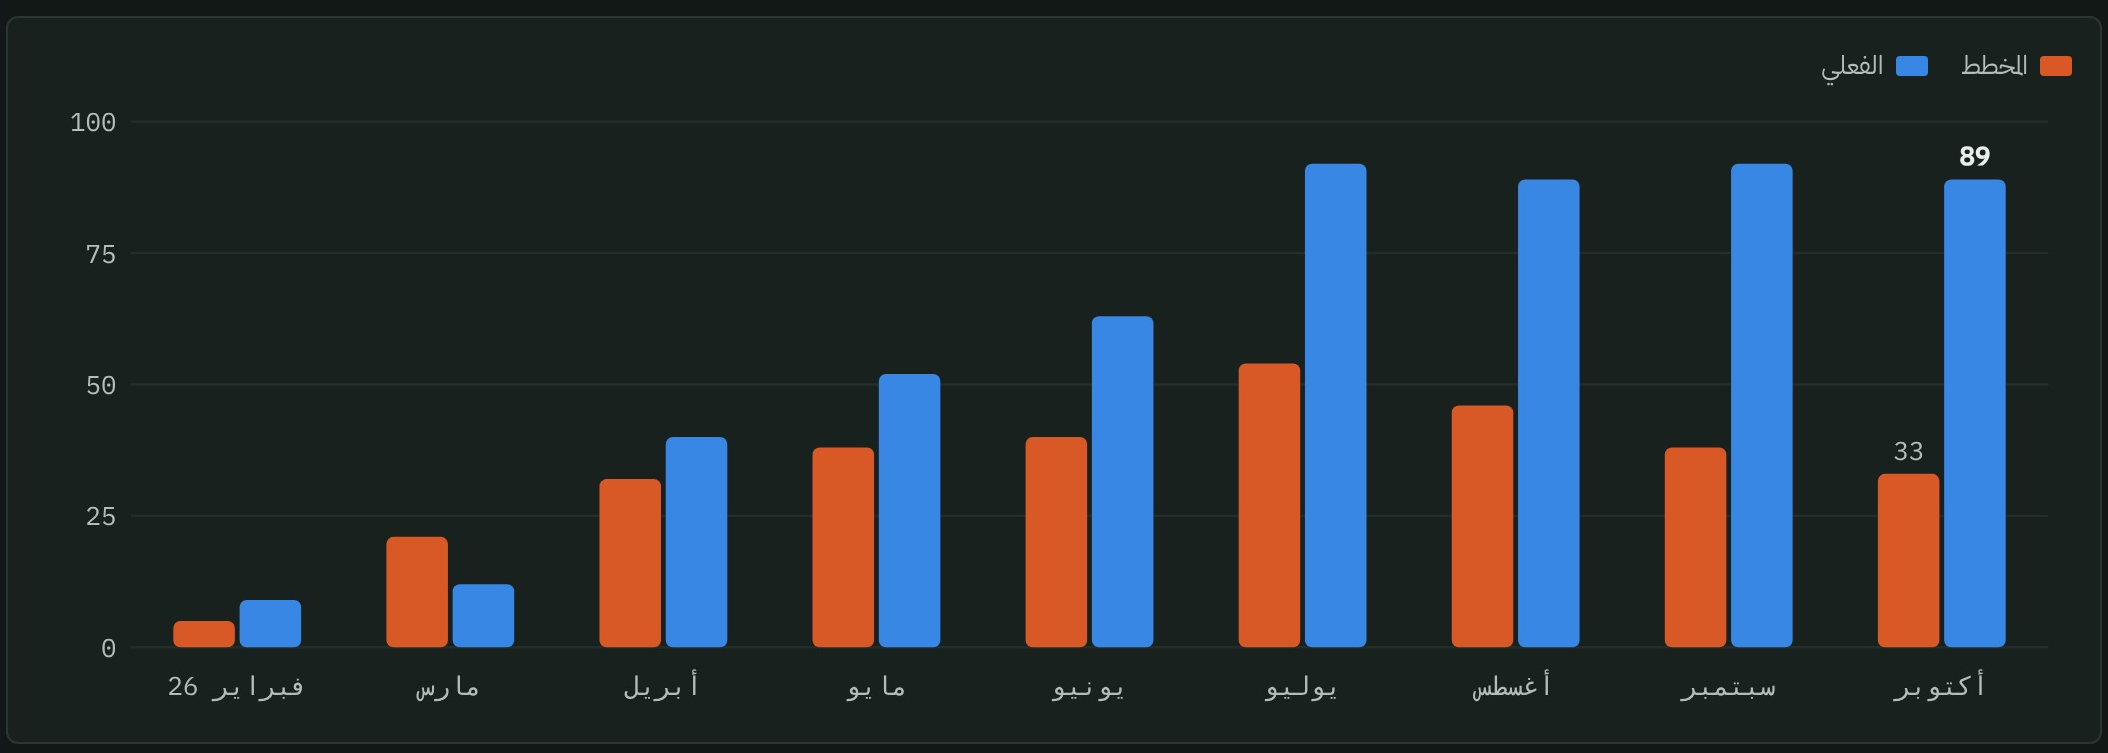

عدد العمالة في أكتوبر 89 مقابل 33 مخططاً (16 غير يدوية و73 يدوية). وتُظهر لوحة المؤشرات في تقرير 01-نوفمبر-2026 عدد 77 عاملاً يدوياً مقابل 32 مخططاً دون أي موظفين غير يدويين، ولا تزال أعمدة نوفمبر فارغة.
المعدات في الموقع في أكتوبر: 30 مقابل 8 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية (بدون الضريبة)	35,709,993
قيمة العقد المعدلة	35,709,993
أوامر التغيير	0
التغييرات المحتملة	0

جميع القيم بالريال. لا توجد أوامر تغيير مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات في السجل	2
القيمة الإجمالية	3,357,105
استرداد الدفعة المقدمة	−335,711
الخصومات والغرامات	−38,000
المعتمد من مدير المشروع - مدن	0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	3,688,354

المفوتر 9.4% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 80.06%. المستخلصان (2,317,493) IPC-01 و(1,039,612) IPC-02 معتمدان من الاستشاري، ولم يُعتمد أي منهما من مدير المشروع في مدن.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.95

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	117,530
ساعات العمل هذا الأسبوع	10,000
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	650 / 248

تفتيش مدن للسلامة رقم 30 (29-أكتوبر-2026): 18 بنداً ممارسة جيدة، و5 بحاجة إلى تحسين، و0 إخفاق.

الجودة التقييم 0.91

طلبات الفحص الميداني: صادرة / مغلقة / معلقة	776 / 656 / 120
طلبات فحص المواد: صادرة / مغلقة / معلقة	99 / 77 / 22
تقارير عدم المطابقة: صادرة / مغلقة / معلقة	22 / 10 / 12
تعليمات الموقع: صادرة / مغلقة	7 / 6
المخططات التنفيذية المعتمدة (A+B) / الإجمالي	333 / 445
اعتمادات المواد (A+B) / الإجمالي	138 / 156

25 مخططاً تنفيذياً و6 تقديمات للمواد قيد الانتظار.

المشكلات والمخاطر القائمة

يضم سجل المشكلات في التقرير الأسبوعي مشكلة واحدة أُغلقت (تصريح العمل في حائل، أُغلقت 19-أبريل-2026).
البنود أدناه مأخوذة من أوراق التقدم والكميات والجدول الزمني والمخاطر.

المشكلة	الموقع	التفاصيل
أعمال القبة الهوائية	القصيم، تبوك	الإنجاز الفعلي 39.96% (القصيم) و35.13% (تبوك) مقابل 83.02% و78.32% مخطط، ولم تُنجز أي ساعات عمل في القباب الهوائية للأسبوع الثالث على التوالي. مواد القباب مورّدة بنسبة 80%.
انزلاق الجدول الزمني	جميع المواقع	انتقل توقع التسليم من 07-فبراير-2027 (تقرير 18 أكتوبر) إلى 14-فبراير-2027 ثم إلى 23-فبراير-2027 الآن. لدى 169 من 301 نشاط مفتوح فائض سالب، و169 نشاطاً على المسار الحرج، وتعثر بدء 37 نشاطاً (القصيم 13، حائل 8، تبوك 16).
تنسيق المواقع والري	جميع المواقع	لم يبدأ النجيل مقابل 12,539 م² مخططة حتى تاريخه، ومواسير الري قطر 25 مم عند 1,812 من 10,545 م مخططة. ويُتوقع اكتمال تنسيق المواقع في 10-يناير-2027 (فائض −20.2 يوماً).
أرضيات الملاعب	جميع المواقع	ملعب كرة القدم عند 4,400 من 7,350 م²، وأرضية التارتان عند 8,000 من 9,921 م² مخططة حتى تاريخه.
التوريدات	جميع المواقع	يتبقى إصدار 25 من 57 أمر شراء، و8 مواد في الموقع، والجزء المتبقي من الحائط الستائري عند 70–80%.
فحص التربة (سجل المخاطر)	تبوك	خطر قائم: تستغرق نتائج اختبار الجسات 7–10 أيام من المختبر، مما قد يؤخر بدء أعمال الحفر.

ملاحظات على البيانات

- أرقام التقدم هي التقدم الفعلي (الجهد) في التقرير الأسبوعي، ويُقاس بـ33,340 ساعة عمل مخططة، منها 10,000 ساعة لبند "معلم المشروع" الخاص بالإدارة. وتعرض لوحة مؤشرات التقرير وعرض التقرير الأسبوعي تقدماً محسوباً بالتكلفة بعنوان الفعلي، ويستخدم هذا التقرير التقدم الفعلي فقط.
- يذكر التقرير "Current Contract Weeks: 0 of 0"، لذا حُسب رقم الأسبوع من تاريخ تسليم الموقع (17-فبراير-2026): 257 يوماً، الأسبوع 36.
- تحمل أعمدة "Weekly Physical Progress" نسبة 77.20% مخطط و70.12% منجز، ولا تطابق أرقام أي من الأسبوعين حتى تاريخه. لذا اعتُبر التقدم هذا الأسبوع الفرق في التقدم حتى تاريخه منذ تقرير 25-أكتوبر-2026.
- جميع الكميات الرئيسية مطابقة لتقريري 18 و25 أكتوبر 2026 رغم الإبلاغ عن أعمال في التارتان والري والبردورات، ويبدو أن الورقة لم تُحدَّث.
- ساعات العمل حسب الموقع: لا يزال مبنى دورات المياه في تبوك يُظهر 0 من 1,708 ساعة منجزة مع 40 ساعة مخططة فقط، ولا تحمل أعمال الإغلاق في تبوك أي ساعات مخططة رغم إنجاز 71.68 ساعة.
- تذكر ورقة المعالم اكتمال التنفيذ في 06-فبراير-2026 دون تغيير في الأيام، واكتمال التجهيز في 14-أبريل-2026 مقابل 18-مارس-2026 دون تغيير في الأيام.
- التوريدات: يذكر الملخص 8 مواد من 57 في الموقع دون تغيير منذ أسبوعين، بينما أنشطة التوريد في P6 منجزة بنسبة 70–95%. ولا يتضمن سجل التوريدات كميات أو تواريخ توريد.
- المستخلصات: يُظهر الملخص 0 مستخلصات مقدمة بينما يضم السجل IPC-01 وIPC-02. والمدفوع (3,436,604 ريال) يتجاوز القيمة الإجمالية المقدمة رغم عدم اعتماد أي منهما من مدير المشروع. وتجمع الغرامات في لوحة المؤشرات (−373,711) بين استرداد الدفعة المقدمة والخصومات.
- القوى العاملة: تُظهر لوحة المؤشرات 0 موظفين غير يدويين مقابل 16 قبل أسبوع، وأعمدة نوفمبر في ورقة Manpower فارغة. ولا تزال ورقة DB تحمل بيانات مشروع آخر (HAL1-02-005).
- تاريخ بيانات تحديث P6 هو 30-أكتوبر-2026 مقابل 01-نوفمبر-2026 للتقرير الأسبوعي، ولدى 131 نشاطاً قيد التنفيذ تاريخ انتهاء يسبق تاريخ البيانات. وثلاثة ملفات PDF مسماة MLTX-05-047 رغم أنها تخص MLTX-02-003.
- يبدأ توقع المقاول في ورقة Physical-Chart Data من 0 في فبراير، أي أقل من الفعلي بـ365 ساعة عمل، لذا يبقى أدنى من الفعلي قليلاً حتى أكتوبر.

أُعدّ في 03-نوفمبر-2026 من التقارير الأسبوعية بتاريخ 18 و25 أكتوبر و01 نوفمبر 2026 وتحديث P6 بتاريخ بيانات 30-أكتوبر-2026.
