مشروع تطوير اراضي بواحة جدة

Land Development of Jeddah Oasis

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات	إيجيس (EGIS)	محمد الشنيفي	24-Nov-2025	23-May-2027

النطاق: الطرق، وشبكة مواسير السيول مع غرف التجميع والمناهل والعبارة الصندوقية والقنوات، وشبكة الصرف الصحي مع محطة رفع، وشبكتا مياه الشرب والمياه المعالجة مع صنبور إطفاء الحريق، وتمديدات الجهد المتوسط 36 ك.ف مع وحدات RMU، وإنارة الشوارع. مدة العقد 18 شهراً.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. بنسبة 96.5% مقابل 77.8% مخطط وفق الخطة المعدلة، المشروع متقدم بنسبة 18.7%. حقق هذا الأسبوع 0.36% فقط مقابل 1.35% مخطط، وما زال معلما الأعمال الترابية للأراضي وأعمال الطرق مفتوحين رغم أن توقعهما كان 13-أكتوبر-2026.

نسبة الإنجاز الفعلي
96.5% / 77.8% مخطط
▲ مؤشر الأداء الزمني 1.24
+18.7%

التقدم هذا الأسبوع
+0.36% / +1.35%
مخطط
▼ أقل من الخطة الأسبوعية بنسبة 0.99%

المدة المنقضية من العقد
60.6% · اليوم 330 من 545
● الإنجاز المتوقع 19-يناير-2027

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
80.3% · 46.0 مليون ريال
10 مستخلصات، آخر فترة تنتهي في 18-أكتوبر-2026

المشروع متقدم بوضوح إجمالاً، لكن هذا الأسبوع جاء دون الخطة، ومعلمان تجاوزا تاريخ توقعهما.

توقع التقرير الأسبوعي انتهاء الأعمال الترابية للأراضي وأعمال الطرق في 13-أكتوبر-2026. ولا يزال تحديث P6 (تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026) يُظهر المعلمين كأنهما لم يبدآ، مجدولين في تاريخ البيانات، ويدرجهما ضمن قائمة الأنشطة المتعثرة البدء. الانتهاء المتوقع للمشروع 19-يناير-2027 في التقرير الأسبوعي و14-يناير-2027 في P6، وكلاهما قبل تاريخ العقد 23-مايو-2027 بوقت كافٍ.

صور الموقع هذا الأسبوع

ست صور من عرض التقدم (Tracking Sheet) المرفق بالتقرير الأسبوعي 20-أكتوبر-2026، مختومة بالتاريخ من 14 إلى 19 أكتوبر 2026 حيث يظهر الختم. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



ردم الأراضي

دحّالات تدمك الردم في قطعة أرض. ختم GPS بتاريخ 19-أكتوبر-2026، 07:06.



الطبقة الإسفلتية السطحية، طريق الخيام (Tent Road)

أسفلت جديد على طريق الخيام خلف الأقماع والحواجز. مختومة 14-أكتوبر-2026، 10:01.



تشطيب المناهل

طاقم يشطّب منهلاً على طريق أسفلتي مخطط. مختومة 19-أكتوبر-2026، 08:47.



ردم تمديدات الجهد المتوسط، المنطقة القائمة

مسار تمديدات مردوم بمحاذاة السور. مختومة 19-أكتوبر-2026، 11:15.



تركيب اللوحات الإرشادية

لوحات مرورية جديدة عند تقاطع مع دهانات طرق حديثة. مختومة 19-أكتوبر-2026، 11:49.




تركيب المضخات، محطة الرفع

مواسير المضخات داخل البئر الرطب. لا يوجد ختم تاريخ.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة)، شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

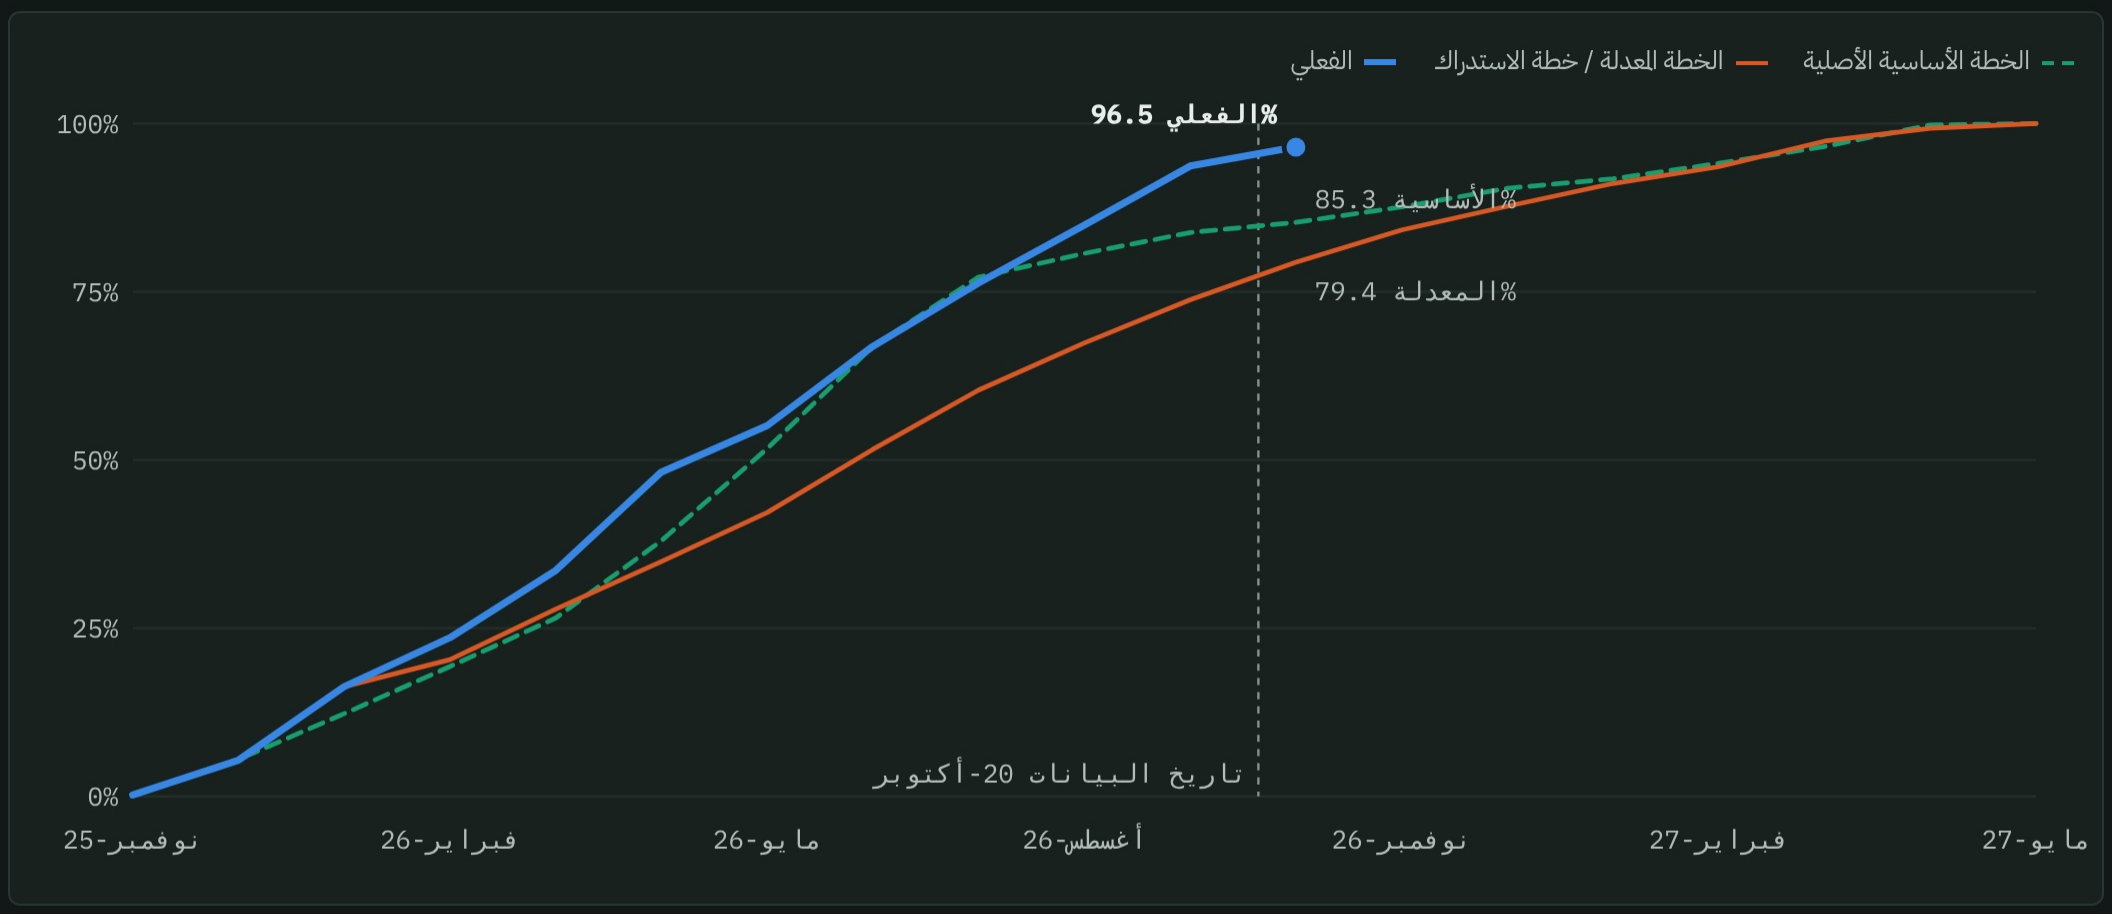

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
13-Oct-2026	76.4	96.1	+19.7%	–	1.26
20-Oct-2026	**77.8**	**96.5**	**+18.7%**	**+0.36%**	**1.24**

لا يتضمن التقرير الأخير إلا ساعات العمل التراكمية لهذا الأسبوع والأسبوع السابق (ورقة Progress (2))، لذا يضم الجدول صفين فقط. القيم المخططة وفق الخطة المعدلة / خطة الاستدراك؛ وكانت الخطة الأساسية الأصلية تستهدف 85.3% بنهاية أكتوبر.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Weekly Progress Report.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الأعمال التمهيدية	2.1%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	4.5%	99.7%	100.0%	+0.3%	1.00	▲ متقدم
التوريدات	20.2%	97.9%	102.2%	+4.3%	1.04	▲ متقدم
أعمال الطرق	13.1%	75.8%	106.1%	+30.3%	1.40	▲ متقدم
الأعمال الكهربائية	14.4%	41.0%	84.0%	+43.0%	2.05	▲ متقدم
أعمال الإزالة	3.6%	109.5%	109.5%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
شبكة تصريف السيول	7.2%	92.7%	102.8%	+10.1%	1.11	▲ متقدم
الأراضي	3.1%	82.5%	111.7%	+29.2%	1.35	▲ متقدم
شبكة الصرف الصحي	6.0%	84.2%	84.2%	0.0%	1.00	● وفق الخطة
شبكة المياه المعالجة	9.7%	84.6%	94.1%	+9.5%	1.11	▲ متقدم
شبكة مياه الشرب	7.7%	74.3%	86.8%	+12.5%	1.17	▲ متقدم
محطة رفع الصرف الصحي	3.8%	12.9%	87.8%	+74.9%	6.80	▲ متقدم
العبارة الصندوقية	0.5%	114.3%	114.3%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
قناة التصريف المفتوحة	1.2%	128.1%	128.1%	0.0%	1.00	✓ مكتمل

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
النفق	0.3%	100.0%	100.0%	0.0%	1.00	✓ مكتمل
الاختبار والتشغيل	2.4%	13.1%	68.6%	+55.5%	5.24	▲ متقدم
الإجمالي	100%	**77.8%**	**96.5%**	**+18.7%**	**1.24**	▲ متقدم

سبع مراحل تُظهر ساعات عمل مكتسبة أكثر من الموازنة (أعلى من 100%). يضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026) 1,218 نشاطاً: 1,176 مكتملاً و24 قيد التنفيذ و18 لم تبدأ. الانتهاء المجدول 14-يناير-2027، أي قبل تاريخ العقد بـ 129 يوماً.

نطاق العمل: الكميات

الكمية الإجمالية والكمية المنفذة حتى تاريخه والكمية المتبقية لبنود جدول الكميات الرئيسية، من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي 20-أكتوبر-2026. لا يتضمن التقرير كميات الأسبوع السابق، لذا عمود "المنفذ هذا الأسبوع" فارغ.

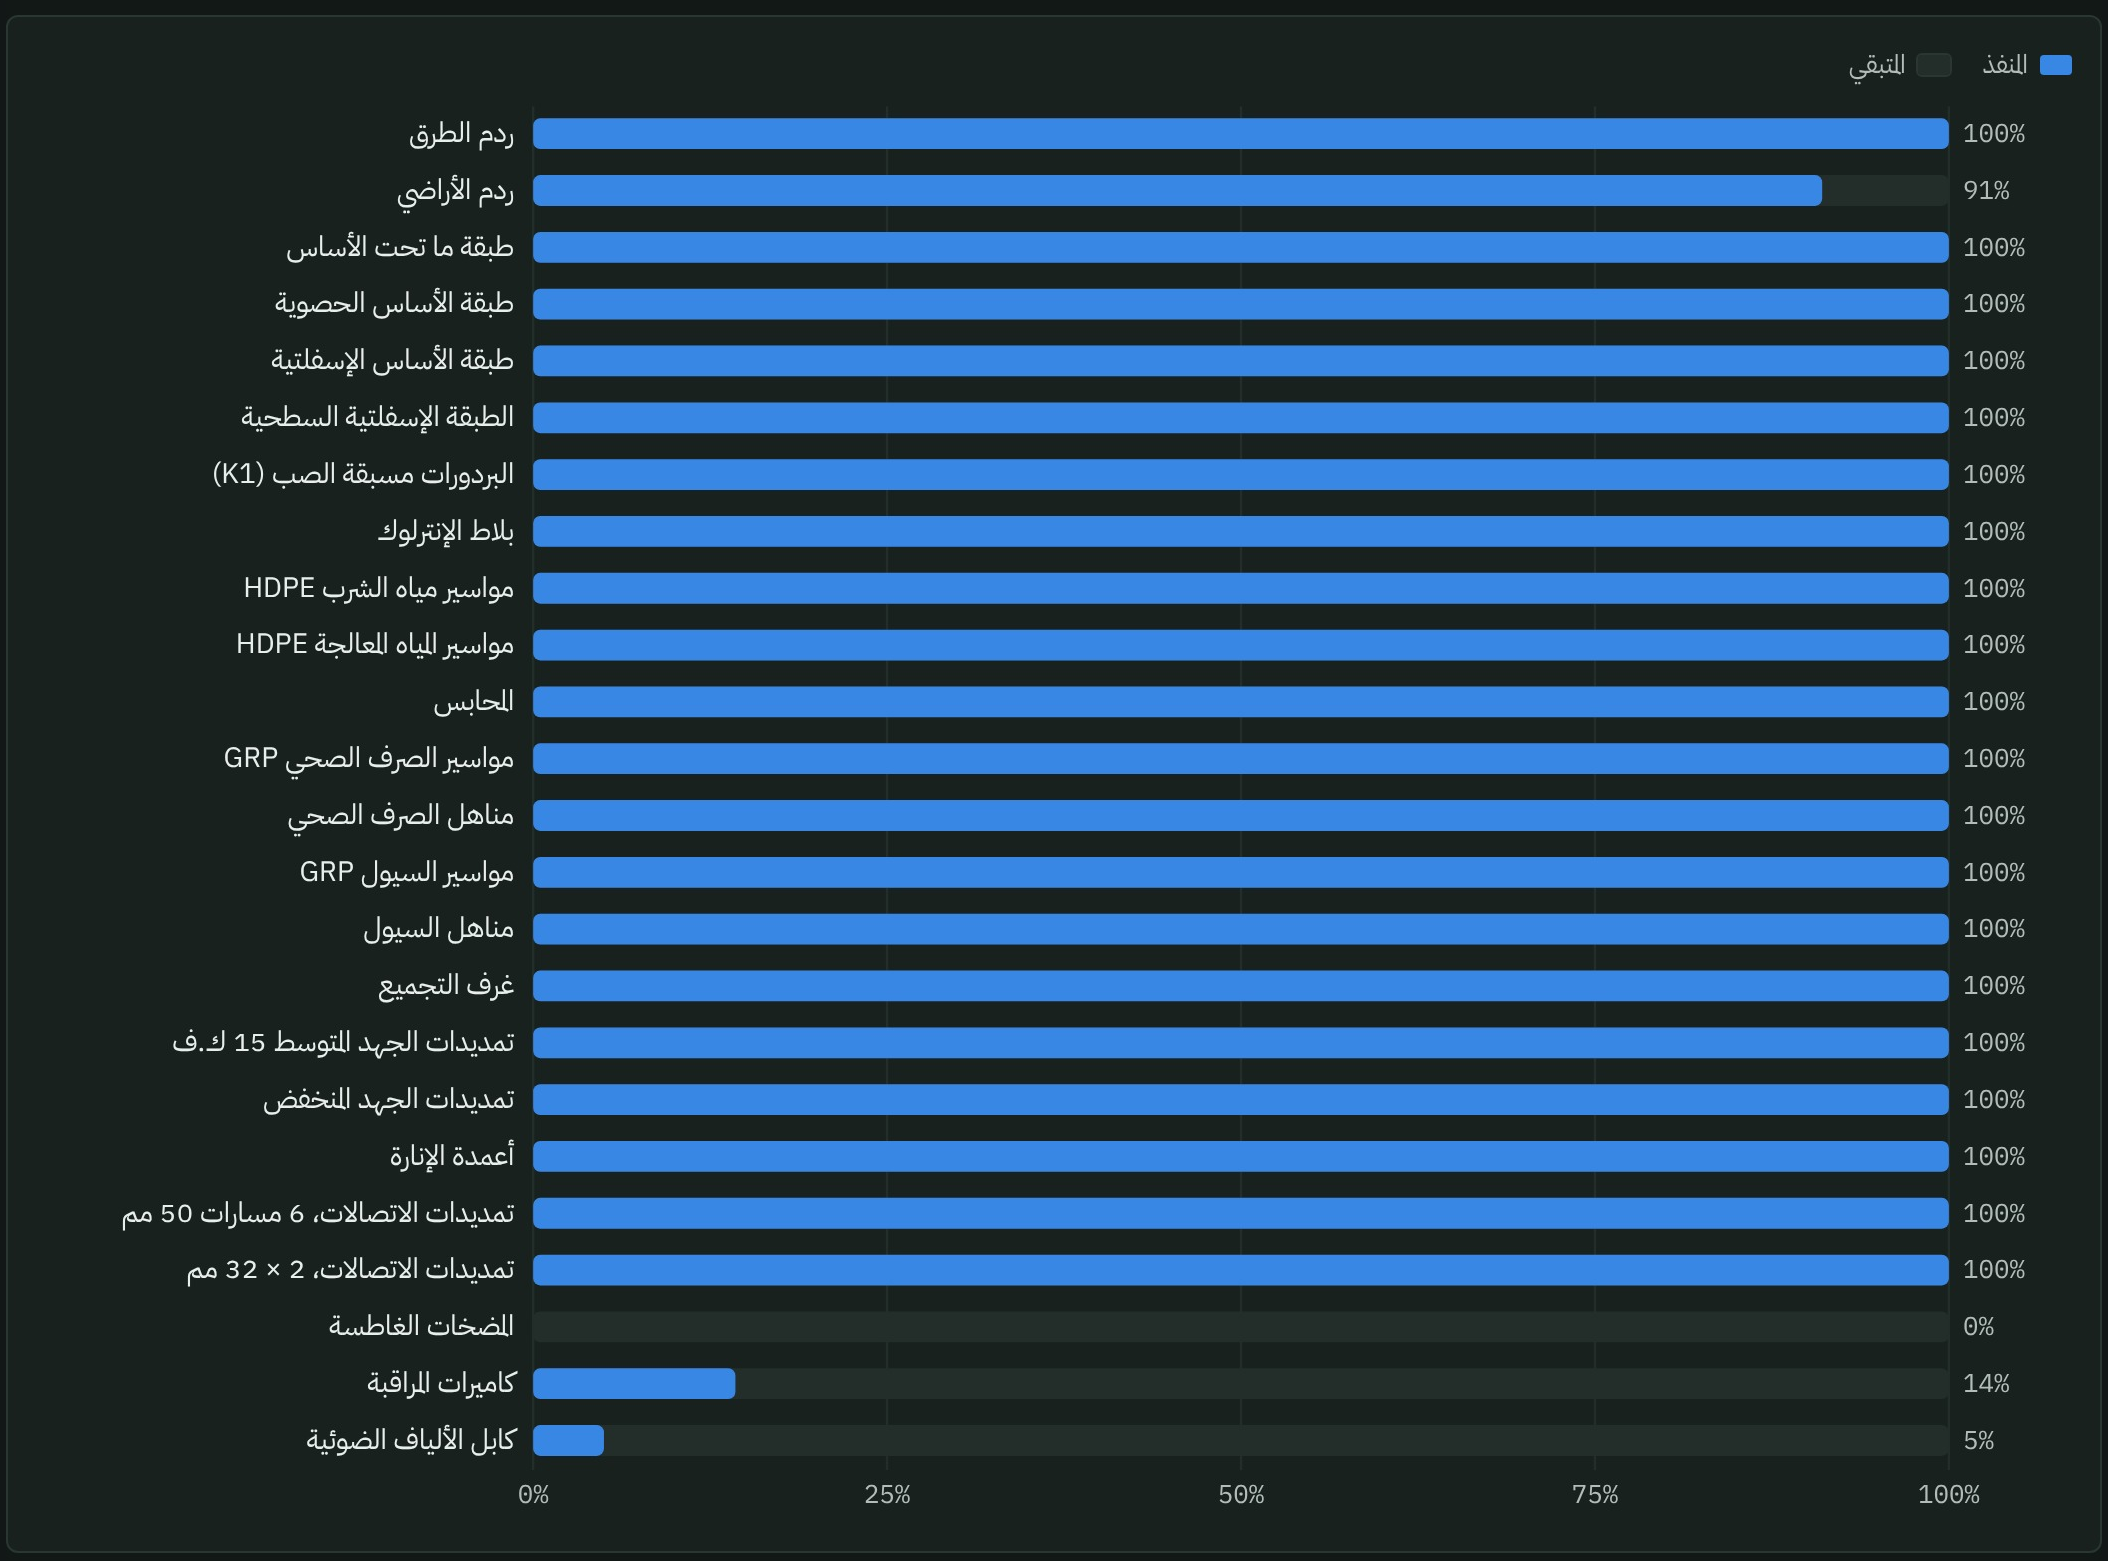

بند النطاق	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
ردم الطرق	م³	329,707	329,707	–	0	100.0%
ردم الأراضي	م³	718,628	654,314	–	64,314	91.1%
طبقة ما تحت الأساس	م³	30,812	30,812	–	0	100.0%
طبقة الأساس الحصوية	م³	19,162	19,162	–	0	100.0%
طبقة الأساس الإسفلتية	م³	7,129	7,129	–	0	100.0%
الطبقة الإسفلتية السطحية	م³	4,052	4,052	–	0	100.0%

بند النطاق	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
البردورات مسبقة الصب (K1)	م³	22,496	22,496	–	0	100.0%
بلاط الإنترلوك	م²	12,677	12,677	–	0	100.0%
مواسير مياه الشرب HDPE	م	4,025	4,025	–	0	100.0%
مواسير المياه المعالجة HDPE	م	4,209	4,209	–	0	100.0%
المحابس	عدد	77	77	–	0	100.0%
مواسير الصرف الصحي GRP	م	2,735	2,735	–	0	100.0%
مناهل الصرف الصحي	عدد	45	45	–	0	100.0%
مواسير السيول GRP	م	3,971	3,971	–	0	100.0%
مناهل السيول	عدد	42	42	–	0	100.0%
غرف التجميع	عدد	77	77	–	0	100.0%
تمديدات الجهد المتوسط 15 ك.ف	م²	5,632	5,632	–	0	100.0%
تمديدات الجهد المنخفض	م	6,457	6,457	–	0	100.0%
أعمدة الإنارة	عدد	258	258	–	0	100.0%
تمديدات الاتصالات، 6 مسارات 50 مم	م	6,424	6,424	–	0	100.0%
تمديدات الاتصالات، 2 × 32 مم	م	4,604	4,604	–	0	100.0%
المضخات الغاطسة	عدد	2	0	–	2	0.0%
كاميرات المراقبة	عدد	7	1	–	6	14.3%
كابل الألياف الضوئية	م	20	1	–	19	5.0%

الشبكات: جميع الأطوال منفذة

تُظهر ورقة Progress Summary اكتمال تنفيذ جميع الشبكات: الطرق 5,657 م، والجهد المتوسط 13,171 م، وإنارة الشوارع 9,910 م، والاتصالات 11,025 م، ومياه الشرب 4,025 م، والمياه المعالجة 4,209 م، والصرف الصحي 2,735 م، وتصريف السيول 3,791 م.

ما زال مفتوحاً

ردم الأراضي عند 91% (المتبقي 64,314 م³). في محطة الرفع، المضختان الغاطستان مُبلغ عنهما كغير مركبتين، وكاميرا مراقبة واحدة من 7 مركبة، و1 من 20 م من كابل الألياف الضوئية.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث جدول P6 توقعات مختلفة للمعالم المفتوحة. يُعرض الاثنان ليُحسم الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
تسليم الموقع	24-Nov-2025	24-Nov-2025	24-Nov-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
اكتمال التجهيز	23-Dec-2025	23-Dec-2025	23-Dec-2025 (فعلي)	–	✓ منجز
طلب المواد طويلة التوريد	21-Nov-2026	14-Jul-2026	–	–	✓ منجز
شبكة الصرف الصحي	22-Jul-2026	–	26-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
شبكة المياه المعالجة	23-Nov-2026	–	30-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
شبكة مياه الشرب	23-Nov-2026	05-Sep-2026	05-Sep-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
توريد جميع المعدات والمواد	31-Dec-2026	06-Oct-2026	–	–	؟ يتعارض مع سجل التوريدات
الأعمال الترابية وتسوية الأراضي	23-Mar-2026	13-Oct-2026	20-Oct-2026	102	▼ متأخر
أعمال الطرق	22-Sep-2026	13-Oct-2026	20-Oct-2026	155	▼ متأخر
الشبكات الكهربائية (الجهد المتوسط)	06-May-2027	13-Oct-2026	19-Nov-2026	140	؟ التوقعات متعارضة

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
اكتمال جميع الأعمال والجاهزية للاستلام الابتدائي	23-May-2027	06-Jan-2027	30-Dec-2026	115	● في الموعد
انتهاء المشروع / إخلاء الموقع	23-May-2027	19-Jan-2027	14-Jan-2027	102	● في الموعد

مرّت ثلاثة توقعات في التقرير الأسبوعي بتاريخ 13-أكتوبر-2026 دون إنجاز.

كان متوقعاً انتهاء الأعمال الترابية للأراضي وأعمال الطرق في 13-أكتوبر-2026؛ ولا يزال P6 يُظهرهما كأنهما لم يبدآ وضمن قائمة الأنشطة المتعثرة البدء، مع ترحيلهما إلى تاريخ البيانات 20-أكتوبر-2026. كما توقع التقرير الأسبوعي انتهاء الشبكات الكهربائية في 13-أكتوبر-2026، بينما يخططها P6 في 19-نوفمبر-2026. تواريخ الخطة الأساسية من ورقة Milestones في التقرير الأسبوعي؛ وخطتا الصرف الصحي والمياه المعالجة الأساسيتان من نهايات الخطة الأساسية في P6.

توريد المواد الرئيسية

المواد طويلة التوريد الموجودة في الموقع حسب التخصص. المصدر: Procurement Summary، التقرير الأسبوعي 20-أكتوبر-2026.



معدات محطة الرفع: 9 بنود ما زالت "قيد التصنيع"


المضخات، وقواطع MCCB (VFD)، ولوحات التحكم المحلية، والمولد، ومكثفات تحسين معامل القدرة، ووحدة PLC، وأجهزة القياس، وعداد التدفق، ومفتاح التحويل ATS. كان معظمها مستحق الوصول إلى الموقع بحلول 15-سبتمبر-2026. تذكر قائمة أعمال هذا الأسبوع تركيب لوحة MCC ووحدة PLC والمضخات في محطة الرفع، لذا قد لا يكون السجل محدّثاً.

المفاتيح والقواطع المغلقة: 4 من 7

البند الوحيد دون 100% في سجل التوريدات، وحالته قيد التنفيذ. البنود الـ 26 الأخرى مكتملة.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع (العمالة والإداريون)، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

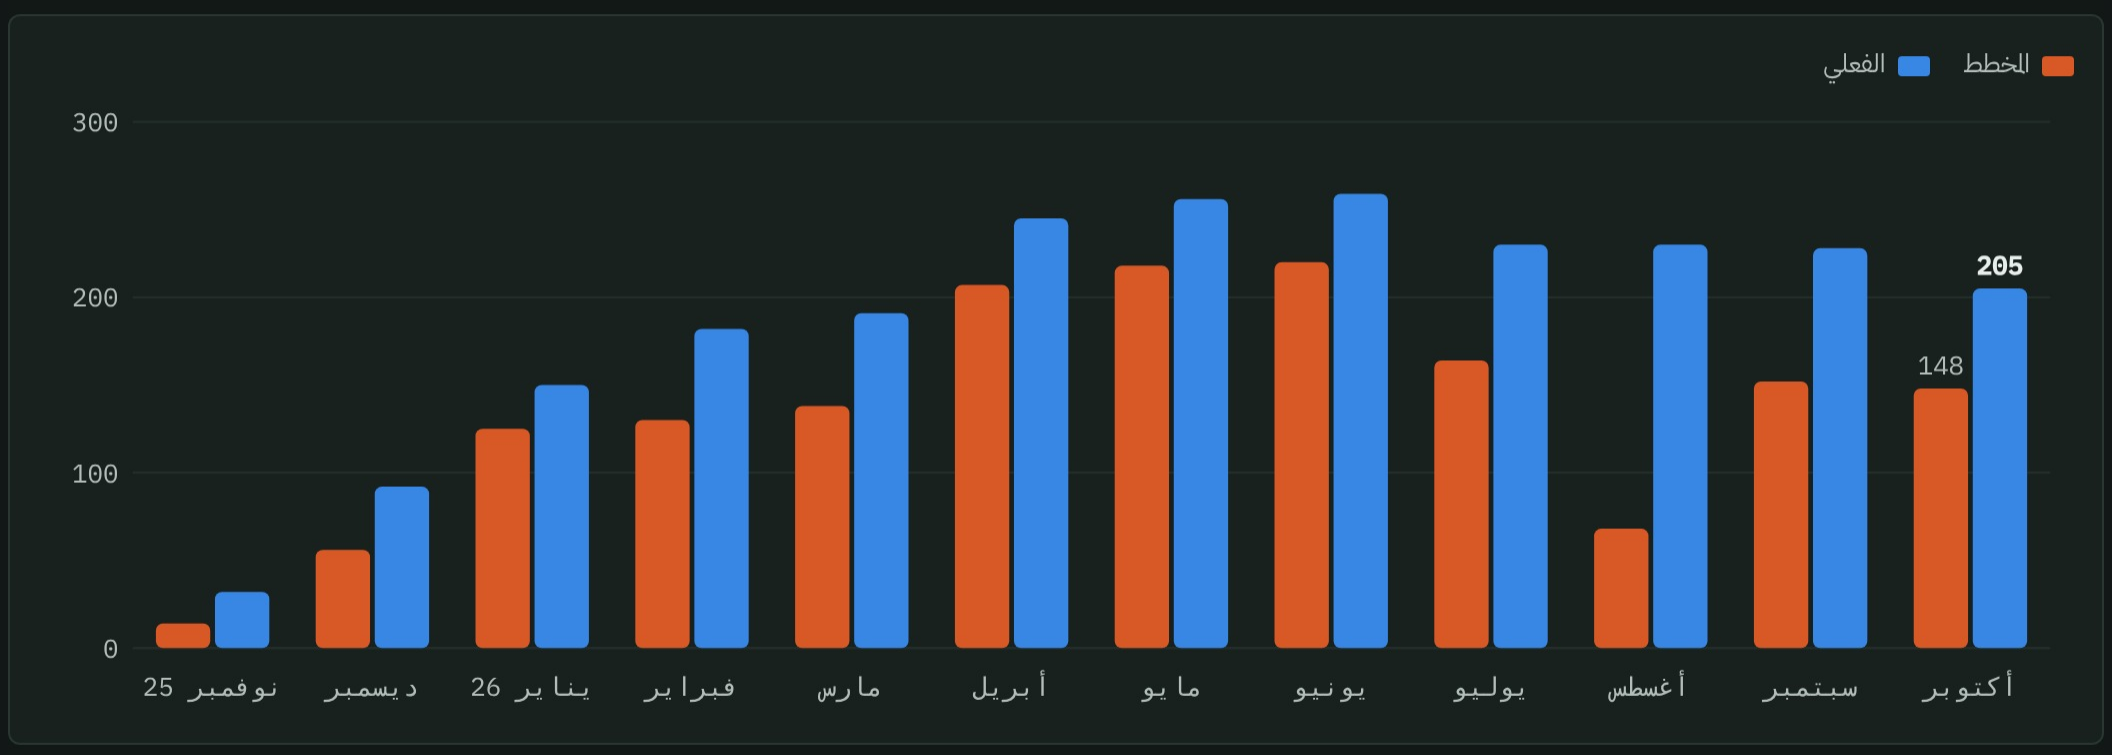

عدد العمالة في أكتوبر 205 (49 إدارياً و156 عاملاً) مقابل 148 مخططاً. المعدات في الموقع في أكتوبر: 76 مقابل 75 مخططة.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

أعمال الطرق	31,180,897
شبكتا الكهرباء والاتصالات	8,774,396
شبكة تصريف السيول	5,894,425
محطة الرفع	3,284,426
شبكة المياه المعالجة	2,885,131
شبكة الصرف الصحي	2,756,313
شبكة مياه الشرب	2,528,760
إجمالي جدول الكميات (بدون الضريبة)	**57,304,348**
قيمة العقد شاملة ضريبة 15%	65,900,000
أوامر التغيير	0

جميع القيم بالريال. التوزيع من ورقة Progress Summary. لا توجد أوامر تغيير أو تغييرات محتملة مسجلة.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	10
القيمة الإجمالية	45,992,129
الصافي شاملاً الضريبة	52,890,948
المعتمد من مدير المشروع - مدن (7)	33,617,268
المدفوع حتى تاريخه	27,469,389
المحتجزات / الخصومات	0 / 0
قيمة طلبات الفحص حتى تاريخه	54,882,530

الفوترة الإجمالية 80.3% من قيمة العقد مقابل تقدم فعلي 96.5%. جميع المستخلصات العشرة معتمدة من الاستشاري؛ والمستخلصات 8 إلى 10 لم تعتمدها مدن بعد. المبلغ المدفوع يساوي المستخلصات 1 إلى 6.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.88

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	515,278
ساعات العمل هذا الأسبوع	10,512
إصابات مضيعة للوقت	0
الوفيات	0
حالات الإسعافات الأولية	0
حوادث وشيكة	0
أضرار المتلكات	0
التعريف بالسلامة / اجتماعات التوعية	44 / 81

الجودة التقييم 0.85

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة (تراكمي)	1,571 / 1,551
طلبات الفحص المعلقة	20
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	43 / 43
تعليمات الموقع الصادرة / المغلقة	10 / 10
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	116 / 116
المخططات التنفيذية المعالجة	394
المواد المعتمدة	146

اكتملت اختبارات شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والسيول والمياه المعالجة. اختبارات الطرق عند 10%، ولم تبدأ اختبارات محطة الرفع والشبكة الكهربائية.

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	الحالة	التفاصيل
تقليص النطاق، الطريق رقم 6	مغلقة 25-يناير-2026	حُذف الطريق رقم 6 وشبكات المرافق فيه من النطاق، وصدر نطاق عمل جديد يشمل جميع الأنشطة الجارية.
الحماية الصخرية، قناة الوادي والعبارة الصندوقية	مغلقة 25-يناير-2026	لم يتضمن النطاق حماية صخرية عند مدخل العبارة ومخرجها أو على امتداد الوادي، وكان مطلوباً قرار بشأن التكسية الحجرية المحقونة.
عرض قناة الوادي مقابل العبارة	مغلقة 30-ديسمبر-2025	قاع الوادي بعرض 15 م أعرض بكثير من العبارة CU-02 بعرض 6.7 م، ويُتبع ما في مخططات IFC.
الأنفاق القائمة	مغلقة 25-يناير-2026	لتجنب التسرب والروائح، تُزال خرسانة النفق بالكامل ثم يُردم.
مواد وكميات شبكة الجهد المتوسط	مغلقة 30-أبريل-2026	اعتماد مواد وكميات الجهد المتوسط من الشركة السعودية للكهرباء ومدن.
السلامة: الفتحات العميقة والإجهاد الحراري والمرور	مغلقة	حواجز صلبة، واستراحة العمل الصيفية، ومنظمو حركة ولوحات إرشادية.

جميع البنود في سجل المشكلات (8 مشكلات) وسجل المخاطر (7 مخاطر) مغلقة، وخانة التحديات في Tracking Sheet فارغة. ما يبقى مفتوحاً وفق الأوراق الأخرى: معلما الأعمال الترابية للأراضي وأعمال الطرق، ومعدات محطة الرفع، و20 طلب فحص معلقاً، واختبارات الطرق ومحطة الرفع والشبكة الكهربائية.

ملاحظات على البيانات

- يعتمد العنوان الرئيسي للتقرير الأسبوعي وTracking Sheet وأوراق الملخص على القيمة المكتسبة المبنية على التكلفة: 95.17% فعلي مقابل 61.39% مخطط. يعتمد هذا التقرير التقدم الفعلي (ساعات العمل): 96.5% مقابل 77.75%. ويذكر ملف Look Ahead نسبة 78.06% محققة بنهاية الربع الثالث 2026 مقابل مستهدف 77%، دون بيان أساس الحساب.
- يذكر التقرير رقم أسبوعه (التقرير رقم 48، Week-48)، وهو المستخدم هنا. أما حساب الأسابيع الكاملة من تسليم الموقع (24-نوفمبر-2025 إلى 20-أكتوبر-2026، 330 يوماً) فيعطي الأسبوع 47.
- قيم هذا الأسبوع: لا يعطي التقرير الأخير إلا ساعات العمل التراكمية لهذا الأسبوع والأسبوع الماضي، لذا يضم جدول منحنى التقدم صفين، ولا يعطي كميات الأسبوع السابق، لذا عمود "المنفذ هذا الأسبوع" في جدول النطاق فارغ.
- تتجاوز ساعات العمل المكتسبة الموازنة في سبع مراحل (حتى 128% لقناة التصريف المفتوحة)، وتتجاوز الساعات المخططة الموازنة أيضاً في ثلاث منها. تستخدم الخطة الأساسية والخطة المعدلة إجماليين مختلفين (406,229 و406,774 ساعة عمل). ويُظهر عمود التوقع في ورقة Physical-Chart Data نسبة 93.7% لشهر أكتوبر، أي أقل من الفعلي 96.5%.
- معلم "اكتمال توريد جميع المعدات والمواد" مسجل كمنجز في 06-أكتوبر-2026، لكن سجل التوريدات يضم 9 بنود "قيد التصنيع" وبنداً عند 4 من 7، ويُظهر ملخص التوريدات 27 من 34 مادة في الموقع. يسرد السجل 36 بنداً والملخص 34.
- تختلف تواريخ الانتهاء بين الملفات: 19-يناير-2027 (توقع التقرير الأسبوعي)، و14-يناير-2027 (P6)، و23-نوفمبر-2026 (مستهدف Tracking Sheet وملف Look Ahead)، و23-مايو-2026 كنهاية للعقد في ملف "الأعمال المنفذة خلال الأسبوع" (نهاية العقد 23-مايو-2027).
- تختلف تواريخ الخطة الأساسية للمعالم بين ورقة Milestones وP6: الشبكات الكهربائية 06-مايو-2027 مقابل 04-يناير-2027، وانتهاء المشروع 23-مايو-2027 مقابل 14-يونيو-2027.
- تختلف كميات النطاق بين الأوراق: السيول 3,791 م (Progress Summary) مقابل 3,971 م من مواسير GRP (Major Quantities)؛ وشبكة الجهد المتوسط 13,171 م مقابل 5,632 من تمديدات 15 ك.ف. وتعطي ورقة Major Quantities البردورات بوحدة م³ وتمديدات الجهد المتوسط بوحدة م². ويُظهر توريد الاتصالات 6,395 م مورّدة مقابل 11,025 م منفذة.
- تختلف إجماليات المخططات التنفيذية: 394 (لوحة المؤشرات)، و703 (ورقة Quality-Stat)، و621 (Tracking Sheet).
- القوى العاملة لشهر أكتوبر: تُظهر لوحة المؤشرات 61 عاملاً مخططاً و181 فعلياً (حسب المهنة)، وورقة Manpower تُظهر 136 و156.
- تذكر ملفات أخرى الاستشاري إيجيس كمقاول (Look Ahead)، ومدير المشروع باسم عبد الله الشنيفي، وتضع المشروع في القطاع الأوسط بدلاً من القطاع الغربي. ويحسب ملخص المستخلصات 3 مستخلصات مدفوعة، لكن المبالغ المدفوع يساوي المستخلصات 1 إلى 6. وتُظهر عدة خلايا #REF! (مسؤولو المشكلات، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز). ويتضمن ملخص طلبات الفحص تواريخ مثل 25-أغسطس-2062.
