محطة ركاب لسار في سدير

Construction of a SAR Train Passenger Drop-Off Station in Sudair

المالك	المقاول	الاستشاري	مدير المشروع - مدن	تسليم الموقع	انتهاء العقد
مدن	شركة تطوير التقنية للمقاولات (TDC)	إيجيس (EGIS)	زياد الشبات	07-Apr-2026	06-Aug-2027

النطاق: محطة ركاب لقطار سار في مدينة سدير الصناعية (الرصيف والمظلة والتشطيبات والأنظمة الكهربائية وكاميرات المراقبة ونظام الإخلاء الصوتي للمحطة)، مع طريقي الوصول RD-01 وRD-02 وما يتبعهما من شبكات تصريف السيول والصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والاتصالات والجهد المتوسط والمنخفض.

ملخص تقدم المشروع

يُقاس التقدم بنسبة الإنجاز الفعلي، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. يضع تقرير 09-نوفمبر-2026 نسبة الإنجاز عند 29.9% مقابل 42.3% مخطط (مؤشر الأداء الزمني 0.71)، أي متأخر بنسبة 12.4%. ويعيد عمود الأسبوع السابق في التقرير نفسه تقدير موقف 02-نوفمبر-2026 عند 28.4%، فلم تعد نسبة 40.4% الواردة في تقرير الأسبوع الماضي قائمة. ويتوقع تحديث P6 الآن الانتهاء في 12-أغسطس-2027، أي بعد التاريخ التعاقدي بستة أيام.

نسبة الإنجاز الفعلي
29.9% / 42.3% مخطط
▼ مؤشر الأداء 0.71 −12.4%

التقدم هذا الأسبوع
+1.46% / +2.11%
مخطط
▼ المطلوب الآن 1.85% أسبوعياً

المدة المنقضية من العقد
44.4% · اليوم 216 من 486
▼ انتهاء P6 بتأخير 6 أيام

المفوتر حتى تاريخه (إجمالي)
13.0% · 4.29 مليون ريال
3 مستخلصات، لم يُعتمد أو يُصرف أي منها

يُنهي P6 المشروع الآن بعد التاريخ التعاقدي بستة أيام.

ينقل تحديث P6 بتاريخ 09-نوفمبر-2026 انتهاء المشروع من 06-أغسطس-2027 إلى 12-أغسطس-2027 (فائض كلي −6 أيام). وتقع على مسار الفائض السالب توريدات البردورات والأسفلت، وخنادق تمديدات الاتصالات والجهد المنخفض، وأعمدة الإنارة، وأعمال تشطيب الطرق (البردورات والبلاط المتداخل والدهانات). وحقق هذا الأسبوع 1.46% مقابل 2.11% مخطط، وهو أقل من 1.85% أسبوعياً المطلوبة الآن للانتهاء في 06-أغسطس-2027. والتوريدات عند 25.3% مقابل 83.3% مخطط، ولم تبدأ حزمة المحطة.


صور الموقع هذا الأسبوع

الصور الست من ورقة Weekly Photos في التقرير الأسبوعي بتاريخ 09-نوفمبر-2026، بعناوينها الواردة في التقرير، ولا تحمل ختم تاريخ أو إحداثيات. اختر صورة لعرضها بحجم أكبر، ثم استخدم الأسهم للتنقل بين الصور.



فرش طبقة الأساس، الطريق 1

فرّادة تفرش طبقة الأساس على الطريق 1.

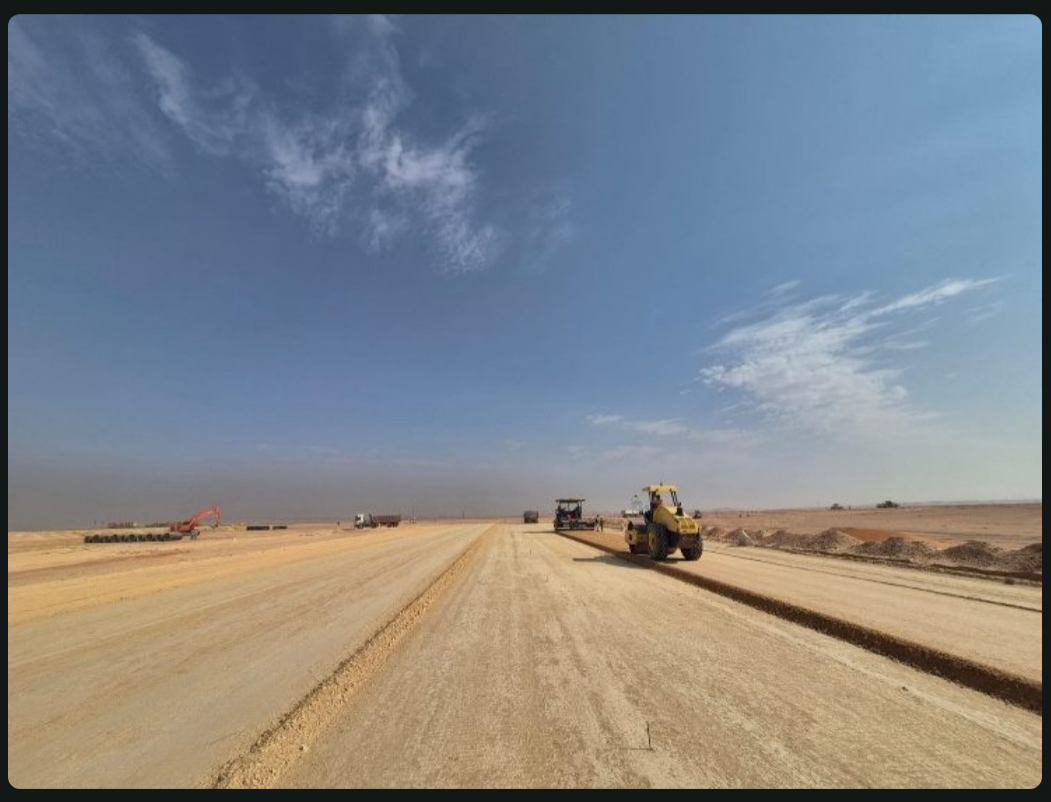

دمك طبقة الأساس، الطريق 1

هراس يدمك طبقة الأساس على الطريق 1.



تسوية طبقة الأساس، الطريق 1

ممهدة تسوّي السطح لطبقة الأساس على الطريق 1.



طبقة الأساس الحصوية، الطريق 1

فرش ودمك طبقة الأساس الحصوية على الطريق 1.



الطبقة الثانية لما تحت الأساس، الطريق 1

تسوية الطبقة الثانية لما تحت الأساس على الطريق 1.




الطبقة الثانية لما تحت الأساس، الطريق 2

تسوية الطبقة الثانية لما تحت الأساس على الطريق 2.

منحنى التقدم (S-Curve)

التقدم الفعلي التراكمي (يُقاس بعدد ساعات العمل المخططة) شهرياً. المصدر: ورقة Physical-Chart Data.

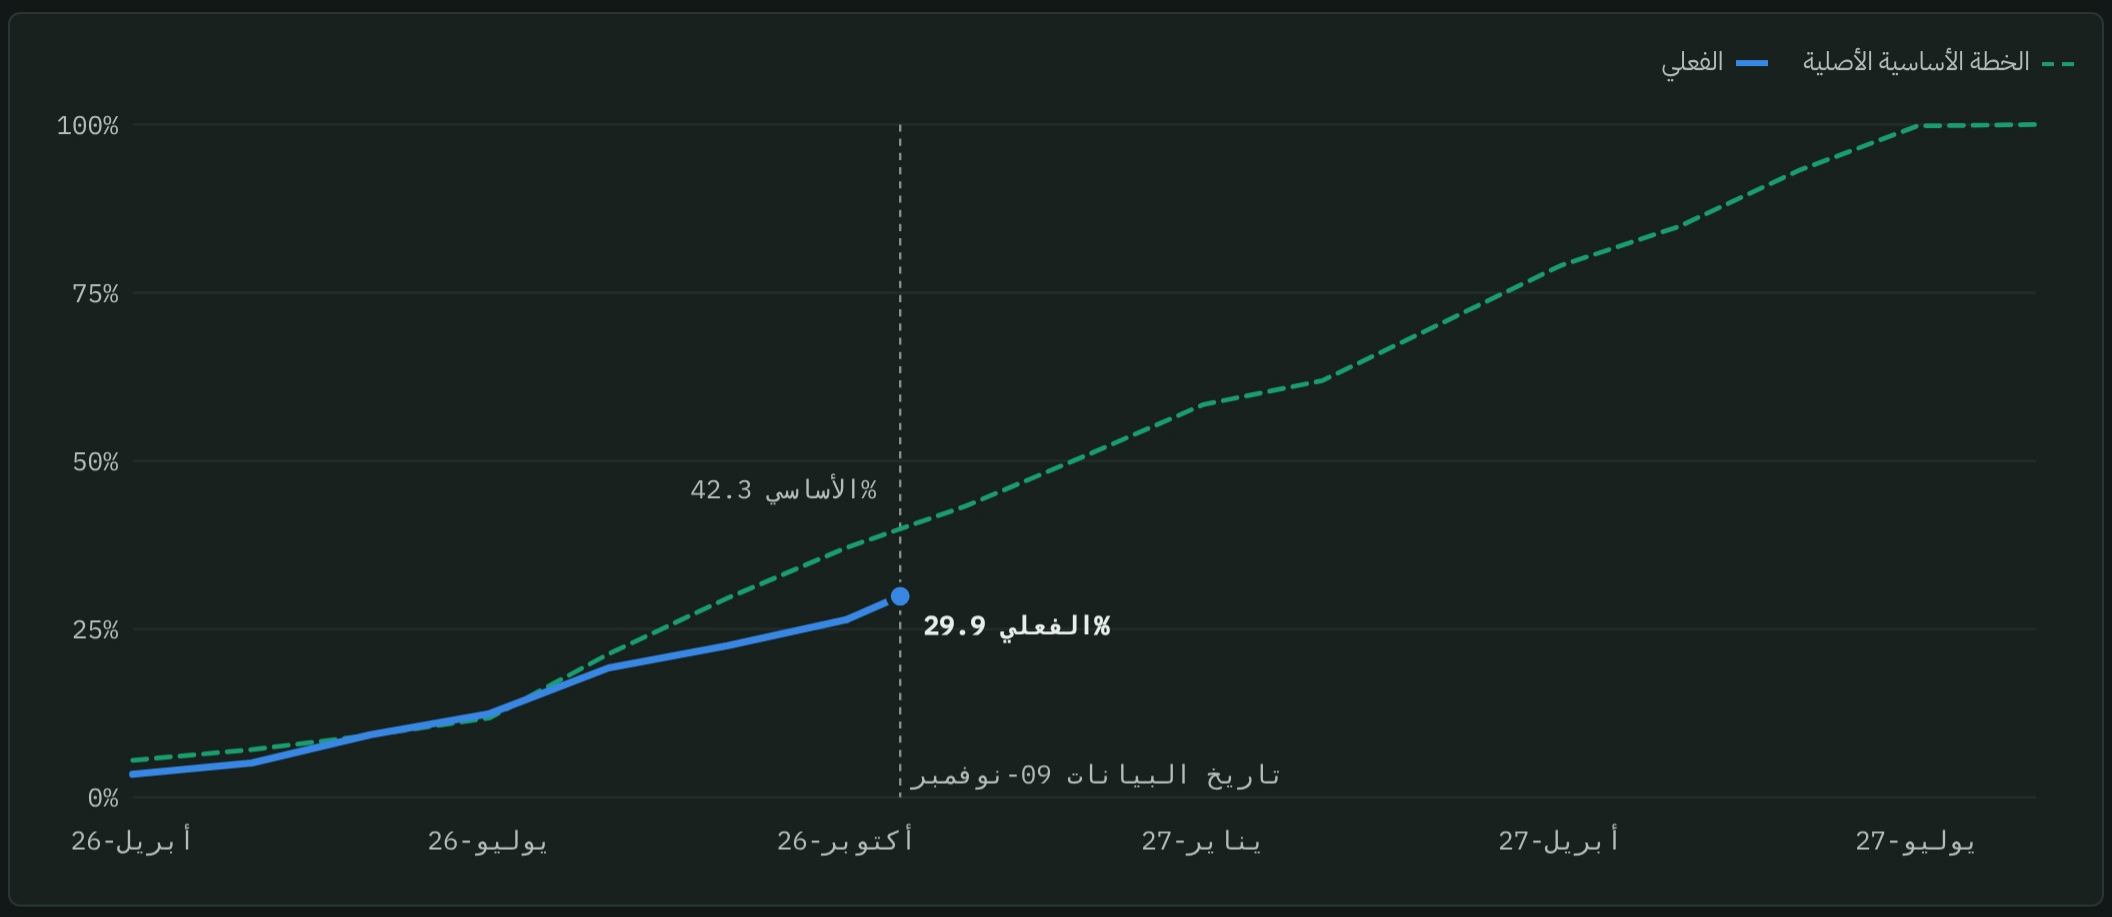

نهاية الأسبوع	المخطط %	الفعلي %	الانحراف	المنجز خلال الأسبوع	مؤشر الأداء
05-Oct-2026	33.9	24.4	−9.5	+1.1	0.72
12-Oct-2026	36.2	24.8	−11.4	+0.4	0.69
19-Oct-2026	38.1	26.1	−12.0	+1.3	0.69
26-Oct-2026	40.0	27.3	−12.7	+1.2	0.68
02-Nov-2026	40.1*	28.4*	−11.7	+2.0	0.71
09-Nov-2026	**42.3***	**29.9***	**−12.4**	**+1.5**	**0.71**

قيم 05 أكتوبر إلى 26 أكتوبر من تقارير تلك الأسابيع (ميزانية 638,468 ساعة عمل). * قيمة 02 نوفمبر من عمود الأسبوع السابق في تقرير هذا الأسبوع، وقيمة 09 نوفمبر هي رقم هذا الأسبوع (ميزانية 659,762 ساعة عمل). والمكتسب هذا الأسبوع هو ساعات العمل المكتسبة في ذلك الأسبوع مقسومة على ميزانية ذلك الأسبوع. ويستخدم المنحنى ورقة الرسم لهذا الأسبوع على ميزانية 659,762، بنقاط شهرية في يوم 26 من كل شهر.

التقدم حسب المرحلة

التقدم الفعلي حتى تاريخه حسب هيكل تجزئة العمل، ويقاس بعدد ساعات العمل المخططة. المصدر: ورقة Progress بتاريخ 09-نوفمبر-2026.


المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
التجهيز	3%	100.0%	100.0%	0.0	1.00	✓ مكتمل
التصميم الهندسي	5%	100.0%	95.0%	−5.0	0.95	▼ متأخر
التوريدات	14%	83.3%	25.3%	−57.9	0.30	▼ متأخر كثيراً
التنفيذ	75%	30.1%	24.8%	−5.4	0.82	▼ متأخر
· الحزمة 1: الطرق والخدمات	53.9%	38.3%	34.5%	−3.8	0.90	▼ متأخر
·· شبكة إنارة الشوارع	7.7%	37.3%	15.6%	−21.7	0.42	▼ متأخر كثيراً
·· الاتصالات	2.2%	45.5%	29.1%	−16.4	0.64	▼ متأخر كثيراً
· الحزمة 3: المحطة (الرصيف والمظلة والأنظمة)	21.1%	9.3%	0.0%	−9.3	0.00	▼ لم يبدأ
الاختبار والتشغيل	2%	0.0%	0.0%	0.0	–	● لم يحن موعده

المرحلة	الوزن	المخطط	الفعلي	الانحراف	مؤشر الأداء	الحالة
الإغلاق	1%	0.0%	0.0%	0.0	–	● لم يحن موعده
الإجمالي	100%	**42.3%**	**29.9%**	**-12.4**	**0.71**	▼ متأخر

أعمال الطرق 1 عند 44.6% مقابل 44.9% مخطط (مؤشر الأداء 0.99). ويضم تحديث P6 (تاريخ البيانات 09-نوفمبر-2026) عدد 855 نشاطاً: 268 مكتملاً و95 قيد التنفيذ و492 لم يبدأ. وتاريخ الانتهاء المجدول 12-أغسطس-2027، أي بعد التاريخ التعاقدي بستة أيام.

نطاق العمل: الكميات

الكميات الرئيسية في جدول الكميات من ورقة Major Quantities في التقرير الأسبوعي بتاريخ 09-نوفمبر-2026: الإجمالي والمنفذ حتى تاريخه والمتبقي. ويُظهر عمود "هذا الأسبوع" التغير منذ تقرير 26-أكتوبر-2026، وهو آخر تقرير أسبوعي سابق متوفر.

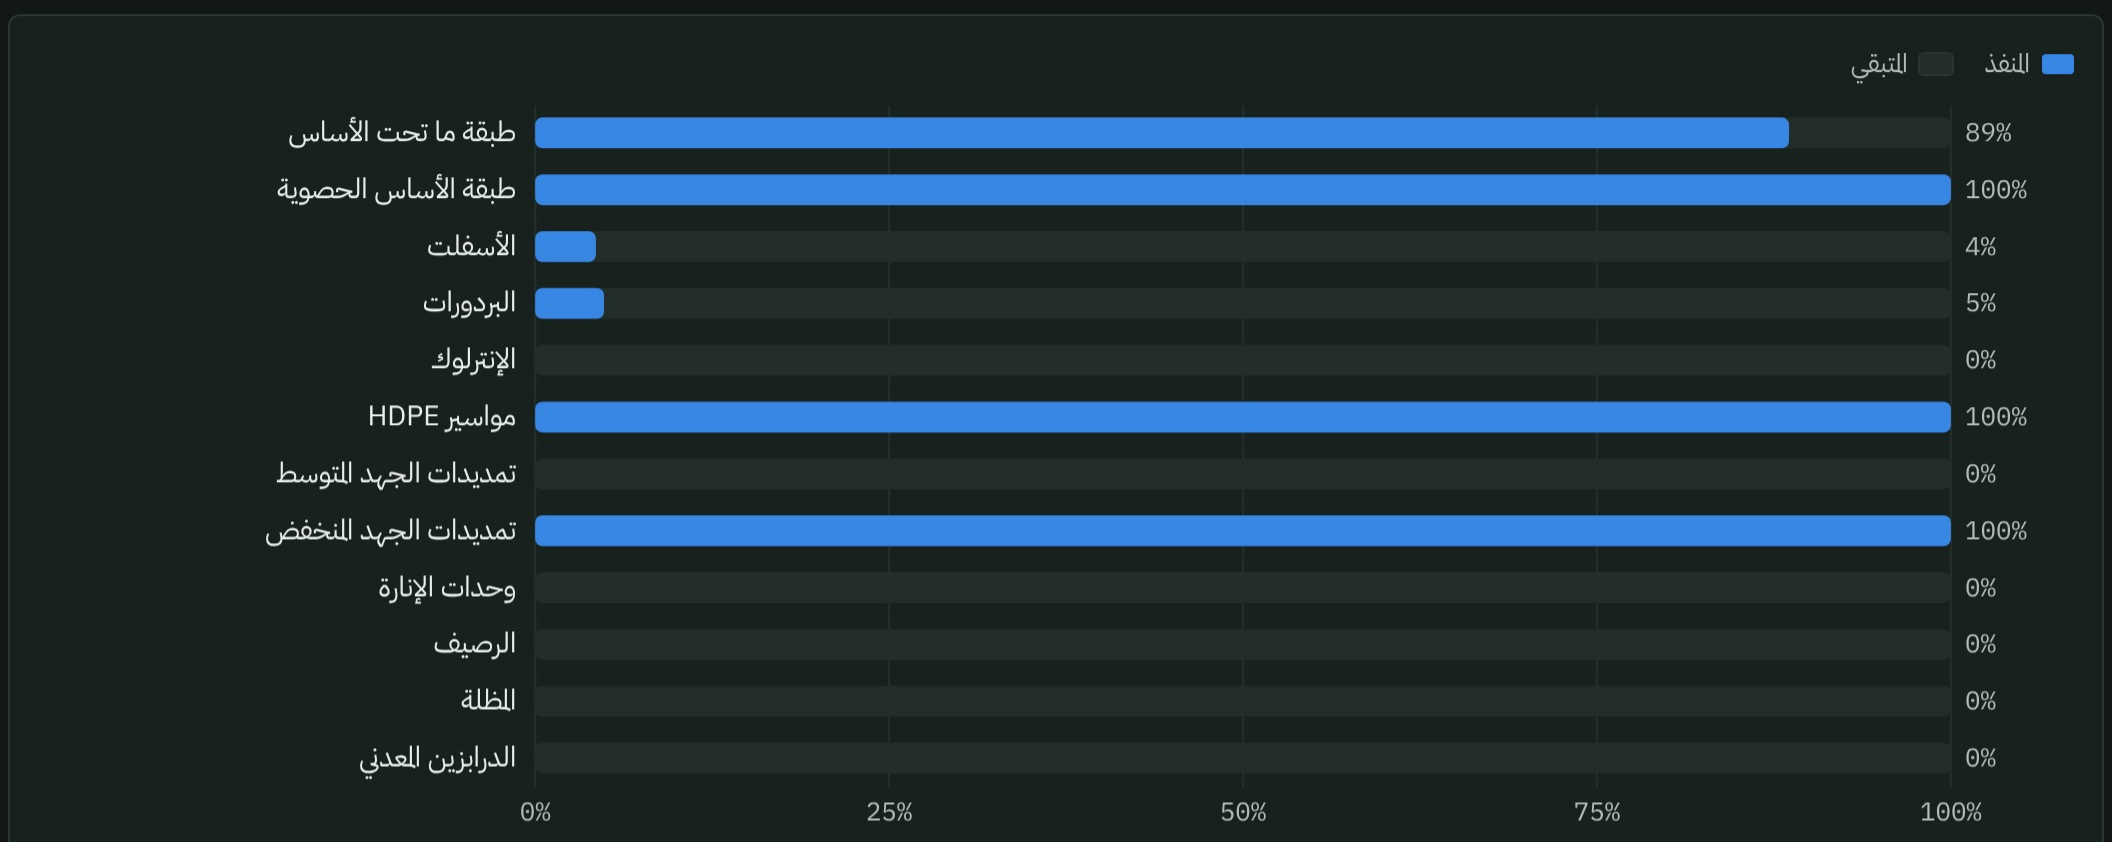

بند النطاق	رقم البند	الوحدة	الإجمالي	المنفذ	المنفذ هذا الأسبوع	المتبقي	% المنفذ
طبقة ما تحت الأساس	B1.32 11 13.01	م³	20,530	18,182	0	2,348	88.6%
طبقة الأساس الحصوية	B1.32 11 23.01	م³	13,485	13,485	7,974-	0	100.0%
الأسفلت	B1.32 12 16.01	م³	13,360	573	0	12,787	4.3%
البردورات	B1.32 16 13.23.01	م²	20,555	1,000	718+	19,555	4.9%
الإنترلوك	B1.32 14 13.13.01	م²	27,900	0	0	27,900	0.0%
مواسير HDPE	B4.33 31 23.01	م.ط	5,808	5,808	0	0	100.0%
تمديدات الجهد المتوسط	B2.31 23 00.01	م.ط	7,120	0	0	7,120	0.0%
تمديدات الجهد المنخفض	B2.33 71 00 02.01	م.ط	7,500	7,500	0	0	100.0%
وحدات الإنارة	B2.26 56 19.01	عدد	116	0	0	116	0.0%
الرصيف	00 00 03	م²	4,000	0	0	4,000	0.0%
المظلة	00 00 31	م.ط	4,000	0	0	4,000	0.0%
الدرابزين المعدني	B4.05 52 00.01	م.ط	440	0	0	440	0.0%

أعمال المحطة لم تبدأ

الرصيف (4,000 م²) والمظلة (4,000 م) والدرابزين المعدني (440 م) ووحدات الإنارة (116) جميعها عند 0%. ويتوقف الرصيف والمظلة على تصريح سياج سار وتصميم المالك.

أرقام تحتاج إلى مراجعة

ارتفعت البردورات بمقدار 718 م² إلى 1,000 م²، مع أنه لم يبدأ في P6 أي نشاط لتركيب البردورات. وصُحّحت طبقة الأساس الحصوية من 21,459 م³ (من أصل 16,376 م³) إلى 13,485 م³ من أصل 13,485 م³، فأصبحت منفذة 100%، بينما بدأ في P6 نشاط آخر لطبقة الأساس في 08-نوفمبر-2026. ولم تتغير كميات ما تحت الأساس والأسفلت ومواسير HDPE وتمديدات الجهد المنخفض.

المعالم الرئيسية

يعطي التقرير الأسبوعي وتحديث البرنامج الزمني P6 توقعات مختلفة لعدد من المعالم. ويُعرض كلاهما ليُحسم الفرق مع المقاول.

المعلم	الخطة الأساسية	توقع التقرير الأسبوعي	توقع تحديث P6	الفائض في P6 (أيام)	الحالة
بدء المشروع	07-Apr-2026	07-Apr-2026	07-Apr-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
انتهاء التجهيز	06-May-2026	06-May-2026	06-May-2026 (فعلي)	–	✓ منجز
تقديم خطة العمل والبرنامج الأساسي	06-May-2026	16-Aug-2026 (+102 يوماً)	15-Aug-2026 (فعلي)	–	✓ منجز متأخراً
انتهاء مرحلة التصميم	06-May-2026	21-Sep-2026 (+138 يوماً)	10-Nov-2026	52	▼ متأخر
أعمال الطرق والرصف	06-Dec-2026	31-Dec-2026 (+25 يوماً)	10-Feb-2027	−1	▼ متأخر
انتهاء مرحلة التوريدات	15-Apr-2027	09-Jun-2027 (+55 يوماً)	30-Mar-2027	46	? التوقعات مختلفة
أعمال الجهد المتوسط	12-May-2027	05-May-2027	09-Jun-2027	0	▼ متأخر في P6
أعمال الموقع والرصيف	20-Jul-2027	05-Aug-2027 (+16 يوماً)	01-May-2027	78	? التوقعات مختلفة
أعمال التشطيبات والأعمال العامة للموقع	20-Jul-2027	06-Aug-2027 (+17 يوماً)	12-Aug-2027	−6	▼ متأخر
انتهاء المشروع	06-Aug-2027	06-Aug-2027	12-Aug-2027	−6	▼ متأخر 6 أيام في P6

يتجاوز P6 تاريخ الانتهاء التعاقدي بستة أيام، بينما لا يزال التقرير الأسبوعي يتوقع 06-أغسطس-2027.

قبل أسبوع كان P6 يُنهي المشروع في التاريخ التعاقدي بلا فائض. أما الآن فيحدد انتهاء المشروع في 12-أغسطس-2027، وأعمال الطرق والرصف في 10-فبراير-2027 (مقابل 31-ديسمبر-2026 في التقرير الأسبوعي)، وأعمال الجهد المتوسط في 09-يونيو-2027 بلا فائض (مقابل 05-مايو-2027). ولا يزال P6 يُنهي أعمال الموقع والرصيف في 01-مايو-2027 بفائض 78 يوماً، مع أن أعمال الرصيف لم تبدأ وتنتظر تصريح سياج سار. ومرحلة التصميم، المتوقع انتهاؤها في 21-سبتمبر-2026 حسب التقرير الأسبوعي، لا تزال مفتوحة في P6.

توريد المواد الرئيسية

نسبة الكمية المورّدة من الكمية المطلوبة، من عمود Completion Rate. المصدر: ورقة Procurement، التقرير الأسبوعي 09-نوفمبر-2026، دون تغيير عن 26-أكتوبر-2026.



ثمانية بنود طويلة التوريد لم تُقدَّم بعد


الدرابزين المعدني والمظلة ومجاري الجهد المتوسط وتمديدات الجهد المتوسط والمحطات الفرعية وأعمدة الإنارة ووحدات إنارة الشوارع ووحدات الإنارة الخارجية كلها مسجلة "لم تُقدَّم". وقد انقضت مواعيد أوامر الشراء المطلوبة للدرابزين (25-أغسطس-2026) ومجاري وتمديدات الجهد المتوسط (12-أكتوبر-2026) والمحطات الفرعية (19-أكتوبر-2026)، وتحل خلال أسبوعين مواعيد وحدات إنارة الشوارع (10-نوفمبر-2026) والمظلة (19-نوفمبر-2026) ووحدات الإنارة الخارجية (23-نوفمبر-2026).

توريدات على المسار الحرج

يضع P6 توريد البردورات (فائض −6 أيام) وتوريد الأسفلت (−5 أيام) على المسار الذي يؤخر الانتهاء الآن. ولا توجد بعد نسبة توريد للبلاط المتداخل والعزل المائي ولوحة توزيع الجهد المنخفض ولوحات تغذية إنارة الشوارع وكاميرات المراقبة ونظام الإخلاء الصوتي وأغطية المناهل والمحابس. ويُحصي الملخص 22 أمر شراء صادراً من 27.

القوى العاملة

عدد العمالة الشهري في الموقع، المخطط مقابل الفعلي. المصدر: ورقة Manpower.

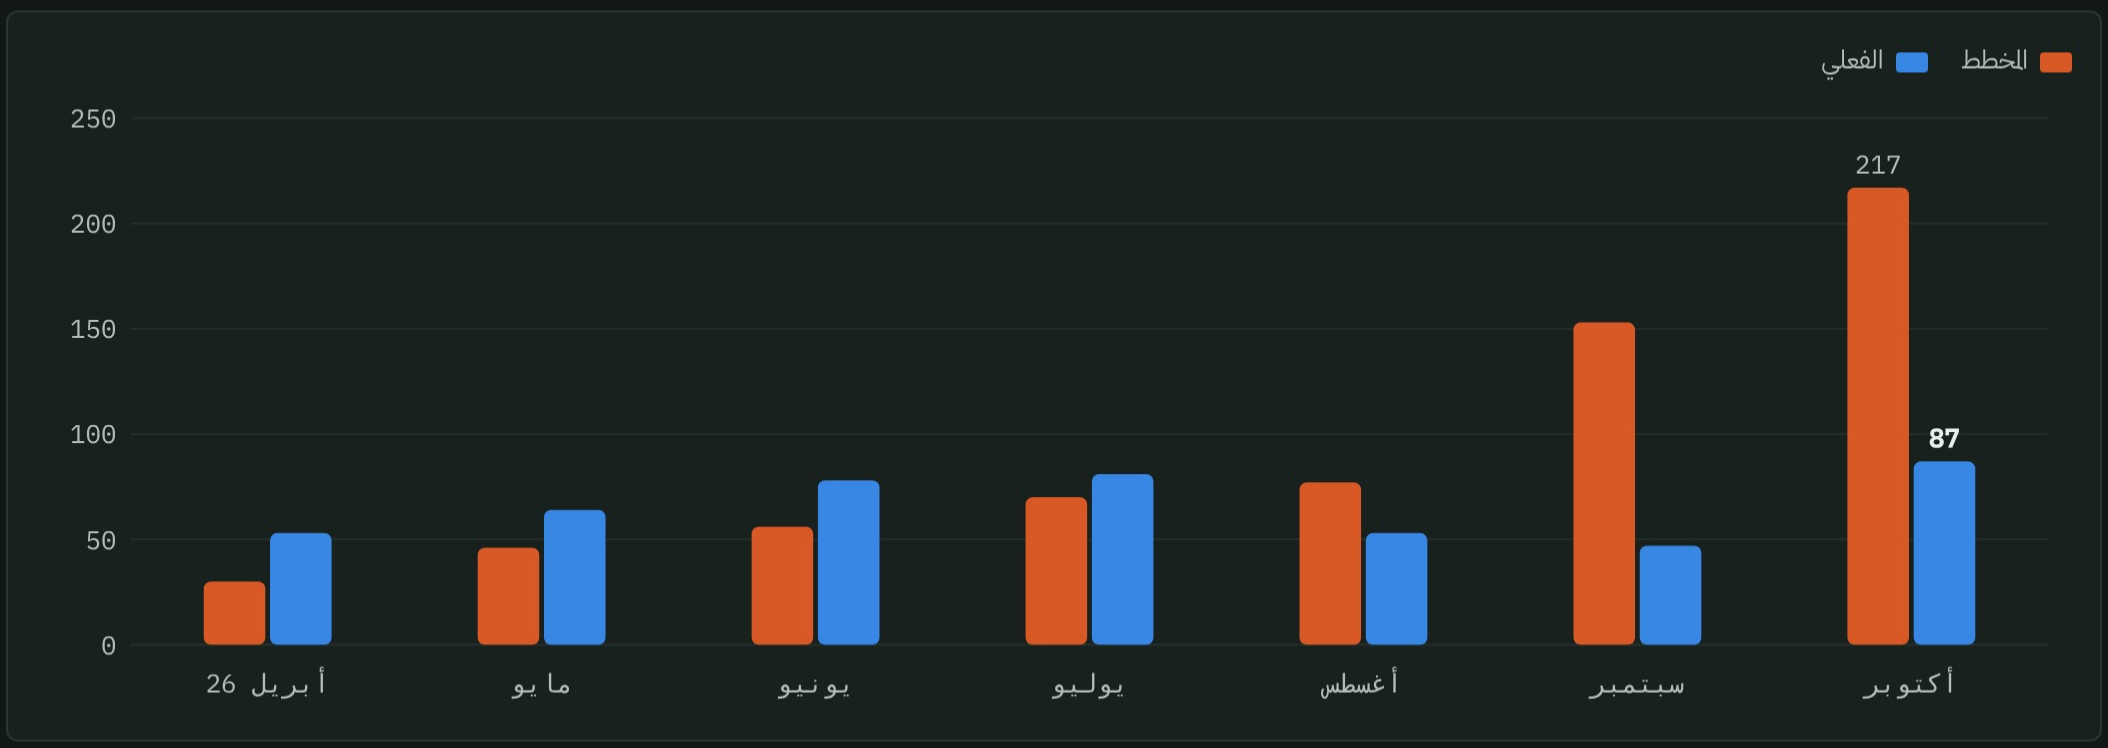

عدد العمالة اليدوية وغير اليدوية معاً. بلغ في أكتوبر 87 مقابل 217 مخططاً (−60%). ويكرر عمود نوفمبر رقم أكتوبر (87: منهم 65 عمالة يدوية و22 غير يدوية) مقابل 232 مخططاً، لذا لا يُعرض نوفمبر. ويبلغ المخطط ذروته عند 263 في ديسمبر 2026.

التكلفة والمستخلصات

قيمة العقد

قيمة العقد الأصلية	33,090,825
أوامر التغيير	0
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز	33,090,825

جميع القيم بالريال. سجل أوامر التغيير خالٍ. إجمالي جدول الكميات في ورقة Progress هو 33,090,852، أي أعلى من قيمة العقد بـ27 ريالاً.

المستخلصات

المستخلصات المقدمة	3
القيمة الإجمالية	4,289,046
ضريبة القيمة المضافة	643,357
الخصومات والغرامات	8,000
الصافي شاملاً الضريبة	4,924,402
المعتمد من مدير المشروع / المدفوع	0 / 0

المفوتر 13.0% من قيمة العقد مقابل إنجاز فعلي 29.9%. والمستخلص الثالث (1,240,646 ريال إجمالي، من 31-أغسطس-2026 إلى 28-أكتوبر-2026) جديد منذ تقرير 26-أكتوبر-2026. ولم يُعتمد أي من المستخلصات الثلاثة من مدير المشروع ولم يُصرف.

الصحة والسلامة والجودة

السلامة التقييم 0.83

ساعات العمل الآمنة (تراكمي)	92,590
ساعات العمل هذا الأسبوع	5,220
التدريبات الداخلية (تراكمي)	25
اجتماعات التوعية (تراكمي)	23
ملاحظات السلامة المسجلة / المفتوحة	21 / 0

الجودة التقييم 0.89

طلبات الفحص الصادرة / المغلقة / المعلقة	194 / 183 / 11
طلبات فحص المواد الصادرة / المغلقة	17 / 16
تقارير عدم المطابقة الصادرة / المغلقة	4 / 4
تعليمات الموقع	0
المخططات التنفيذية المقدمة (من 229)	229
اعتمادات المواد المقدمة (من 46)	46

أُضيف منذ تقرير 26-أكتوبر-2026 عدد 37 طلب فحص وطلبا فحص مواد. المخططات التنفيذية: 174 معتمدة (A) و42 معتمدة بملاحظات (B) و13 (C). اعتمادات المواد: 1 (A) و42 (B) و3 (C).

المشكلات والمخاطر القائمة

المشكلة	المسؤول	التفاصيل
انزلاق تاريخ الانتهاء	المقاول	يتوقع P6 الانتهاء في 12-أغسطس-2027، أي بتأخير 6 أيام. وتحمل خنادق تمديدات الاتصالات والجهد المنخفض وأعمدة الإنارة وتوريدات البردورات والأسفلت وأعمال تشطيب الطرق فائضاً سالباً.
تصريح سياج سار	مدن / سار	تصريح العمل داخل منطقة الرصيف ما زال معلقاً، لذا لا يمكن بدء أعمال الرصيف والمظلة. مصنف عالياً جداً (5 × 5) في سجل المخاطر، ومفتوح منذ 16-سبتمبر-2026.
تصميم المظلة والرصيف	مدن (المالك)	لم يُصدر المالك بعد تصميم المظلة والرصيف، لذا لا يمكن إنهاء المخططات التنفيذية والتوريدات والتنفيذ المرتبطة بهما. مصنف عالياً جداً (5 × 5)، بقيمة 9,867,379 ريال.
تقاطعات مجاري الجهد المتوسط	مدن (المالك)	اعتماد المالك لتقاطعات مجاري الجهد المتوسط المقترحة معلّق، ويتوقف عليه تركيب تمديدات الجهد المتوسط. مصنف عالياً (4 × 4). ولم يعد لمعلم أعمال الجهد المتوسط أي فائض في P6.
التوريدات طويلة الأجل	المقاول	ثمانية بنود طويلة التوريد لم تُقدَّم للاعتماد بعد، وتجاوز عدد منها مواعيد أوامر الشراء المطلوبة. التوريدات عند 25.3% مقابل 83.3% مخطط.
رصد التقدم	المقاول / الاستشاري	استُبدلت نسبة 40.4% المُعلنة لتاريخ 02-نوفمبر-2026 بنسبة 28.4% دون توضيح. وينبغي أن يؤكد الاستشاري أساس احتساب التقدم ويعتمد ميزانية ساعات العمل البالغة 659,762.

يضم سجل المشكلات 21 ملاحظة سلامة من 02-سبتمبر-2026 إلى 06-نوفمبر-2026، جميعها مغلقة، منها ملاحظتان أُضيفتا هذا الأسبوع. وهناك خطران قديمان مسجلان مغلقين: تصريح سار للتقرير الجيوتقني ومخطط المناقصة للرصيف.

ملاحظات على البيانات

- لا يحتوي مجلد الأسبوع السابق (05-نوفمبر-2026) إلا على تحديث P6 وخطة الأسبوعين القادمين، دون تقرير أسبوعي. لذا قورنت قيم التقرير الأسبوعي بتقرير 26-أكتوبر-2026 (مجلد 29-أكتوبر-2026) وبأعمدة الأسبوع السابق في هذا التقرير، وقورنت قيم P6 بتحديث 01-نوفمبر-2026.
- أظهر تقرير الأسبوع الماضي نسبة 40.4% لتاريخ 02-نوفمبر-2026، من تقرير أسبوعي غير موجود في مجلد الأسبوع السابق. ويعطي ملف هذا الأسبوع لتاريخ 02-نوفمبر-2026 نسبة 28.4% (187,466 من 659,762 ساعة عمل)، وساعات العمل المكتسبة لأعمال الطرق 1 هي 80,414 بدلاً من 161,207 المذكورة الأسبوع الماضي. ولا يوضح التقرير سبب التغيير.
- ميزانية ساعات العمل 659,762 مقابل 638,468 في تقرير 26-أكتوبر-2026. وتستخدمها ورقة Physical-Chart Data الآن أيضاً، وعاد الفعلي لشهر أكتوبر فيها إلى 174,265 ساعة عمل.
- نسبة Achieved % في ورقة الرسم لشهري أبريل ومايو (4.24% و8.17%) لا تطابق ساعات العمل في الورقة نفسها (3.42% و5.09%). ويستخدم المنحنى ساعات العمل.
- ارتفعت ساعات العمل المكتسبة للتوريدات من 17,130 (26-أكتوبر-2026) إلى 23,398، كلها في الأسبوع المنتهي في 02-نوفمبر-2026، ولم يُكتسب منها شيء هذا الأسبوع.
- الكميات الرئيسية: تغيّر إجمالي طبقة الأساس الحصوية من 16,375.94 إلى 13,485 م³ والكمية المنفذة من 21,459.19 إلى 13,485 م³، بينما لا يزال عمودان مساعدان يُظهران 9,875.94 و21,459.19. والبردورات بوحدة م² هناك وبوحدة م في ورقة Procurement، التي تعطي البردورات نسبة إنجاز 1.4 (140%). وإجمالي الأسفلت 13,360 م³ هناك و3,420 م³ في ورقة Procurement.
- قيمة "Earn Value" في الصفحة الأولى ومؤشرها الزمني مبنيان على التكلفة (قيمة جدول الكميات) لا على الإنجاز الفعلي، ولا يُستخدمان في هذا التقرير.

- يعطي التقرير الأسبوعي تاريخ الانتهاء المتوقع 06-أغسطس-2027 بفرق صفري، بينما ينتهي تحديث P6 بالتاريخ نفسه في 12-أغسطس-2027. ولا تزال الصفحة الأولى تذكر "Revised Completion" بتاريخ 07-أبريل-2026، وهو تاريخ تسليم الموقع.
- التاريخ الأساسي لأعمال الجهد المتوسط: 12-مايو-2027 في ورقة Milestones، و22-مايو-2027 في الصفحة الأولى.
- لا يسرد ملخص طلبات الفحص إلا الطلبات حتى 02-نوفمبر-2026 (FIR-0176)، مع أن عدد الطلبات ارتفع إلى 194.
- يعطي P6 النشاط SDR-ST-CON-P1-3300 (تمديد مواسير GRP قطر 200 مم) تاريخ انتهاء فعلي 14-نوفمبر-2026، أي بعد تاريخ بياناته 09-نوفمبر-2026.
- القوى العاملة: المخطط لشهر أكتوبر 217 في المخطط الشهري لكنه 60 في الملخص الأسبوعي، والفعلي لشهر نوفمبر يكرر رقم أكتوبر.
- لا تزال ورقة تفتيش السلامة وملخص طلبات الفحص تحملان رقم المشروع SUD1-02-011، وتصف ورقة Conclusion مشروعاً آخر. ولا يزال سجل المخاطر يصف المشروع بأنه متقدم عن الجدول، والخطران 3120-4 و3120-5 مسجلان مفتوحين في عمود ومغلقين في عمود آخر.
